COMUNE DI TRENTO
Servizio opere di urbanizzazione primaria


Piano Regolatore di Illuminazione Comunale (P.R.I.C.)

ai sensi della "Legge Provinciale 3 ottobre 2007, n.16 - Risparmio energetico e inquinamento luminoso" e s.m.i.

Titolo Documento: CENSIMENTO PUNTUALE DEI QUADRI ELETTRICI DI COMANDO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VOLUME 1

Codice documento: 02.3

Formato: A4

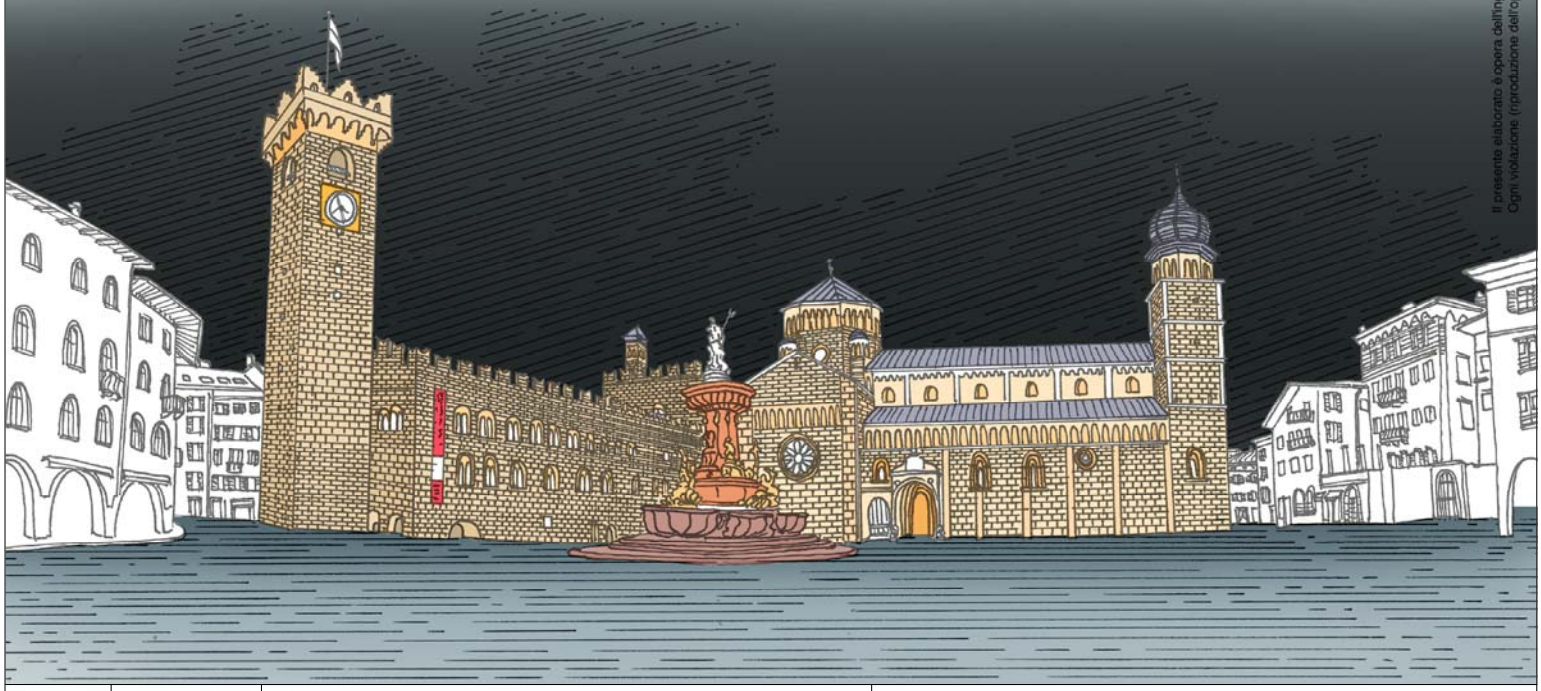

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli art.2575 e segg. C.C.e dalla L.22/04/1941 N.363 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

REV.	DATA	NOTE
00	09-01-14	Consegna prima stesura
01	16-05-14	Consegna FASE 1
02	11-12-15	Consegna PRIC
03		
04		
05		
06		

di ing R. Guanella - arch. M. Montani - arch. M. Süss
p. I.V.A. 12859360153
sede legale: Via Boccaccio 15/A - 20123 Milano
sede operativa: Via Giuditta Pasta, 92 - 20161 Milano
TEL. 0245477642 FAX. 0245477710
www.studiogms.it
GMS ARCHITECTURE & ENGINEERING

Per valutare lo stato attuale dei quadri elettrici di comando del Comune di Trento (fatta eccezione per gli apparecchi di proprietà Terzi), è stato effettuato un accurato censimento.
Di seguito vengono descritte tutte le caratteristiche ed informazioni rilevate in fase di censimento, e riportate nelle schede che seguono.
Per ogni quadro elettrico di comando si sono indicati:

a. le coordinate GPS;

b. l'ubicazione;

c. lo stato di conservazione (colorando la casella nel colore corrispondente):
   - buono (verde);
   - manutenere (giallo);
   - vetusto (rosso).

d. report fotografico;

e. la tensione (colorando in verde la casella corrispondente alla tensione rilevata):
   - 230V MF;
   - 230V 3F;
   - 400V 3F;

f. Il POD

g. marca e modello della carpenteria esterna indicando (colorando in verde la casella corrispondente) se risulta essere:
   - sufficiente;
   - insufficiente.

h. marca e modello della carpenteria interna indicando (colorando in verde la casella corrispondente) se risulta essere:
   - sufficiente;
   - insufficiente.

i. stato dei cablaggi indicando (colorando in verde la casella corrispondente) se risulta essere:
   - sufficiente;
   - insufficiente.

j. lo stato delle morsettiere indicando (colorando in verde la casella corrispondente) se risulta essere:
   - sufficiente;
   - insufficiente.

k. la presenza del regolatore di flusso (colorando in verde la casella corrispondente):
   - si;
   - no.

   In caso di presenza del regolatore di flusso se ne è indicato il modello.

l. la presenza dei moduli per il telecontrollo (colorando in verde la casella corrispondente):
   - si;
   - no.

   In caso di presenza dei moduli per il telecontrollo se ne è indicato il modello.

m. la presenza del crepusolare (colorando in verde la casella corrispondente):
   - si;
   - no.

   In caso di presenza del crepuscolare se ne è indicato il modello.

n. la presenza dell'orologio (colorando in verde la casella corrispondente):
   - si;
   - no.

o. in caso di presenza dell'orologio si è indicato se questo risulta essere di tipo astronomico (colorando in verde la casella corrispondente):
   - si;
   - no.

p. la presenza di scaricatori (colorando in verde la casella corrispondente):
   - si;
   - no.

   In caso di presenza di scaricatori se ne è indicato il modello.

q. la continuità del conduttore di protezione del quadro elettrico (colorando in verde la casella corrispondente):
   - si;
   - no.

r. la presenza di disegni del quadro elettrico (colorando in verde la casella corrispondente):
   - si;
   - no.

s. la presenza, verificata tramite rilievo effettuato a vista, di pozzetti di ispezione in corrispondenza dei pali (colorando in verde la casella corrispondente):
   - si;
   - no.

t. la presenza, verificata tramite rilievo effettuato a vista, del conduttore di protezione sui pali (colorando in verde la casella corrispondente):
   - si;
   - no.

u. la tipologia degli interruttori, indicando per ciascuno:
   - tipo di circuito;
   - protezione della messa a terra;
   - poli;
   - protezione differenziale;
   - tipo di differenziale;
   - sezione del cavo;
   - tipologia del cavo;
   - resistenza all'isolamento del cavo;
   - mA del differenziale;
   - mS del differenziale.


v. la potenza generale assorbita dal quadro di comando

w. la potenza assorbita dai singoli circuiti (L 01, L 02, L 03, ecc.) e da eventuali carichi esogeni (CE 01, CE 02, CE 03).

x. Eventuali note relative al quadro di comando esaminato.


PARALLELI	46,08092	MERIDIANI	11,11461	
TRENTO - ABBONDI via				
QC001		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



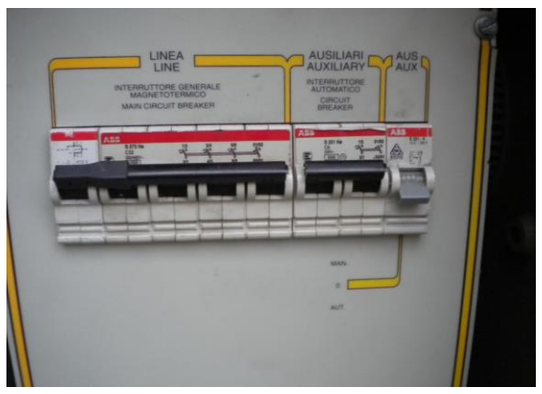





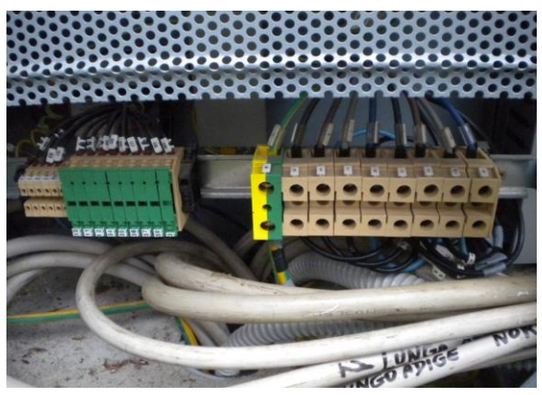

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	618878		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 315 HMU				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	THEBEN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	4	300mA	REG. AC				310	88
L 01	C10	3			4X6	FG7OR	>100		
L 02	C10	3			4X6	FG7OR	>100		
L 03	C10	3			4X16	FG7OR	>100		
L 04	C10	3			4X16	FG7OR	>100		
L 05	C10	3			4X4+4X4	FG7OR	>100		
L 06	C10	3			4X4	FG7OR	>100		
L 07	C10	3			4X6	FG7OR	>100		
L 08	C10	3			4X4	FG7OR	>100		
L 09	C10	3			4X4	FG7OR	>100		
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,08092	MERIDIANI	11,11461	
TRENTO - ABBONDI via				
QC001		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		17,96	14,55	13,80	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	VIA A. ABONDI	1,50	1,40	0,90	SI	NO
L 02	VIA UMBERTO	1,35	1,63	1,58	SI	NO
L 03	VIA GINO P.	1,62	1,53	1,05	SI	NO
L 04	PARCO SUD	1,75	1,57	1,58	SI	NO
L 05	PARCO CENTRO	3,98	1,59	1,09	SI	NO
L 06	PARCO NORD	2,25	1,26	1,85	SI	NO
L 07	LUNGO ADIGE NORD	1,88	2,37	2,52	SI	NO
L 08	LUNGO ADIGE SUD	2,10	1,93	2,20	SI	NO
L 09	VIA BEPI MORI	1,53	1,27	1,03	SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. Interruttore differenziale con corrente di intervento > a Idn.					

PARALLELI	46,05078	MERIDIANI	11,12404			
TRENTO - A. FRANK via						
QC002			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	633643		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 325 HMU				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD. PREDISPOSIZIONE ALGORAB RES 2				
CREPUSCOLARE	SI	NO	THEBEN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN	
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C50	4	500mA	REG. AC				430	132
								MORS.	COLL.
L 01	C20	3			4X6	FG7OR	>100	1	RST
L 02	C16	3			4X10	FG7OR	>100	2	RST
L 03	C16	3			4X35	FG7OR	>100	3	RST
L 04	C16	3			4X10+1X4X4	FG7OR	>100	4	RST
L 05	C16	3			4X16	FG7OR	>100	5	RST
L 06	C16	3			4X35	FG7OR	>100	7	RST
L 07	C10	3			4X16	FG7OR	>100	6	RST
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,05078	MERIDIANI	11,12404	
TRENTO - A. FRANK via				
QC002		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		31,52	33,11	37,69	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	PARCO	0,80	1,30	1,83	SI	NO
L 02	VIA DE GASPERI	5,61	7,44	8,45	SI	NO
L 03	VIA DE GASPERI/SISTER	8,23	5,98	5,62	SI	NO
L 04	VIA ANNA FRANK	2,16	1,42	2,21	SI	NO
L 05	DE GASPERI CICLO	3,07	2,49	5,90	SI	NO
L 06	VIA GANDHI	10,88	7,60	8,76	SI	NO
L 07	VIA DEGASPERI/SISTER	0,77	6,88	4,92	SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. Mancanza di falsi poli su finestre DIN 35. Componente "volante" da fissare in guida DIN.					

PARALLELI	46,05161	MERIDIANI	11,11966	
TRENTO - ALBERIONE Via				
QC003				ELIMINATO

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD			NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO				
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE									
L 01									
L 02									
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,05161	MERIDIANI	11,11966	
TRENTO - ALBERIONE Via				
QC003			ELIMINATO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE					SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01					SI	NO
L 02					SI	NO
L 03					SI	NO
L 04					SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :						


PARALLELI	46,07892	MERIDIANI	11,11832	


TRENTO - ALPINI corso


QC004		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

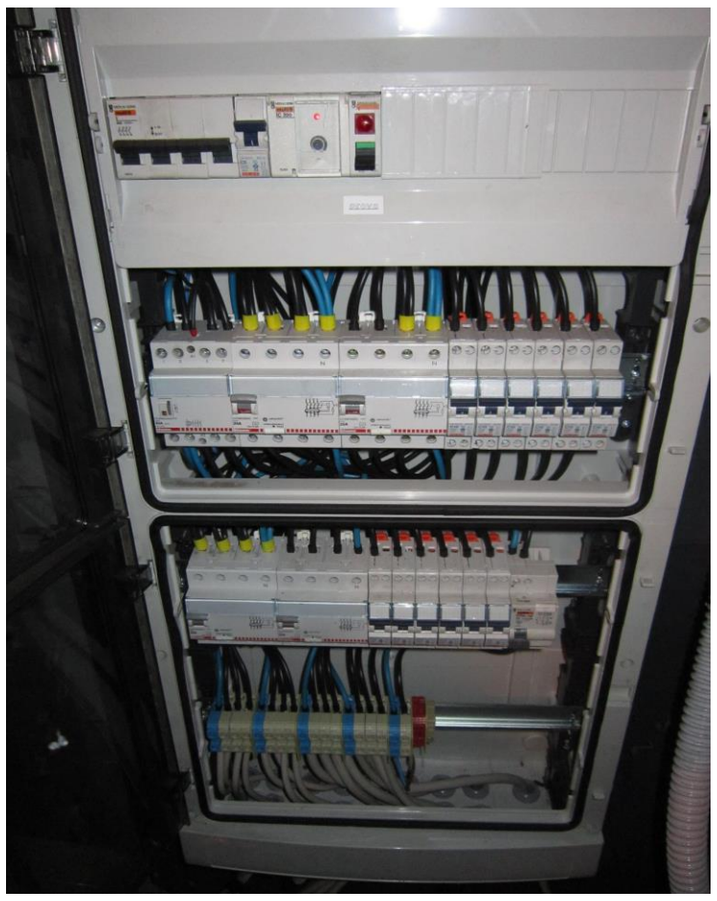



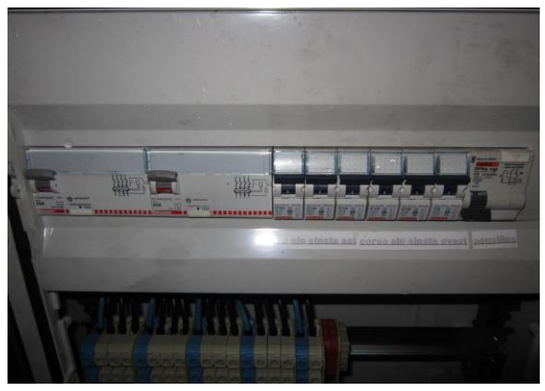

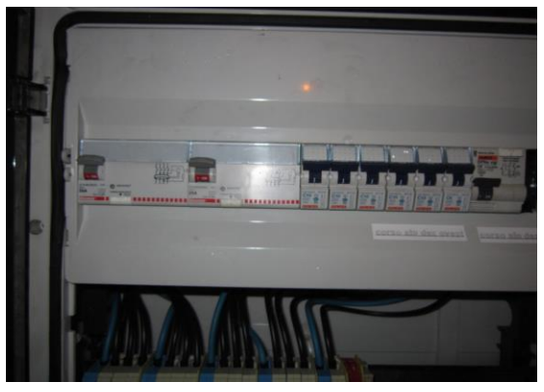

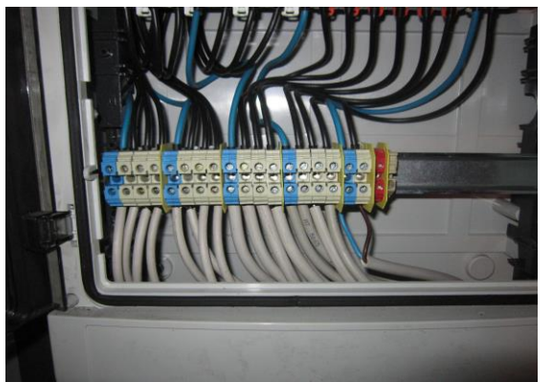

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	618928		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI


CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	63 SEZ.	4							
L 01	C10	diff 4/3	300mA	AC	4x1x6	FG7OR	>100	240	54
L 02	C10	diff 4/3	300mA	AC	4x1x6	FG7OR	>100	240	42
L 03	C10	diff 4/3	300mA	AC	4x1x6	FG7OR	>100	260	40
L 04	C10	diff 4/3	300mA	AC	4x1x6	FG7OR	>100	265	28
L 05	C6	1+N	300mA	AC	2x2,5	FG7OR	>100	245	26
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,07892	MERIDIANI	11,11832			
TRENTO - ALPINI corso						
QC004			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		20,55	21,60	21,70	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	CORSO ALPINI DX OVEST	2,70	2,32	3,04	SI	NO
L 02	CORSO ALPINI DX EST	3,50	4,96	3,72	SI	NO
L 03	CORSO ALPINI SX OVEST	8,00	7,20	8,22	SI	NO
L 04	CORSO ALPINI SX EST	5,82	7,12	6,78	SI	NO
L 05	PENSILINA AUTOBUS	0,53			SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,04874	MERIDIANI	11,1372	
TRENTO - ASIAGO via				
QC005		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

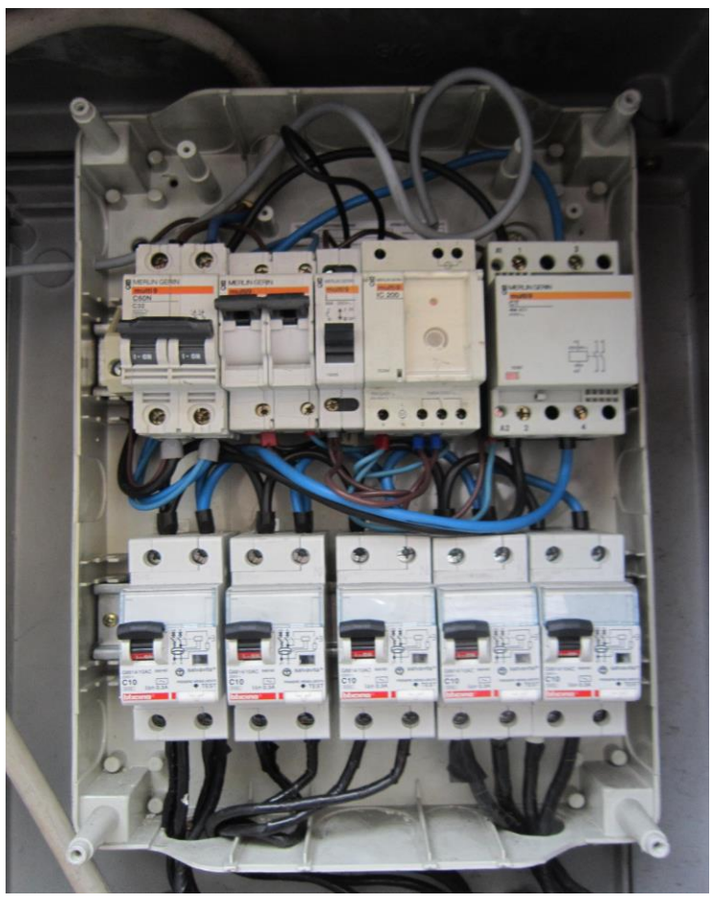









TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	618928		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI - ISOLAMENTO CAVI IN ARRIVO A NASTRO				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	2	NO						
L 01	C10	2	300mA	AC	4X4	VECCHIO RIG.	>100	260	18
L 02	C10	2	300mA	AC				265	24
L 03	C10	2	300mA	AC	4X4	FG7OR	>100	260	38
L 04	C10	2	300mA	AC				255	37
L 05	C10	2	300mA	AC	4X10	FG7OR	>100	260	22
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,04874	MERIDIANI	11,1372	
TRENTO - ASIAGO via				
QC005		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		20,73			SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	VIA BARTOLOMEO	3,78			SI	NO
L 02	VIA ASIAGO CERNIDOR 1	1,75			SI	NO
L 03	VIA ASIAGO CERNIDOR 2	2,55			SI	NO
L 04	VIA ASIAGO I.P.I.A 1	6,44			SI	NO
L 05	VIA ASIAGO I.P.I.A 2	6,21			SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere non presenti. Grado di protezione dell'involucro compromesso. Schemi elettrici non presenti. Cavi nastrati in uscita dal quadro.					

PARALLELI	46,0531	MERIDIANI	11,13647	
TRENTO - ASIAGO via				
QC006		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	615410		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA					SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE		
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA					SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE		
STATO DEI CABLAGGI Q.E.					SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE		
STATO MORSETTIERE					SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE		
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO				
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	63A SEZION.	4	NO						
L 01	C10	4/3	300mA	AC	4X16	FG7OR	>100	280	48
L 02	C10	4/3	300mA	AC	4X16	FG7OR	>100	265	38
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,0531	MERIDIANI	11,13647	
TRENTO - ASIAGO via				
QC006		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		5,11	5,61	4,72	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	CIRCUITO 1	2,68	3,39	2,20	SI	NO
L 02	CIRCUITO 2	2,43	2,22	2,52	SI	NO
L 03					SI	NO
L 04					SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di protezione generale dal cortocircuito. Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. Mancanza di falsi poli su finestre DIN 35.					

PARALLELI	4604396	MERIDIANI	11,1396	
TRENTO - ASIAGO via				
QC007		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	720282		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. LEC 3X30A 35V				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C63	4	300mA	AC REG.				290	58
L 01	C16	2			2X10	FG7OR	>100		
L 02	C10	2			2X6	FG7OR	>100		
L 03	C10	2			2X10	FG7OR	>100		
L 04	C10	2			2X6	FG7OR	>100		
L 05	C10	2			3X6	FG7OR	>100		
L 06	C10	2			3X6	FG7OR	>100		
L 07	C10	3			4X6	FG7OR	>100		
L 08	C10	2			2X6	FG7OR	>100		
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01	C10	2	300mA	AC	3X2,5	FG7OR	>100	268	44
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	4604396	MERIDIANI	11,1396	
TRENTO - ASIAGO via				
QC007		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		10,08	12,17	7,06	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	CAVO 1	9,62			SI	NO
L 02	CAVO 2		1,90		SI	NO
L 03	CAVO 3		0,94		SI	NO
L 04	CAVO 4			2,07	SI	NO
L 05	CAVO 5			3,13	SI	NO
L 06	CAVO 6-7		5,62		SI	NO
L 07	CAVO 8	0,46	2,04	1,86	SI	NO
L 08	SOTTOPASSO CAVO 9		1,67		SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01	MUFFOLE	0,00			SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Schemi elettrici non presenti. Interruttori di marche diverse.					

PARALLELI	46,06992	MERIDIANI	11,13153	
TRENTO - AVANCINI via				
QC008		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	623977		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.		DISORDINATO				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON TUTTE PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	SEZ. 63A	4							
L 01	C10	2	300mA	AC	2X4	FG7OR	>100	275	33
L 02	C20	2	300mA	AC				265	32
L 03	C20	2	300mA	AC	4X10	FG7OR	>100	265	30
L 04	C16	2	300mA	AC				265	36
L 05	C16	2	300mA	AC	4X4	RIGIDO	>100	260	36
L 06	C16	2	300mA	AC				255	35
L 07	C16	2	300mA	AC	4X6+2X4	RIGIDO	>100	265	33
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,06992	MERIDIANI	11,13153			
TRENTO - AVANCINI via						
QC008			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**19,40**	**5,52**	**0,50**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	SOTTOPASSO			0,50	**SI**	**NO**
L 02	VIA GIARDINI	9,82			**SI**	**NO**
L 03	VIA GIARDINI	8,84			**SI**	**NO**
L 04	ANTARES SX QUADRO	0,74			**SI**	**NO**
L 05	PALO SOPRA QUADRO		0,53		**SI**	**NO**
L 06	VIA AVANCINI		2,55		**SI**	**NO**
L 07	VIA AVANCINI		2,44		**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di protezione generale dal cortocircuito. Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. Giunzioni non idonee al tipo di impiego e posa.					


PARALLELI	46,06908	MERIDIANI	11,12208	
TRENTO - BELENZANI via				
QC009		MANUTENERE	RIFARE	BUONO







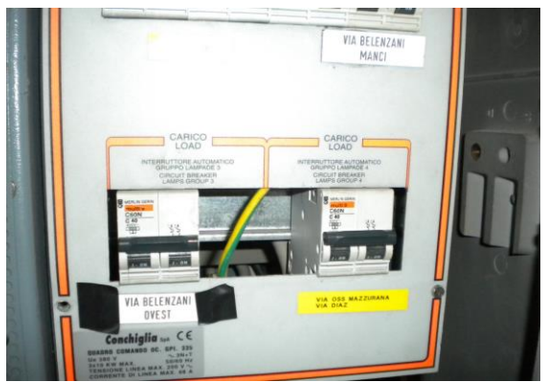

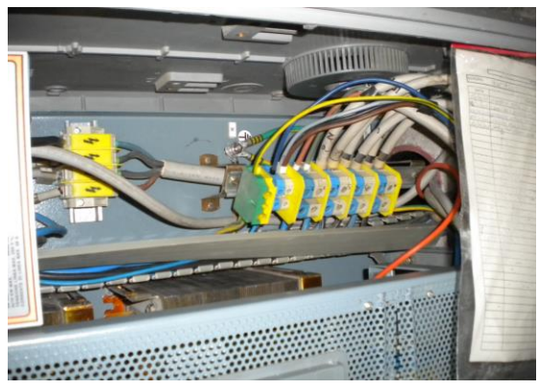

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	624017		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA - GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. ESCLUSO	CEP 335 HMU			
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD. TOTALE	ALGORAB RES-2			
CREPUSCOLARE	SI	NO	THEBEN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN	
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C63	4	300mA	REG AC				287	104
L 01	C40	2			2X10	FG7OR	>100		
L 02	C16	2			2X6	FG7OR	>100		
L 03	C25	2			4X6	FG7OR	>100		
L 04	C63	2			1X2X35	FG7OR	>100		
L 05	C40	2			1X2X35	FG7OR	>100		
L 06	C40	2			1X2X35	FG7OR	>100		
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,06908	MERIDIANI	11,12208			
TRENTO - BELENZANI via						
QC009			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		26,26	36,90	22,82	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	VIA ORNE 1	4,80			SI	NO
L 02	VIA ORNE 2		14,76		SI	NO
L 03	FARI 3 PALAZZO MUNICIPALE		6,22		SI	NO
L 04	VIA BELENZANI / MANCI		15,92		SI	NO
L 05	VIA BELENZANI OVEST			22,82	SI	NO
L 06	VIA OSS. MAZZURANA / DIAZ	21,46			SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. Mancanza di falsi poli su finestre DIN 35.					


PARALLELI	46,09253	MERIDIANI	11,10153	
TRENTO - BETTINE via				
QC010		MANUTENERE	RIFARE	BUONO





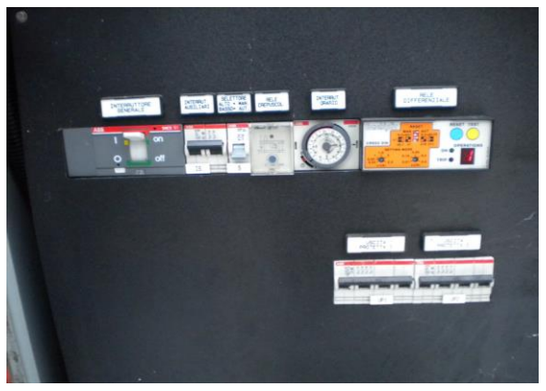



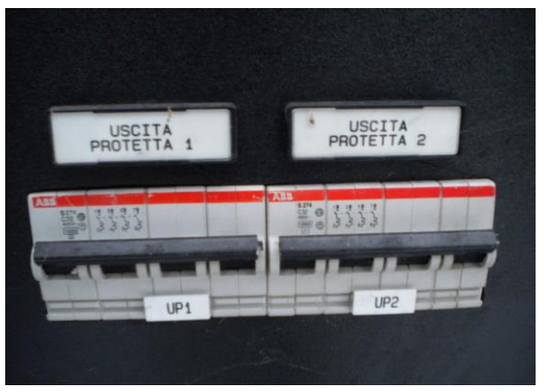

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	607517		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	THEBEN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	ABB
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C80	4	300mA	AC REG.				255	29
L 01	C32	4			4X2,5+4X4	FG7OR	>100		
L 02	C32	4			4X6	FG7OR	>100		
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,09253	MERIDIANI	11,10153	
TRENTO - BETTINE via				
QC010		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		7,15	6,25	8,28	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	USCITA PROTETTA 1	7,15	0,00	8,28	SI	NO
L 02	USCITA PROTETTA 2	0,00	6,25	0,00	SI	NO
L 03					SI	NO
L 04					SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. Mancato coordinamento fra protezione magnetotermica e linea dorsale asservita.					

PARALLELI	46,08065	MERIDIANI	11,11356	
TRENTO - BRAILLE L. ADIGE				
QC011				ELIMINATO

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA					SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA					SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.					SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE					SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.		
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.		
CREPUSCOLARE		SI	NO			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.		
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE									
L 01									
L 02									
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,08065	MERIDIANI	11,11356	
TRENTO - BRAILLE L. ADIGE				
QC011			ELIMINATO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE					SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01					SI	NO
L 02					SI	NO
L 03					SI	NO
L 04					SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :						


PARALLELI	46,08562	**MERIDIANI**	11,11404	
TRENTO - BRENNERO via del				

QC012		MANUTENERE	RIFARE	BUONO







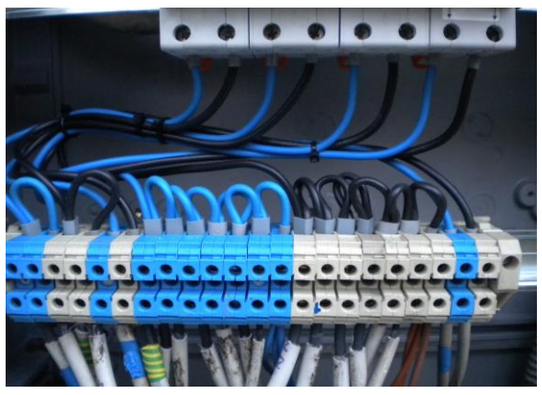



TENSIONE	**230V MF**	**230V 3F**	**400V 3F**	**POD**	**619488**		**NOTE**
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA						**SUFFICIENTE INSUFFICIENTE**	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA						**SUFFICIENTE INSUFFICIENTE**	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						**SUFFICIENTE INSUFFICIENTE**	
STATO MORSETTIERE						**SUFFICIENTE INSUFFICIENTE**	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	2 MERLIN GERIN (1 PER LUCI SOTTOPASSO ALTRO PER PUBBLICA)			
OROLOGIO		SI	NO	**ASTRONOMICO**	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	**DISEGNI Q.E.**	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	**PE SU PALI**	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	4							
L 01	C16	2	300mA	AC	1X2X10+1X2X10	FG7OR	>100	260	34
L 02	C25	2	300mA	AC	1X2X10	FG7OR	>100	260	32
L 03	C16	2	300mA	AC	2X2,5+2X2,5+2X2,5+1X2X6+1X2X6+1X2X6+1X2X6+1X2X4	FG7OR	>100	265	34
L 04	C10	2	300mA	AC	1X2X4	FG7OR	>100	265	38
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,08562	**MERIDIANI**	11,11404			
TRENTO - BRENNERO via del						
QC012			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**12,54**	**20,92**	**10,53**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	LINEA R	12,54			**SI**	**NO**
L 02	LINEA S		20,82		**SI**	**NO**
L 03	LINEA T			10,53	**SI**	**NO**
L 04	LUCI FT2		0,10		**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,0937	MERIDIANI	11,11404	
TRENTO - BRENNERO via del				
QC013		MANUTENERE	RIFARE	BUONO





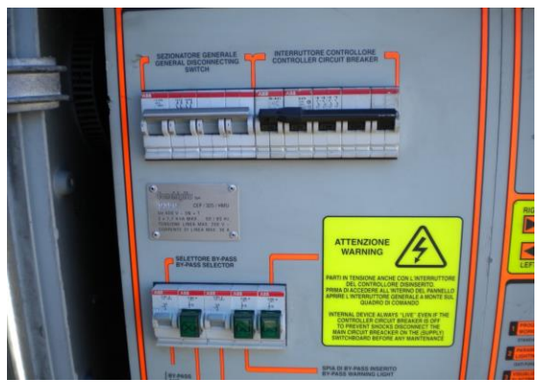





TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	619674		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 325 HMU				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	THEBEN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.	DEHN			
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C50	4	300mA	REG. AC				290	44
L 01	C32	4			4x10	FG7OR	>100		
L 02	C16	4			4x10	FG7OR	>100		
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,0937	MERIDIANI	11,11404	
TRENTO - BRENNERO via del				
QC013		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		13,55	15,10	14,92	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	VIA DEL BRENNERO SUD	10,57	13,31	12,29	SI	NO
L 02	VIA DEL BRENNERO NORD	2,75	1,71	2,59	SI	NO
L 03					SI	NO
L 04					SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione.					


PARALLELI	46,09109	MERIDIANI	11,1159	
TRENTO - BRENNERO via del				
QC014		MANUTENERE	RIFARE	BUONO









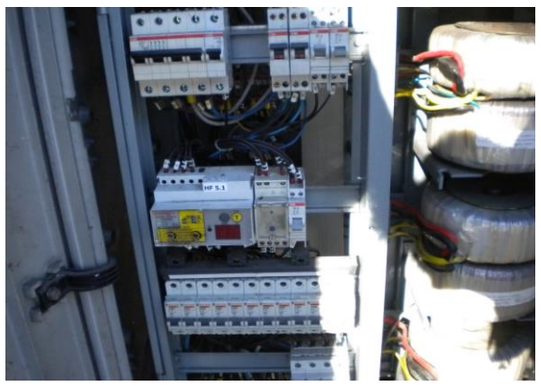

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	624539		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD. CEP 315 HSP			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	THEBEH			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	D32	4	300mA	REG. AC				260	52
L 01	C10	3			4x16	FG7OR	>100		
L 02	C10	3			4x16	FG7OR	>100		
L 03	C10	3			4x16	FG7OR	>100		
L 04	C10	3			4x16	FG7OR	>100		
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



DOC. 02.3

Censimento puntuale dei quadri di comando di pubblica illuminazione

PARALLELI	46,09109	**MERIDIANI**	11,1159			
TRENTO - BRENNERO via del						
QC014			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**9,74**	**13,95**	**12,57**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	VIA ZAMBRA NORD	1,60	3,48	2,85	**SI**	**NO**
L 02	VIA ZAMBRA SUD - VIA GILLI SUD	2,27	3,58	3,64	**SI**	**NO**
L 03	VIA BRENNERO SUD	0,00	3,71	3,59	**SI**	**NO**
L 04	VIA BRENNERO NORD	5,68	7,68	6,62	**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione.					

PARALLELI	46,06546	MERIDIANI	11,12568	
TRENTO - BARBACOVI via				
QC015		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	631355		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD. CEP 335 HMU			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	THEBEN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C80	4	500mA	REG. AC				435	124
L 01	C16	3			4X6	FG7OR	>100		
L 02	C16	3			4X6	FG7OR	>100		
L 03	C10	3			4X4	FG7OR	>100		
L 04	C10	3			4X4	FG7OR	>100		
L 05	C16	3			4X10	FG7OR	>100		
L 06	C16	3			4X10	FG7OR	>100		
L 07	C10	3			4X6	FG7OR	>100		
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,06546	MERIDIANI	11,12568			
TRENTO - BARBACOVI via						
QC015			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		23,18	21,27	41,22	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	IMPIANTO ESISTENTE NO CONTROLLORE	2,38	IN CORTO	18,59	SI	NO
L 02	LATO GIARDINI	4,25	3,82	4,19	SI	NO
L 03	VIA BARBACOVI LATO CARCERE	2,34	2,11	1,67	SI	NO
L 04	LATO TRIBUNALE	2,93	2,34	2,61	SI	NO
L 05	VIA BARBACOVI LATO CARABINIERI	3,07	4,32	4,52	SI	NO
L 06	VIA BARBACOVI LATO SCUOLE	5,75	6,70	7,26	SI	NO
L 07	VIA BARBACOVI	2,46	1,98	2,38	SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere non presenti. Schemi elettrici non aggiornati.					

PARALLELI	46,0714	MERIDIANI	11,10912	
TRENTO - BRESCIA via				
QC016		MANUTENERE	RIFARE	BUONO







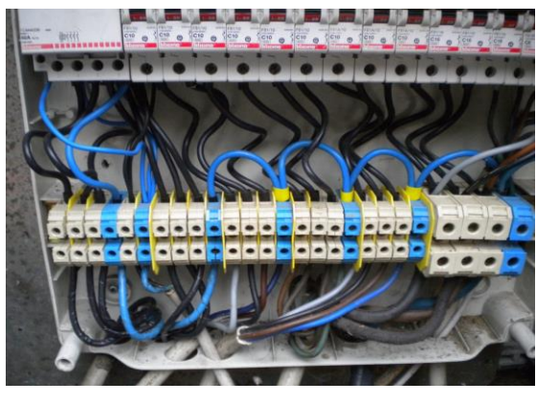



TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	620956		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 315 HMU				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C25	4	300mA	REG. AC				285	98
L 01	C10	3			4X6	FG7OR	>100		
L 02	C10	3			4X6	FG7OR	>100		
L 03	C10	3			4X6	FG7OR	>100		
L 04	C16	3			4X25+4X6	FG7OR	>100		
L 05	C6	3			4X2,5	FG7OR	>100		
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,0714	MERIDIANI	11,10912	
TRENTO - BRESCIA via				
QC016		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**13,67**	**12,27**	**15,88**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	1,26	2,99	4,13	**SI**	**NO**
L 02	VIA BRESCIA	2,79	2,15	4,29	**SI**	**NO**
L 03	VIA BRESCIA AG FUN	1,09	1,05	1,05	**SI**	**NO**
L 04	VIA BRESCIA SOTTO	6,85	6,08	5,82	**SI**	**NO**
L 05	VIA DOSS TRENTO	1,68	0,00	0,59	**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro (quadro di distribuzione). Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,07694	MERIDIANI	11,09989	
TRENTO - BRESCIA via 11A				
QC017		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	648667		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO				
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C20	2	300mA	AC				278	34
L 01	C16	2			4X16+4X6	FG7OR	>100		
L 02	C16	2			4X16+4X6	FG7OR	>100		
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01	C20	2	300mA	AC	2X10	FG7OR	>100	269	24
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,07694	MERIDIANI	11,09989	

TRENTO - BRESCIA via 11A


QC017		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**13,87**			**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	6,79			**SI**	**NO**
L 02	CIRCUITO 2	4,12			**SI**	**NO**
L 03					**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01	MESSAGGIO VARIABILE	2,96			**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti.					


PARALLELI	46,0766	MERIDIANI	11,1198	
TRENTO - BUONARROTI corso				
QC018		MANUTENERE	RIFARE	BUONO





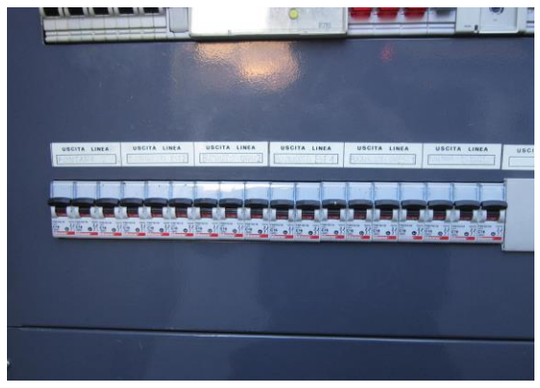



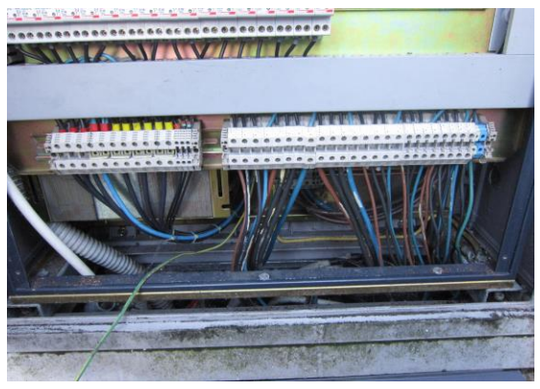

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	619918		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		ES ELETTRONICA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. ES ELETTRONICA ESM				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C40	4	300mA	REG. AC				295	64
L 01	C16	3			4x6	FG7OR	>100		
L 02	C16	3			4x10	FG7OR	>100		
L 03	C16	3			4x10	FG7OR	>100		
L 04	C16	3			4x10	FG7OR	>100		
L 05	C16	3			4x4	FG7OR	>100		
L 06	C16	3			4x4+4x4	FG7OR	>100		
L 07	C10	2	300mA	AC	2x6	FG7OR	>100	280	48
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,0766	MERIDIANI	11,1198	
TRENTO - BUONARROTI corso				
QC018		MANUTENERE	RIFARE	BUONO


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		21,40	19,35	20,08	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	FONTANA	1,45	1,89	2,10	SI	NO
L 02	BUONARROTI EST2	6,10	6,23	6,48	SI	NO
L 03	BUONARROTI OVEST2	4,42	5,40	3,34	SI	NO
L 04	BUONARROTI EST1	2,80	1,40	1,37	SI	NO
L 05	BUONARROTI OVEST1	2,03	1,81	1,84	SI	NO
L 06	FONTANA LAV SOTTO STOPPANI	4,10	2,62	4,95	SI	NO
L 07	LUCI CENTRALI SOTTOPASSO	0,50			SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,06088	MERIDIANI	11,12512	
TRENTO - C.3 NOVEMBRE				
QC019		MANUTENERE	RIFARE	BUONO







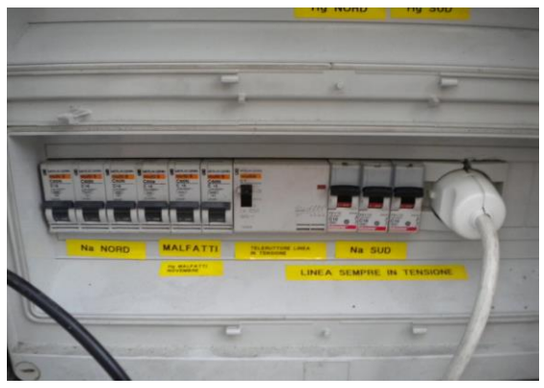



TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	633275		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.		DISORDINATO - PRESA SENZA CONDUTTORE DI TERRA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD. PARZIALE ALGORAB - RES2			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	MERLIN GERIN
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C40	4	300mA	REG. AC				285	88
L 01	C10	3			4X4	FG7OR	>100		
L 02	C16	3			4X6	FG7OR	>100		
L 03	C16	3			4X10	FG7OR	>100		
L 04	C10	3			4X6+4X2,5	FG7OR	>100		
L 05	C10	3	LINEA TELEGESTITA		4X6	FG7OR	>100		
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,06088	MERIDIANI	11,12512	
TRENTO - C.3 NOVEMBRE				
QC019		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**17,77**	**18,95**	**24,36**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	HG NORD	1,64	2,07	5,03	**SI**	**NO**
L 02	HG SUD	5,85	3,73	7,62	**SI**	**NO**
L 03	NA NORD	5,86	7,01	4,86	**SI**	**NO**
L 04	MALFATTI HG MALFATTI NOVEMBRE	1,40	2,08	4,40	**SI**	**NO**
L 05	NA SUD	3,02	4,06	2,45	**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere non presenti. Grado di protezione dell’involucro compromesso. Schemi elettrici non presenti. Presa elettrica senza conduttore di protezione.					

PARALLELI	46,06248	MERIDIANI	11,12411			
TRENTO - C.3 NOVEMBRE						
QC020			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	



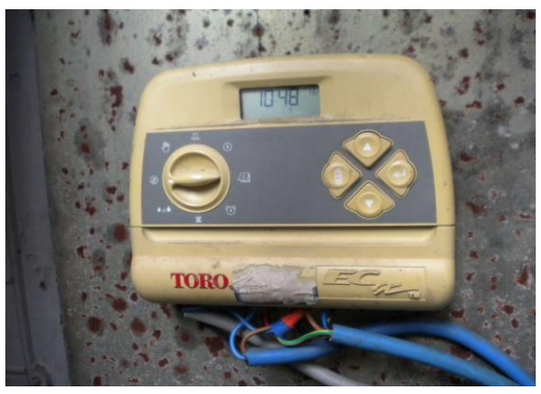







TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	632215		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.		DISORDINATO				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	DA ESTERNO THEBEN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C25	2	300mA	AC				265	32
L 01	C20	2			2X4	RIGIDO	>100		
L 02	C20	2			2X4+2X4	RIGIDO	>100		
L 03	C6	2			2X2,5	FG7OR	>100		
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01	C16	2	NO		2X1	CAVETTO	>100		
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,06248	MERIDIANI	11,12411			
TRENTO - C.3 NOVEMBRE						
QC020			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		9,99			SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	FARI COMMISSARIATO	0,00			SI	NO
L 02	PALETTI HG	9,68			SI	NO
L 03	PENSILINA AUTOBUS	0,15			SI	NO
L 04					SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01	IRRIGAZIONE	0,16			SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere non presenti. Grado di protezione dell'involucro compromesso. Schemi elettrici non presenti. Presa elettrica senza conduttore di protezione.					


PARALLELI	46,07535	MERIDIANI	11,11491	
TRENTO – C.V.MARIANO				
QC021		MANUTENERE	RIFARE	BUONO





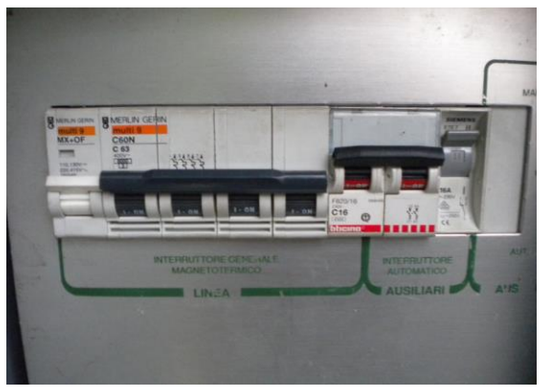



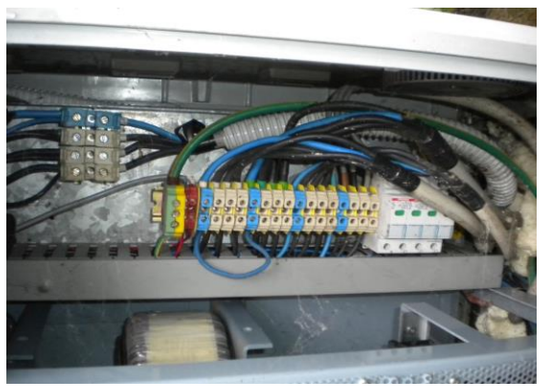

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	620170		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO				
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.	BTICINO		
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C63	4	300mA	REG. AC				290	132
L 01	C16	3			4X16	FG7OR	>100		
L 02	C16	3			4X25	FG7OR	>100		
L 03	C10	3			4X10	FG7OR	>100		
L 04	C6	3			4X6	FG7OR	>100		
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									

PARALLELI	46,07535	**MERIDIANI**	11,11491			
TRENTO – C.V.MARIANO						
QC021			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
		14,08	16,40	17,69	SI	NO
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	VIA MARCO APULEIO SUD	5,75	4,33	3,99	**SI**	**NO**
L 02	VIA CAIO/VIA APULEIO NORD	5,94	4,77	5,40	**SI**	**NO**
L 03	VIA DOSS TRENTO	1,46	1,19	1,15	**SI**	**NO**
L 04	PARCO CAIO VALERIO	4,96	5,16	2,29	**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Interruttori di marche diverse.					

PARALLELI	46,09409	MERIDIANI	11,12051	
TRENTO - CHIOCCHETTI Via				
QC022		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	625037		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	NO/PURO 25A	4	30mA	AC				24	22
L 01	C16	3			4x1x6	FG7OR	>100		
L 02	C16	3			4x16	FG7OR	>100		
L 03	C10	3			4x4	FG7OR	>100		
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									

PARALLELI	46,09409	**MERIDIANI**	11,12051			
TRENTO - CHIOCCHETTI Via						
QC022			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**8,77**	**6,17**	**9,23**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	VIA CENTOCHIAVI NORD	3,96	2,87	4,09	**SI**	**NO**
L 02	VIA CENTOCHIAVI SUD	2,50	2,29	3,22	**SI**	**NO**
L 03	PARCO	3,68	1,31	1,72	**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di protezione generale dal cortocircuito. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. Grado di protezione dell'involucro compromesso. Interruttori di marche diverse.					

PARALLELI	46,06651	MERIDIANI	11,12226	
TRENTO - CAPITOLO vicolo del				
QC023		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	636852		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI						SUFFICIENTE	
CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. NON ESCLUSO	LEC 3X80A 35V			
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD. TOTALE	ALGORAB RES-2			
CREPUSCOLARE	SI	NO					
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		THEBEN
SCARICATORI	SI	NO	MOD.	OBO			
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI


CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C80	4	300mA	REG. AC				285	84
L 01	C16	3			4X10	FG7OR	>100		
L 02	C16	3			4X4	FG7OR	>100		
L 03	C16	3			4X4	FG7OR	>100		
L 04	C16	3			4X4+2X2,5	FG7OR	>100		
L 05	C16	3			4X4	FG7OR	>100		
L 06	C16	3			4X6	FG7OR	>100		
L 07	C16	3			4X10	FG7OR	>100		
L 08	C16	3			4X6	FG7OR	>100		
L 09	C16	3			4X10	FG7OR	>100		
L 10	C16	3			4X10	FG7OR	>100		
L 11	C16	3			4X6	FG7OR	>100		
L 12	C16	3			4X10	FG7OR	>100		
L 13	C16	3							
L 14	C16	3							
CE01	C10	2	30mA	AC	3X2,5	FG7OR	>100	26	32



PARALLELI	46,06651	MERIDIANI	11,12226			
TRENTO - CAPITOLO vicolo del						
QC023			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**34,02**	**38,53**	**31,92**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	TORRE CIVICA	10,63	11,98	9,78	**SI**	**NO**
L 02	PIAZZA DUOMO LATO OVEST E NORD	2,10	4,97	1,14	**SI**	**NO**
L 03	VIA VERDI NORD/VIA MAFFEI (SOLO FARI)	2,10	7,50	0,00	**SI**	**NO**
L 04	VICOLO CAPITOLO/PIAZA D'AROGNO (BRA)	0,75	0,30	0,30	**SI**	**NO**
L 05	PIAZZA D'AROGNO BRACCI	0,41	0,41	0,46	**SI**	**NO**
L 06	VIA PRATI/MAFFEI PALI/ESTERLE	3,18	1,91	2,02	**SI**	**NO**
L 07	VIA ESTERLE/ORTI	2,50	1,37	2,63	**SI**	**NO**
L 08	VIA CALEPINA NORD	5,19	2,88	4,16	**SI**	**NO**
L 09	VIA CALEPINA SUD	2,25	0,00	4,13	**SI**	**NO**
L 10	VIA S. VIGILIO	2,40	2,42	2,44	**SI**	**NO**
L 11	VIA MAZZINI	1,25	2,38	2,40	**SI**	**NO**
L 12	VIA S.S. TRINITA'	1,06	2,41	2,46	**SI**	**NO**
L 13	RISERVA				**SI**	**NO**
L 14	RISERVA				**SI**	**NO**
L 15	RISERVA				**SI**	**NO**
CE01	TEW IP	0,20			**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,08733	MERIDIANI	11,10648	
TRENTO - CAMPOTRENTINO via di				
QC024		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

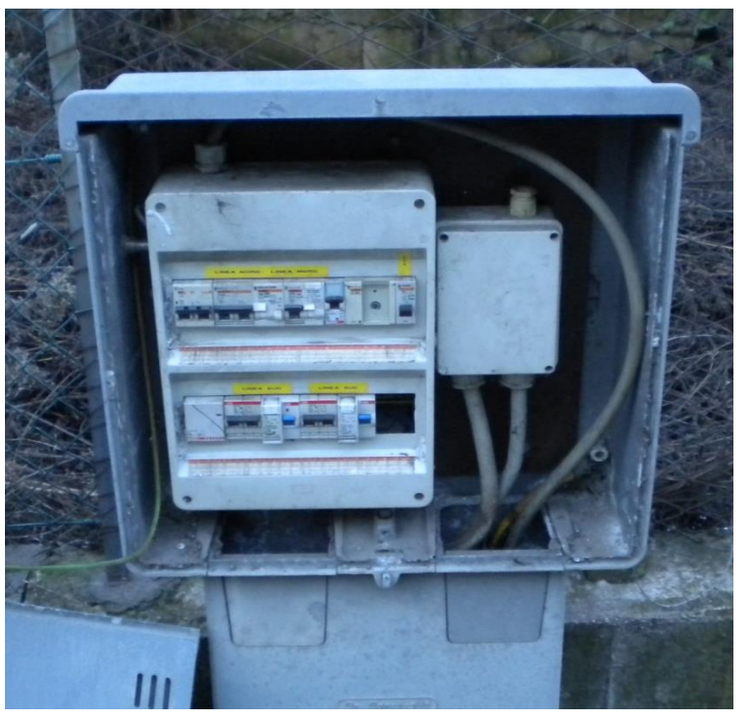









TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	620234		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		SCATOLA A PARTE				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C25	2	CANCELLATE SCRITTE						
L 01	C16	1+N	300mA	AC			>100	260	33
L 02	C10	1+N	300mA	AC	4x10	FG7 RIGIDO	>100	250	28
L 03	C10	1+N	300mA	AC			>100	265	32
L 04	C10	1+N	300mA	AC	4x6	FG7OR	>100	250	38
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,08733	**MERIDIANI**	11,10648			
TRENTO - CAMPOTRENTINO via di						
QC024			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**17,05**			**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	LINEA NORD	4,48			**SI**	**NO**
L 02	LINEA NORD	4,13			**SI**	**NO**
L 03	LINEA SUD	5,05			**SI**	**NO**
L 04	LINEA SUD	3,22			**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione protezione generale dal cortocircuito. Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. Mancanza di falsi poli su finestre DIN 35.					


PARALLELI	46,09907	MERIDIANI	11,09926	
TRENTO - CAPRONI via				
QC025		MANUTENERE	RIFARE	BUONO









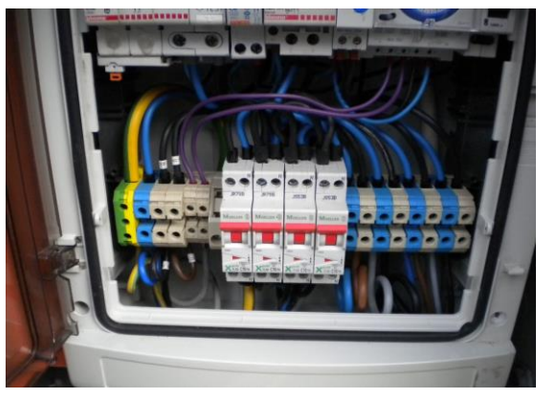

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	608118		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. LEC SP 1X25A				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	THEBEN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN	
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	2	300mA	AC				280	11
L 01	C10	2							
L 02	C10	2			4X16	FG7OR	>100		
L 03	C10	2							
L 04	C10	2			4X6	FG7OR	>100		
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,09907	MERIDIANI	11,09926	
TRENTO - CAPRONI via				
QC025		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		16,06			SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	CIRCUITO 1	4,28			SI	NO
L 02	CIRCUITO 2	3,76			SI	NO
L 03	CIRCUITO 3	4,41			SI	NO
L 04	CIRCUITO 4	3,61			SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. Interruttori di marche diverse.					


PARALLELI	46,09418	MERIDIANI	11,10547	
TRENTO - CANEPPELE via				
QC026		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



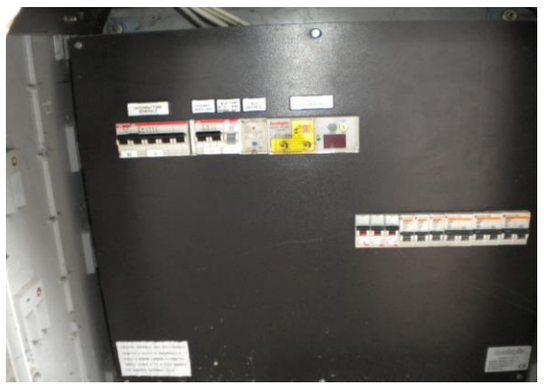





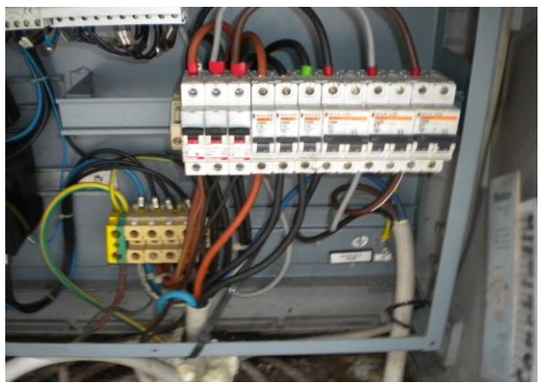

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	607805		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	THEBEN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	


TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	4	300mA	AC REG.				265	22
L 01	C6	3			4X2,5	FG7OR	>100		
L 02	C32	3			4X25	FG7OR	>100		
L 03	C10	2							
L 04	C10	2							
L 05	C10	2			4X16	FG7OR	>100		
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01	C6	2			3X2,5	FG7OR	>100		
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,09418	MERIDIANI	11,10547	
TRENTO - CANEPPELE via				
QC026		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**21,63**	**22,55**	**18,21**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	0,81	0,72	0,99	**SI**	**NO**
L 02	CIRCUITO 2	16,39	16,72	12,88	**SI**	**NO**
L 03	CIRCUITO 3	4,23			**SI**	**NO**
L 04	CIRCUITO 3		5,11		**SI**	**NO**
L 05	CIRCUITO 3			4,34	**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01	RILEVAMENTO TRAFFICO	0,20			**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere non presenti. Schemi elettrici non presenti. Interruttori di marche diverse.					

PARALLELI	46,07721	MERIDIANI	11,11941	
TRENTO - CANTORE piazza				
QC027		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

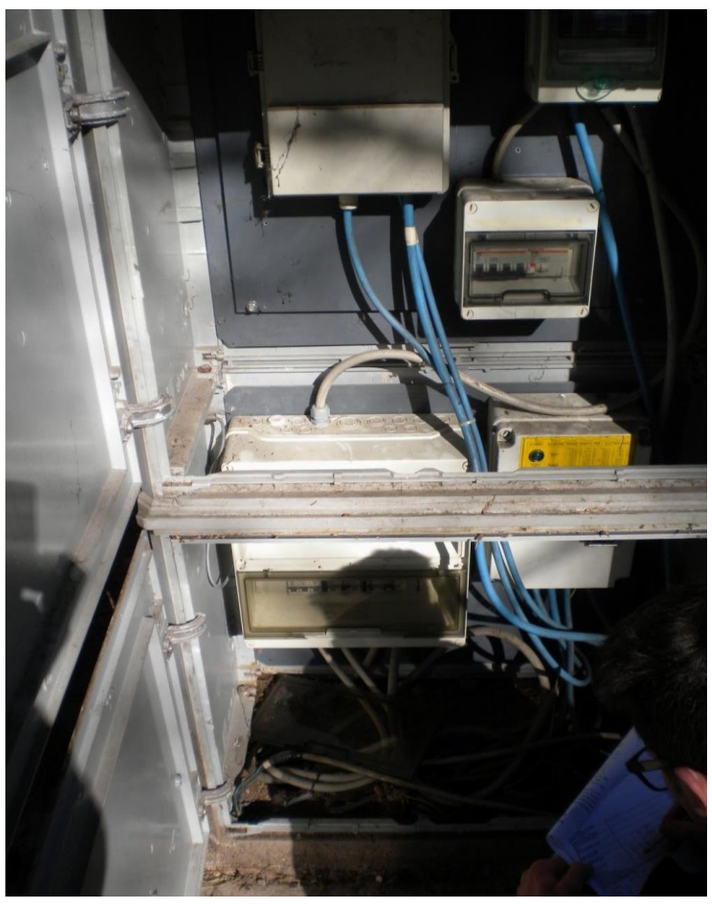









TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	631312		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.		DISORDINATO				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	SEZ. 63A	4	300mA	PURO 25A AC				280	32
L 01	C10	3			4X2,5+4X2,5	FG7OR	>100		
L 02	C10	3			4X6	FG7OR	>100		
L 03	C10	3			4X6	FG7OR	>100		
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,07721	MERIDIANI	11,11941			
TRENTO - CANTORE piazza						
QC027				MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**5,72**	**1,64**	**6,34**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	0,52	0,55	0,58	**SI**	**NO**
L 02	CIRCUITO 2	1,68	0,57	1,72	**SI**	**NO**
L 03	CIRCUITO 3	3,52	0,52	4,04	**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di protezione generale dal cortocircuito. Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere non presenti. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,06667	MERIDIANI	11,1334	
TRENTO - CAVE via				
QC028		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	624814		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		BOCCHIOTTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	FINDER			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C50	4	500mA	AC				445	54
L 01	C16	3			4X10+4X4	FG7OR	>100		
L 02									
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,06667	**MERIDIANI**	11,1334			
TRENTO - CAVE via						
QC028			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**2,84**	**4,48**	**3,34**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	2,84	4,48	3,34	**SI**	**NO**
L 02					**SI**	**NO**
L 03					**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere non presenti. Schemi elettrici non presenti. Interruttori di marche diverse.					

PARALLELI	46,0756	MERIDIANI	11,12375	
TRENTO - GIARDINI piazza CENTA				
QC029		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



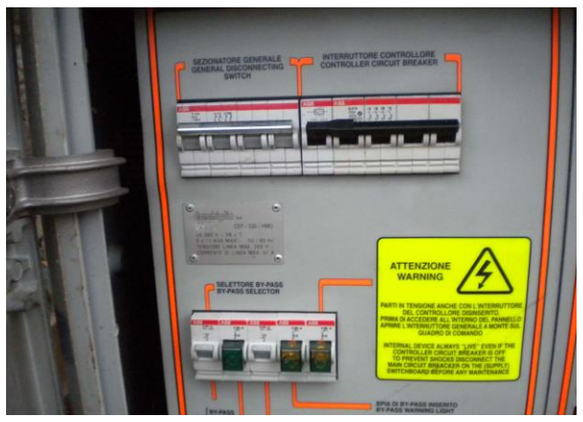



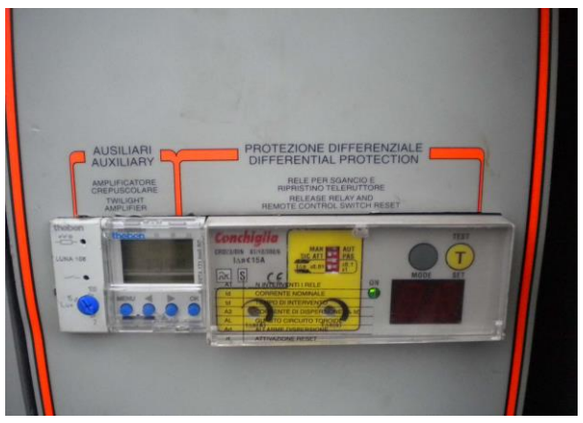



TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	620604		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		BOCCHIOTTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD. CEP 335 HMU			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	FINDER			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN
SCARICATORI		SI	NO	MOD.	BTICINO		
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C80	4	500mA	REG. AC				390	106
								MORS.	COLL.
L 01	C20	3			4X10			2	RST
L 02	C16	3			4X4			1	RST
L 03	C16	3			4X16			3	RST
L 04	C16/20/16	3			4X4			4	RST
L 05	C16	3			4X10			5	RST
L 06	C32/16/16	3			4X10			6	RST
L 07	C16	3			4X10			7	RST
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,0756	MERIDIANI	11,12375	
TRENTO - GIARDINI piazza CENTA				
QC029		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		35,26	29,04	33,21	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	CIRCUITO 1	9,10	4,28	4,81	SI	NO
L 02	CIRCUITO 2	0,40	0,00	0,45	SI	NO
L 03	CIRCUITO 3	6,39	7,00	6,62	SI	NO
L 04	CIRCUITO 4	3,03	3,50	4,48	SI	NO
L 05	CIRCUITO 5	6,36	6,65	5,10	SI	NO
L 06	VIA VANNETTI	6,70	5,28	7,25	SI	NO
L 07	VIA PETRARCA	3,28	2,33	4,50	SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,07559	MERIDIANI	11,12369	
TRENTO - CENTA piazza				
QC030		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



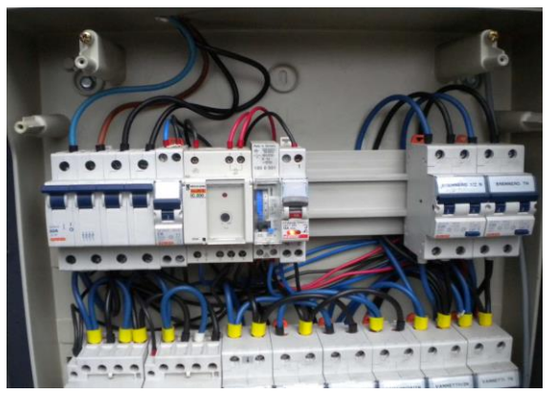



TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	620604		NOTE ALIMENTA ANCHE Q.E. 29
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		BTICINO				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		INGRESSO CAVI !!!!				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	SEZ. 32A	4							
L 01	C25	2	300mA	AC				255	18
L 02	C25	2	300mA	AC	4X16+4X16	FG7OR	>100	260	22
L 03	C25	2	300mA	AC				260	24
L 04	C25	2	300mA	AC	4X6+4X6	FG7OR	>100	255	24
L 05	C25	2	300mA	AC				270	26
L 06	C25	2	300mA	AC	4X25	FG7OR	>100	265	28
L 07	C25	2	300mA	AC				260	22
L 08	C25	2	300mA	AC	4X16	FG7OR	>100	260	24
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,07559	MERIDIANI	11,12369	
TRENTO - CENTA piazza				
QC030		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		10,84	11,60	4,63	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	BRENNERO MEZZA NOTTE		2,52		SI	NO
L 02	BRENNERO TUTTA NOTTE			3,21	SI	NO
L 03	PARCO MEZZA NOTTE	5,78			SI	NO
L 04	PARCO TUTTA NOTTE		3,38		SI	NO
L 05	ROMAGNO MEZZA NOTTE	5,06			SI	NO
L 06	ROMAGNO TUTTA NOTTE		4,45		SI	NO
L 07	VANNETTI MEZZA NOTTE		1,25		SI	NO
L 08	VANNETTI TUTTA NOTTE			1,42	SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. Teleruttori da sostituire.					

PARALLELI	46,0734	MERIDIANI	11,128	
TRENTO - CERVARA via				
QC031		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	624904		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		IREM				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		IREM				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		MANCA UNA MORSETTIERA PER PARTENZA 3				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD. PMR 315 EQ			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO				
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C50	4	500mA	REG. AC				435	100
								MORS.	COLL.
L 01	C20-20-10	3			4X6	FG7OR	>100	1	RST
L 02	C10	3			4X4	FG7OR	>100	2	RST
L 03	C10	3						3	RST
L 04	C16	3			4X10	FG7OR	>100	N.P.	RST
L 05	C16	3			4X16	FG7OR	>100	4	RST
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01	C16	2	NO		3X4	FG7OR	>100		
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,0734	MERIDIANI	11,128			
TRENTO - CERVARA via						
QC031			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**19,25**	**13,52**	**14,62**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	13,11	5,00	6,05	**SI**	**NO**
L 02	CIRCUITO 2	0,45	2,18	2,43	**SI**	**NO**
L 03	CIRCUITO 3 (RISERVA)				**SI**	**NO**
L 04	CIRCUITO 4	5,17	5,17	4,34	**SI**	**NO**
L 05	CIRCUITO 5	0,49	1,17	1,80	**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01	RILEVAMENTO TRAFFICO	0,03			**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere alcune non presenti. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,09181	MERIDIANI	11,10629	
TRENTO - COMMERCIO via del				
QC032		MANUTENERE	RIFARE	BUONO





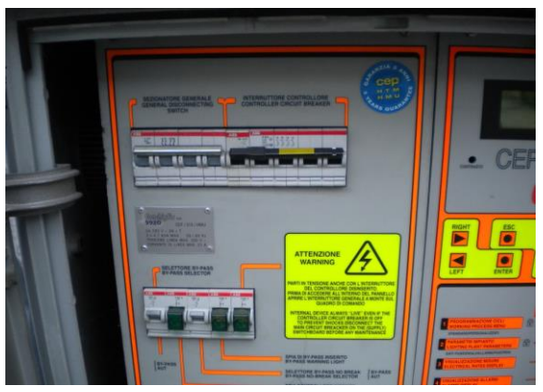





TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	620702		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 315 HMU				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	THEBEN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.	BTICINO			
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	4	300mA	AC REG.				267	45
L 01	C6	3			4X6	FG7OR	>100		
L 02	C6	3			4X6	FG7OR	>100		
L 03	C10	3			4X4	FG7OR	>100		
L 04	C10	3			4X10	FG7OR	>100		
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,09181	MERIDIANI	11,10629			
TRENTO - COMMERCIO via del						
QC032			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		7,90	10,71	10,99	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	CIRCUITO 1	0,90	0,00	0,85	SI	NO
L 02	CIRCUITO 2	0,90	0,88	1,42	SI	NO
L 03	CIRCUITO 3	4,11	3,97	3,08	SI	NO
L 04	CIRCUITO 4	1,99	5,86	5,64	SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione.					

PARALLELI	46,05258	MERIDIANI	11,12572	
TRENTO - GIARDINO BASKET EINAUDI				
QC033		MANUTENERE	RIFARE	BUONO





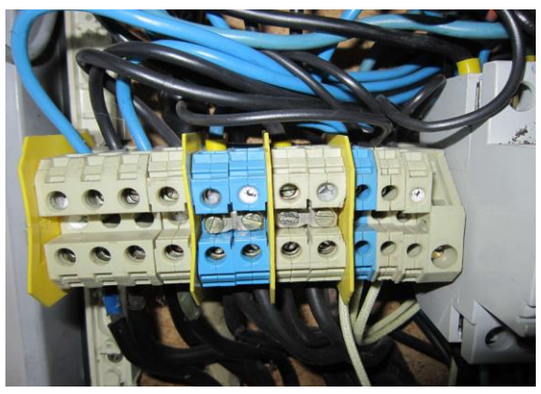





TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	634119		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		HAGER				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C20	2							
L 01	25A PURO	2	300mA	AC				275	28
L 02	25A PURO	2	300mA	AC	4X6	FG7OR	>100	260	42
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01	25A PURO	2	300mA	AC	4X4+4X4	FG7OR	>100	265	33
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,05258	**MERIDIANI**	11,12572			
TRENTO - GIARDINO BASKET EINAUDI						
QC033			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**4,01**			**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	LAMPIONCINI	2,00			**SI**	**NO**
L 02	LAMPIONCINI	2,01			**SI**	**NO**
L 03					**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01	FARI CAMPO BASKET	0,00			**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di protezione linee in uscita dal cortocircuito. Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere non presenti. Grado di protezione dell'involucro compromesso. Schemi elettrici non presenti.					


PARALLELI	46,03948	MERIDIANI	11,13848			
TRENTO - CONCI						
QC034			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	









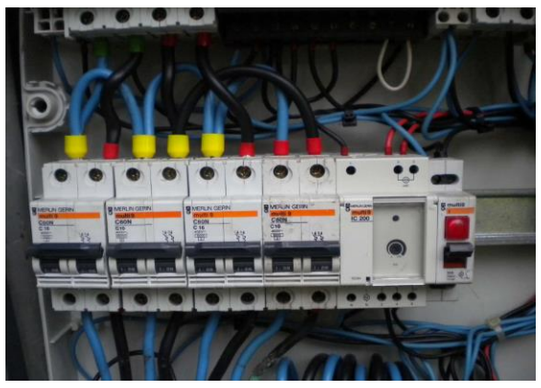

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	616353		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD.				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN	
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C20	4	500mA	REG. AC				435	125
L 01	C16	2							
L 02	C10	2		UNICO CAVO COLLEGATO	4X4	FG7OR	>100		
L 03	C16	2							
L 04	C10	2			4X4	FG7OR	>100		
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,03948	MERIDIANI	11,13848			
TRENTO - CONCI						
QC034			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		0,00	11,83	0,00	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	TUTTA NOTTE S	0,00			SI	NO
L 02	TUTTA NOTTE G		6,50		SI	NO
L 03	MEZZA NOTTE S			0,00	SI	NO
L 04	MEZZA NOTTE G		5,33		SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere non presenti. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,0397	MERIDIANI	11,14048	
TRENTO - CONCI				
QC035				DISMESSO







TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD			NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO				
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE									
L 01									
L 02									
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,0397	**MERIDIANI**	11,14048	
TRENTO - CONCI				
QC035		DISMESSO		

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE					**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01					**SI**	**NO**
L 02					**SI**	**NO**
L 03					**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :						

PARALLELI	46,04169	MERIDIANI	11,13922	
TRENTO - CONCI				
QC036		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	616289		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON TUTTE PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C40	4	250mA	REG. AC				245	98
L 01	C16	2							
L 02	C16	2			4X4+4X2,5	FG7OR	>100		
L 03	C10	2			2X4	FG7OR	>100		
L 04	C16	3			4X10	FG7OR	>100		
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,04169	MERIDIANI	11,13922			
TRENTO - CONCI						
QC036			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		7,57	6,40	1,94	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	GIARDINO MEZZA NOTTE	3,63			SI	NO
L 02	GIARDINO TUTTA NOTTE		2,68		SI	NO
L 03	CIRCUITO 3 (PASS. PEDONALE)	1,75			SI	NO
L 04	CIRCUITO 4 (VIA CONCI)	2,19	3,72	1,94	SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere non tutte presenti. Schemi elettrici non presenti.					


PARALLELI	46,0398	MERIDIANI	11,13696	
TRENTO - CONCI				
QC037		MANUTENERE	RIFARE	BUONO









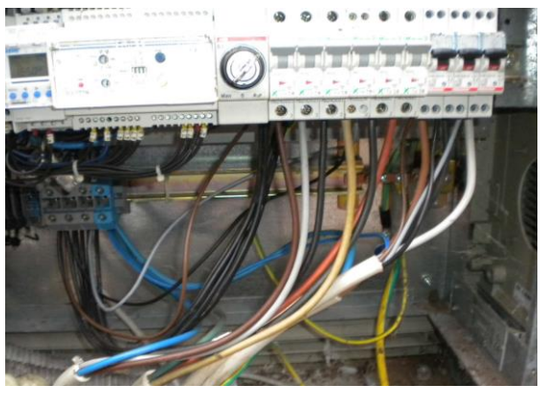

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	616255		NOTE STESSO CONTATORE Q.E. 38
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		REVERBERI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		REVERBERI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD. SEC STP 36			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO				
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C63	4	500mA	REG. AC	4X10	FG7OR	>100 (10Mt.)	425	128
L 01	C16	3			4X10	FG7OR	>100		
L 02	C16	3			4X16	FG7OR	>100		
L 03	C16	3			4X16+4X2,5	FG7OR	>100		
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,0398	MERIDIANI	11,13696			
TRENTO - CONCI						
QC037			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		18,20	16,99	16,47	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	CIRCUITO 1	4,74	3,80	2,94	SI	NO
L 02	CIRCUITO 2	6,22	6,59	7,35	SI	NO
L 03	CIRCUITO 3	7,24	6,60	6,18	SI	NO
L 04					SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere non presenti. Schemi elettrici non presenti. Interruttori di marche diverse.					

PARALLELI	46,03986	MERIDIANI	11,1371	
TRENTO - CONCI				
QC038		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD 616255			NOTE ALIMENTA Q.E 37
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.		DISORDINATO				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON TUTTE PRESENTI				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	PERRY
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	2							
L 01	B16	2	300mA	A				278	42
L 02	B16	2	300mA	A	4X6	FG7OR	>100	280	45
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01	C16	2	NO		3X2,5	FG7OR	>100		
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,03986	MERIDIANI	11,1371	
TRENTO - CONCI				
QC038		MANUTENERE	RIFARE	BUONO


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE				5,46	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	TUTTA NOTTE			3,22	SI	NO
L 02	MEZZA NOTTE			2,24	SI	NO
L 03					SI	NO
L 04					SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01	CANCELLO PARCO GARIBALDI			0,00	SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Grado di protezione dell'involucro compromesso. Schemi elettrici non presenti. Conduttori di cablaggio con colori errati.					

PARALLELI	46,05508	MERIDIANI	11,13452	
TRENTO - CROSINA SARTORI via				
QC039		MANUTENERE	RIFARE	BUONO







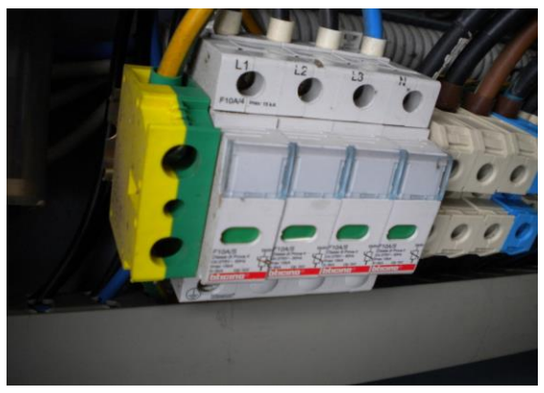



TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	629219		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 325 HMU				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	THEBEN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN	
SCARICATORI	SI	NO	MOD.	BTICINO			
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C50	4	300mA	REG. AC				295	79
L 01	C16	3			4X16	FG7OR	>100		
L 02	C10	3			4X10	FG7OR	>100		
L 03	C16	2			1X2X6	FG7OR	>100		
L 04	C16	2			1X2X6	FG7OR	>100		
L 05	C10	2			1X2X6	FG7OR	>100		
L 06	C16	2			1X2X6	FG7OR	>100		
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,05508	MERIDIANI	11,13452			
TRENTO - CROSINA SARTORI via						
QC039			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**22,29**	**19,03**	**18,63**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	7,24	6,39	8,06	**SI**	**NO**
L 02	CIRCUITO 2	3,29	2,90	4,46	**SI**	**NO**
L 03	CIRCUITO 3	8,39			**SI**	**NO**
L 04	CIRCUITO 4		9,74		**SI**	**NO**
L 05	CIRCUITO 5			6,11	**SI**	**NO**
L 06	CIRCUITO 6	3,37			**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione.					


PARALLELI	46,07043	MERIDIANI	11,11983	
TRENTO - DANTE piazza				
QC040		MANUTENERE	RIFARE	BUONO









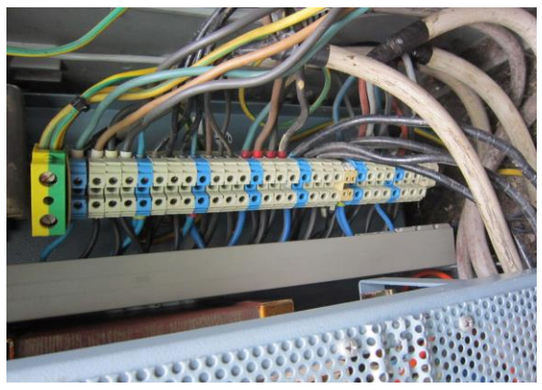

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	620784		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. ESCLUSO	CEP 335 HMU			
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD. TUTTO TELEGESTITO	ALGORAB RES 2			
CREPUSCOLARE	SI	NO	THEBEN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN	
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C80	4	300mA	REG. AC				295	122
								MORS.	COLL.
L 01	C10	3			4X4	FG7OR	>100	2	RST
L 02	C10	3			5X10	FG7OR	>100	1	RST
L 03	C10	3			4X4	FG7OR	>100	3	RST
L 04	C10/6/10	3			4X10	FG7OR	>100	4	RST
L 05	C10/10/16	3			4X16	FG7OR	>100	5	RST
L 06	C10	3			4X10	FG7OR	>100	6	RST
L 07	C10	3			4X10	FG7OR	>100	7	RST
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,07043	MERIDIANI	11,11983			
TRENTO - DANTE piazza						
QC040			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**16,97**	**19,82**	**20,53**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	VIA TORRE VANGA EST	2,39	1,94	1,42	**SI**	**NO**
L 02	VIA PORTICI PASSAGGIO PETERLAGO	2,37	4,02	2,51	**SI**	**NO**
L 03	VIA TORRE VANGA OVEST	0,66	0,59	1,31	**SI**	**NO**
L 04	VIA POZZO DIR. SX VERSO FS	2,91	3,52	4,75	**SI**	**NO**
L 05	VIA POZZO DIR. DX VERSO FS	4,77	4,81	3,73	**SI**	**NO**
L 06	CAVALCA FERROVIA SX	2,95	3,10	2,93	**SI**	**NO**
L 07	CAVALCA FERROVIA DX	0,92	1,84	3,88	**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Interruttori di marche diverse. Cavi nastrati in uscita dal quadro.					

PARALLELI	46,0537	MERIDIANI	11,1416	
TRENTO - DANTE SALTORI via				
QC041		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	615925		NOTE: FASE 3° USCITA MORSETO STA BRUC
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	PERRY
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C16	4	300mA	AC				265	36
L 01	C10	3			4X6	FG7OR	>100		
L 02									
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,0537	MERIDIANI	11,1416			
TRENTO - DANTE SALTORI via						
QC041			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**2,85**	**4,39**	**3,93**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	2,85	4,39	3,93	**SI**	**NO**
L 02					**SI**	**NO**
L 03					**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,06965	MERIDIANI	11,11757	
TRENTO - DAVINCI p.zza 13A				
QC042		MANUTENERE	RIFARE	BUONO







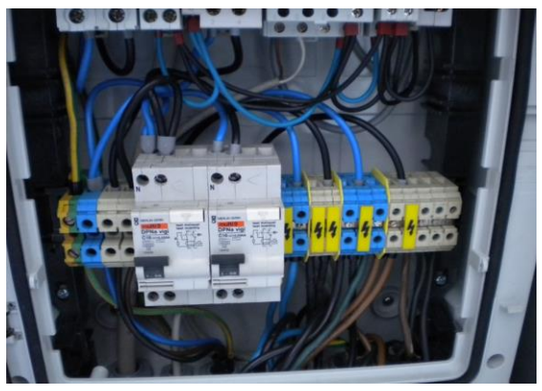



TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD 620762			NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. LEC SP 1X16A/35V				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	THEBEN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	SHNEIDER	
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C40	2							
L 01	C16	2	30mA	AC	4X6+4X6	FG7OR	>100	24	28
L 02	C10	2	30mA	AC	4X4	FG7OR	>100	25	28
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									

PARALLELI	46,06965	**MERIDIANI**	11,11757	
TRENTO - DAVINCI p.zza 13A				
QC042		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**9,80**			**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	4,36			**SI**	**NO**
L 02	CIRCUITO 2	5,44			**SI**	**NO**
L 03					**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	-	MERIDIANI	-	
-				
QC043-SOTTOQUADRO				ELIMINATO

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA					SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA					SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.					SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE					SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.		
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.		
CREPUSCOLARE		SI	NO			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.		
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE									
L 01									
L 02									
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									





PARALLELI	-	MERIDIANI	-	
-				
QC043-SOTTOQUADRO				ELIMINATO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE					SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01					SI	NO
L 02					SI	NO
L 03					SI	NO
L 04					SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :						


PARALLELI	46,0466	MERIDIANI	11,11554	
TRENTO - MAS DESERT via				
QC044		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



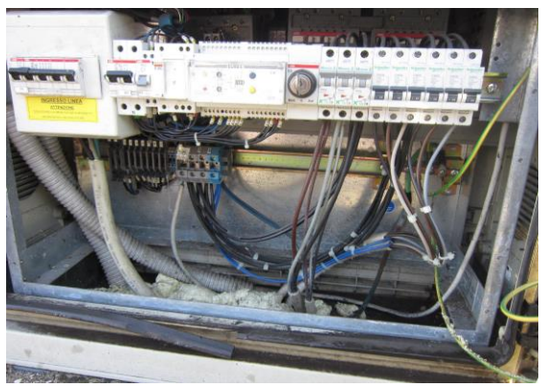

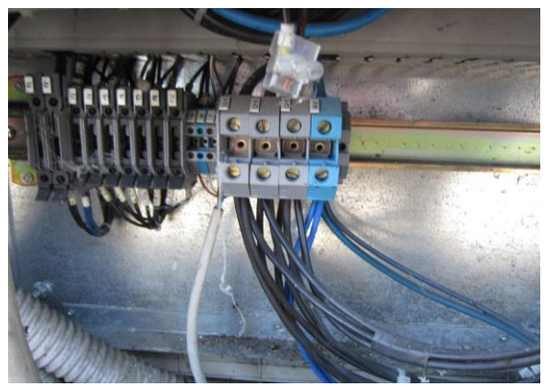



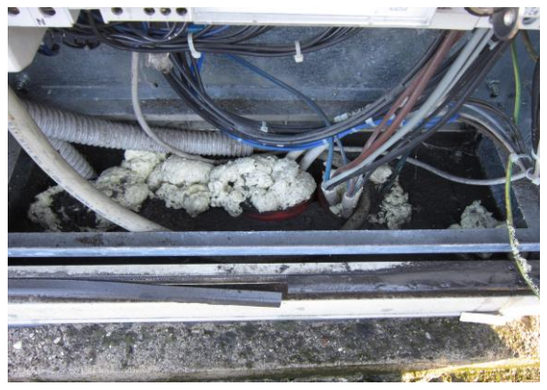

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	634003		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		REVERBERI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		REVERBERI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD. REVERBERI SEC STP 326			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C63	4	300mA	REG. AC					
L 01	C16	3			4x10+4x4	FG7OR	>100		
L 02	C16	3			4x6	FG7OR	>100		
L 03	C10	3			4x6	FG7OR	>100		
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,0466	MERIDIANI	11,11554	
TRENTO - MAS DESERT via				
QC044		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**14,67**	**12,90**	**13,67**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	VIA AL DESERT	4,82	4,06	5,64	**SI**	**NO**
L 02	LINEA NORD	6,30	6,14	5,26	**SI**	**NO**
L 03	LINEA SUD	3,55	2,70	2,77	**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere non presenti. Schemi elettrici non presenti.					


PARALLELI	46,077	MERIDIANI	11,11442	
TRENTO - DRUSO via				
QC045		MANUTENERE	RIFARE	BUONO









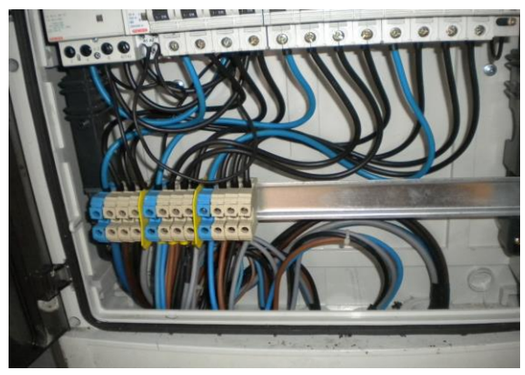

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	621072		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C40	4	300mA	REG. AC				288	86
L 01	C16	4			4X16	FG7OR	>100		
L 02	C16	4			4X2,5+2X4X6	FG7OR	>100		
L 03	C16	4			4X6	FG7OR	>100		
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,077	MERIDIANI	11,11442	
TRENTO - DRUSO via				
QC045		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**5,82**	**10,29**	**6,56**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	LINEA VERSO DISCARICA	3,28	3,95	2,94	**SI**	**NO**
L 02	LINENA ROTATORIA	0,85	2,40	1,68	**SI**	**NO**
L 03	LINEA VIA DRUSO	1,69	3,94	1,94	**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione.					


PARALLELI	48,0448	MERIDIANI	11,12156	
TRENTO - FERSINA via				
QC046		MANUTENERE	RIFARE	BUONO









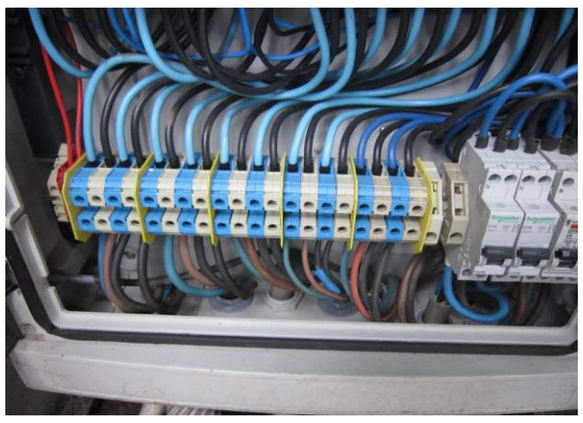

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	634271		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		PARZIALMENTE PRESENTI				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	THEBEN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	FINDER
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C40	4P	300mA	AC REGOLABILE				380	102
L 01	C10	2P							
L 02	C10	2P			4x16	FG7OR	>100		
L 03	C10	2P							
L 04	C10	2P			4x16	FG7OR	>100		
L 05	C10	2P							
L 06	C10	2P			4x10	FG7OR	>100		
L 07	C10	2P							
L 08	C10	2P			4x4	FG7OR	>100		
L 09	C10	2P							
L 10	C10	2P			4x4	FG7OR	>100		
L11	C16	2P							
L12	C16	2P			4x10	FG7OR	>100		
L13	C6	2P							
L14	C6	2P			4x10	FG7OR	>100		



PARALLELI	48,0448	MERIDIANI	11,12156			
TRENTO - FERSINA via						
QC046			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		12,80	15,48	13,59	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO	3,7				
L 01	SUD R MEZZA NOTTE	4,20			SI	NO
L 02	SUD R TUTTA NOTTE		2,34		SI	NO
L 03	SUD S MEZZA NOTTE		3,56		SI	NO
L 04	SUD S TUTTA NOTTE			4,10	SI	NO
L 05	SUD T MEZZA NOTTE			3,68	SI	NO
L 06	SUD T TUTTA NOTTE			2,55	SI	NO
L 07	NORD T MEZZA NOTTE			3,26	SI	NO
L 08	NORD T TUTTA NOTTE		3,20		SI	NO
L 09	EST S MEZZA NOTTE		3,68		SI	NO
L 10	EST S TUTTA NOTTE	2,00			SI	NO
L11	LINEA NORD SECONDO TRATTO		1,28		SI	NO
L12	LINEA NORD SECONDO TRATTO	2,90			SI	NO
L13	TORRE FARO MEZZA NOTTE		1,42		SI	NO
L14	TORRE FARO TUTTA NOTTE				SI	NO
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. Interruttori di marche diverse.					


PARALLELI	46,02442	MERIDIANI	11,08012	
TRENTO - EUROPA piazzale				
QC047		MANUTENERE	RIFARE	BUONO









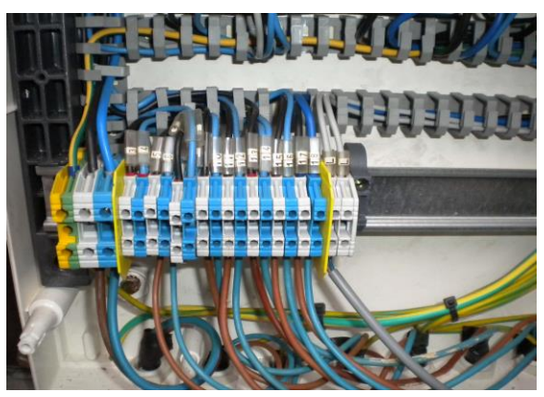

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD 630387			NOTE alimentato da q.e. 66
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C16	2							
L 01	C16	2	300mA	AC	3X1,5+3X1,5	FG7OR	>100	260	22
L 02	C10	2	300mA	AC	3X2,5+3X2,5	FG7OR	>100	265	32
L 03	C10	2	300mA	AC	3X2,5+3X2,5	FG7OR	>100	265	26
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01	C16	2	300mA	AC	3X2,5	FG7OR	>100	270	26
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,02442	MERIDIANI	11,08012	
TRENTO - EUROPA piazzale				
QC047		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		7,74			SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	CIRCUITO 1	1,80			SI	NO
L 02	ILL. PIANTE CHIESA	0,92			SI	NO
L 03	ILL. PALI E TOTEM	5,02			SI	NO
L 04					SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Schemi elettrici non presenti. Mancanza di falsi poli su finestre DIN 35. Mancato coordinamento fra protezione magnetotermica e linea dorsale asservita.					

PARALLELI	46,06462	MERIDIANI	11,12586	
TRENTO - S.G.BOSCO via				
QC048		MANUTENERE	RIFARE	BUONO





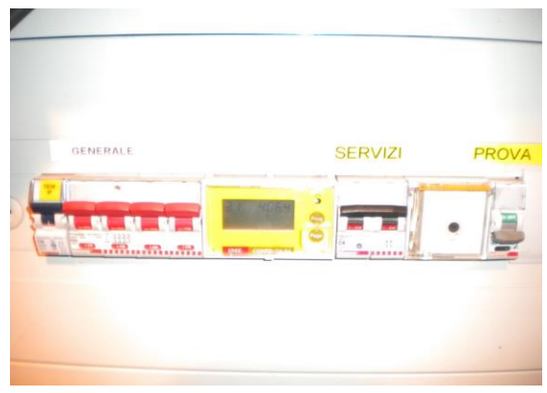





TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD			NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		BTICINO - GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD. PARZIALE	ALGORAB RES-2		
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	63A SEZION.	4							
L 01	C10	2	300mA	AC	2X6	FG7OR	>100	265	32
L 02	C10	2	300mA	AC	2X6	FG7OR	>100	260	32
L 03	C16	4/3	300mA	AC	4X6	FG7OR	>100	255	28
L 04	C16	4/3	300mA	AC	4X10	FG7OR	>100	255	28
L 05	C10	2	300mA	AC				260	14
L 06	C10	2	300mA	AC				260	16
L 07	C10	2	300mA	AC				265	24
L 08	C10	2	300mA	AC	4X4	FG7OR	>100	263	24
L 09	C10	2	300mA	AC				265	22
L 10	C10	2	300mA	AC	4X4	FG7OR	>100	254	24
L 11	C10	2	300mA	AC				255	26
L 12	C10	2	300mA	AC	4X6	FG7OR	>100	255	22



PARALLELI	46,06462	MERIDIANI	11,12586			
TRENTO - S.G.BOSCO via						
QC048				MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**5,71**	**14,78**	**6,86**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	LAMPIONCINI PIAZZA		4,18		**SI**	**NO**
L 02	BRACCIO MURO PROVINCIA			1,85	**SI**	**NO**
L 03	FARI EST VIA MURA B	1,61	2,31	2,89	**SI**	**NO**
L 04	FARI SUD	1,24	2,37	2,12	**SI**	**NO**
L 05	RISERVA				**SI**	**NO**
L 06	RISERVA				**SI**	**NO**
L 07	VIA BOSCO EST 1/2	2,86			**SI**	**NO**
L 08	VIA BOSCO EST 1/2		2,89		**SI**	**NO**
L 09	LAMPIONCINI SITECO CRISPI		1,39		**SI**	**NO**
L 10	RISERVA/CON LINEA				**SI**	**NO**
L 11	EX RIPOSO DAVANTI QUADRO		1,64		**SI**	**NO**
L12	RISERVA/CON LINEA				**SI**	**NO**
					SI	**NO**
NOTE :	Mancanza di protezione generale dal cortocircuito. Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,0495	MERIDIANI	11,12322	
TRENTO - FINETTI via				
QC049		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	633639		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	MERLIN GERIN
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C125	4							
L 01	C16	2	300mA	AC					
L 02	C16	2	300mA	AC	4X4(1)	FG7OR	>100	245	44
L 03	C16	2	300mA	AC	4X4	FG7OR	>100	255	33
L 04	C16	2	300mA	AC	4X10(1)	FG7OR	>100	260	36
L 05	C10	4	300mA	AC	4X10	FG7OR	>100	260	35
L 06	C16	2	300mA	AC				270	35
L 07	C16	2	300mA	AC	4X4	FG7OR	>100	274	34
L 08	C10	2	300mA	AC	4X4(1)	FG7OR	>100	272	30
L 09	C10	2	300mA	AC	4X10(1)	FG7OR	>100	270	28
L 10									
AUX									
CE 01	C10	2	300mA	AC	2X4	FG7OR	>100	265	28
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,0495	MERIDIANI	11,12322				
TRENTO - FINETTI via							
QC049				MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		11,26	9,69	9,42	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	RISERVA	0,00			SI	NO
L 02	VIA DE GASPERI		3,04		SI	NO
L 03	VIA VOLTA NORD			2,23	SI	NO
L 04	VIA VOLTA SUD			4,38	SI	NO
L 05	ROTATORIA	2,20	0,00	0,00	SI	NO
L 06	PARCO	7,66			SI	NO
L 07	VIA DE GASPERI		1,73		SI	NO
L 08	VIA VOLTA NORD			2,81	SI	NO
L 09	VIA VOLTA SUD		4,92		SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01	LAMPEGGIATORE	1,40			SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere non presenti. Grado di protezione dell'involucro compromesso. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,05725	MERIDIANI	11,11593	
TRENTO - GHIAIE via				
QC050		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



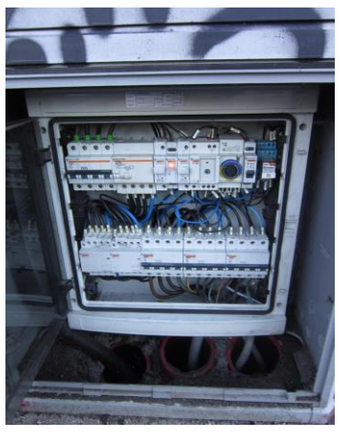







TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	634511		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	PERRY
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C63	4	300mA	AC				270	44
L 01	C20	4			4x10	FG7OR	>100		
L 02	C20	4			4x4	FG7OR	>100		
L 03	C10	4			4x4	FG7OR	>100		
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									


PARALLELI	46,05725	**MERIDIANI**	11,11593			
TRENTO - GHIAIE via						
QC050			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**5,32**	**11,39**	**7,95**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	0,80	5,72	7,14	**SI**	**NO**
L 02	CIRCUITO 2	2,04	5,09	0,81	**SI**	**NO**
L 03	CIRCUITO 3	2,48	0,58	0,00	**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti.					


PARALLELI	46,05244	MERIDIANI	11,11744	
TRENTO - GHIAIE via				
QC051		MANUTENERE	RIFARE	BUONO





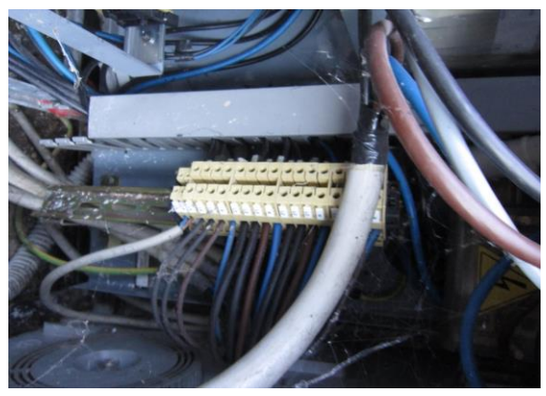

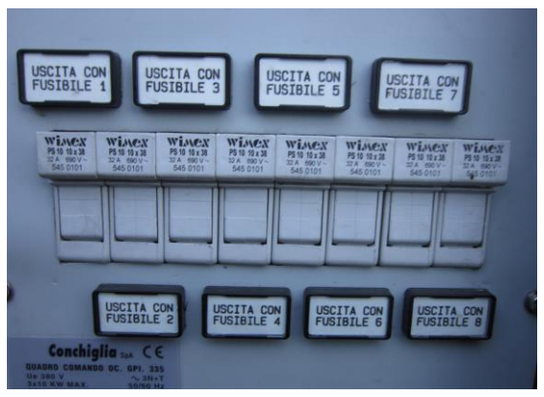

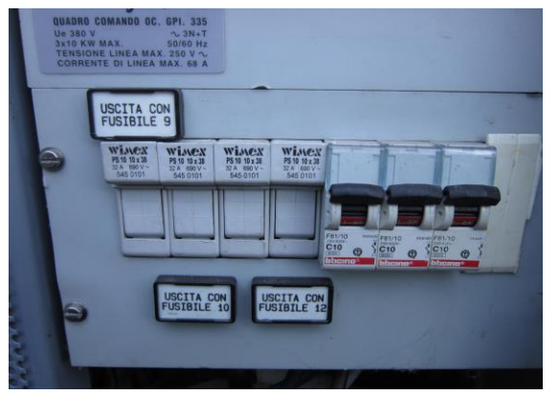

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	634507		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		MANCANO ALCUNE PARTENZE				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.	CEP 335 HMU		
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	THEBEN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.	B-TICINO		
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C80	4	300mA	REG. AC				290	45
L 01	C16	4			4x4	FG7OR	>100		
L 02	C16	4			4x6	FG7OR	>100		
L 03	C16	4			4x6	FG7OR	>100		
L 04	C16	4			4x4	FG7OR	>100		
L 05	C10	3			4x10	FG7OR	>100		
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									


PARALLELI	46,05244	**MERIDIANI**	11,11744			
TRENTO - GHIAIE via						
QC051			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**22,78**	**22,12**	**23,90**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	3,12	9,04	8,65	**SI**	**NO**
L 02	CIRCUITO 2	2,25	3,78	2,81	**SI**	**NO**
L 03	CIRCUITO 3	10,52	5,54	7,06	**SI**	**NO**
L 04	CIRCUITO 4	4,77	1,65	3,22	**SI**	**NO**
L 05	CIRCUITO 5	2,12	2,11	2,16	**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Interruttori marche diverse.					


PARALLELI	46,0698	MERIDIANI	11,13317	
TRENTO - GIARDINI via				
QC052		MANUTENERE	RIFARE	BUONO





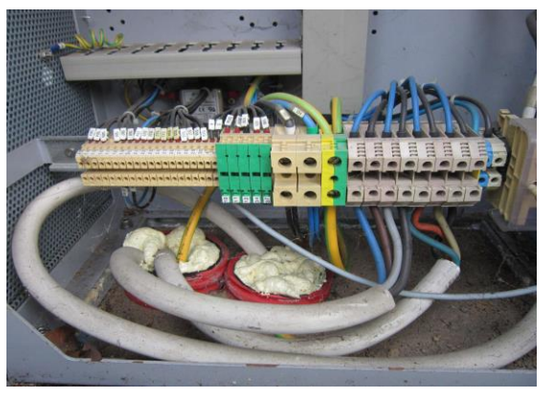



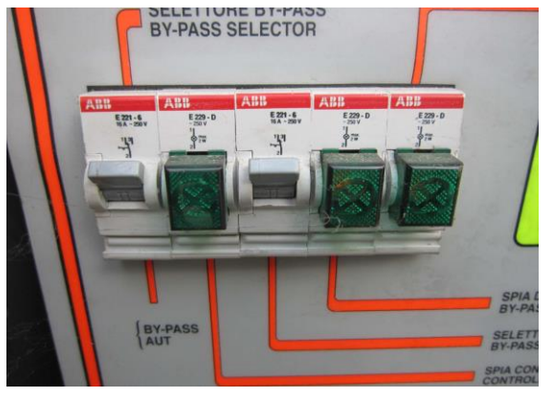

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	650587		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 108 HMU				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C40	2	300mA	REG. AC				290	79
L 01	C20	2							
L 02	C20	2			4X10	FG7OR	>100		
L 03	C20	2							
L 04	C20	2			4X10	FG7OR	>100		
L 05	C6	2							
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									





PARALLELI	46,0698	MERIDIANI	11,13317	
TRENTO - GIARDINI via				
QC052		MANUTENERE	RIFARE	BUONO


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		24,74			SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	CIRCUITO 1	4,90			SI	NO
L 02	CIRCUITO 2	4,13			SI	NO
L 03	CIRCUITO 3	7,89			SI	NO
L 04	CIRCUITO 4	7,82			SI	NO
L 05	CIRCUITO 5 (RISERVA)	0,00			SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione					


PARALLELI	46,05658	MERIDIANI	11,13082	
TRENTO - GOCCIADORO via				
QC053		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



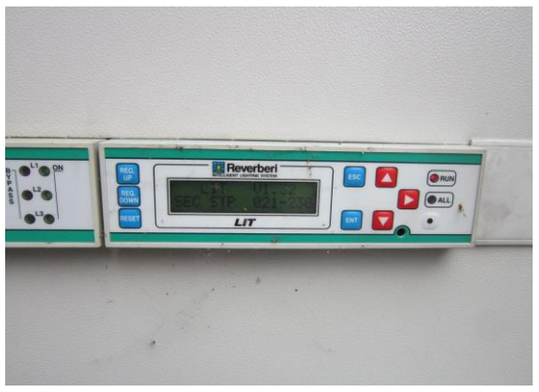

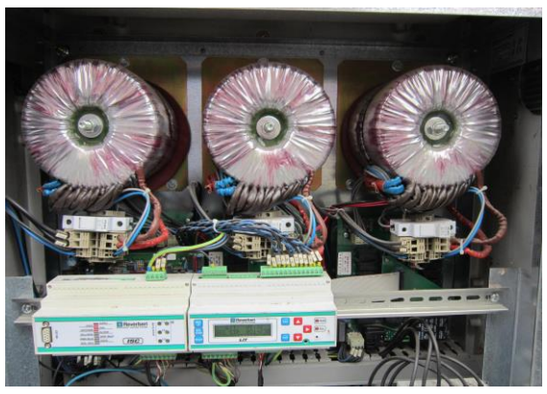

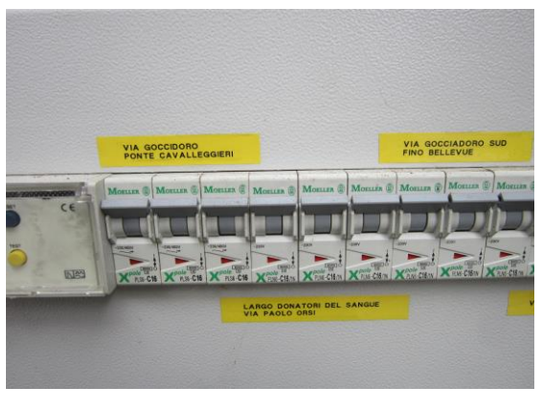

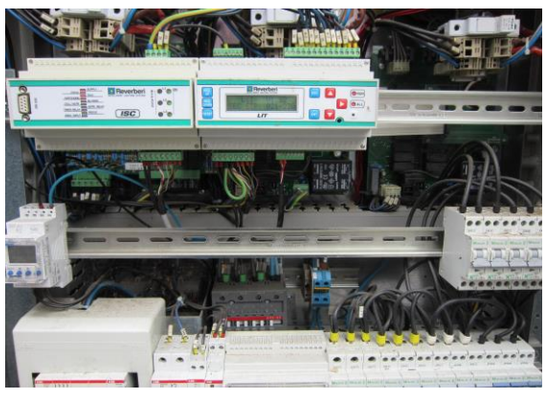

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	929795		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		GE POLYSAFE				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		REVERBERI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. REVERBERI SEC STP 21				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		THEBEN
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	4	300mA	REG. AC				288	72
L 01	C16	3			4X4	FG7OR	>100		
L 02	C16	3			4X4	FG7OR	>100		
L 03	C16	3			4X10	FG7OR	>100		
L 04	C20	3			1X4X16	VECCHIO	>100		
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									

PARALLELI	46,05658	MERIDIANI	11,13082	
TRENTO - GOCCIADORO via				
QC053		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		11,36	11,33	12,08	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	VIA GOCCIADORO/PONTE CAVALLEGGERI	2,30	1,66	2,14	SI	NO
L 02	LARGO DON. DEL SANGUE/ORSI	2,48	0,45	2,50	SI	NO
L 03	VIA GOCCIADORO SUD(FINO BELLEVUE)	4,11	5,19	3,03	SI	NO
L 04	VIA FOGAZZARO	2,47	4,03	4,41	SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione					

PARALLELI	46,05848	MERIDIANI	11,13846	
TRENTO - GMEINER via				
QC054		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	629769		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 315 HMU				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	THEBEN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.	OBO			
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	4	500mA	REG. AC				420	86
L 01	C16	3			4X10	FG7OR	>100		
L 02	C16	3			4X10	FG7OR	>100		
L 03	C6	3			4X6+2X4	FG7OR	>100		
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,05848	MERIDIANI	11,13846	
TRENTO - GMEINER via				
QC054		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**12,43**	**10,94**	**10,29**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	PARCO+4 P.L. PARCHEGGIO	6,34	4,55	4,76	**SI**	**NO**
L 02	VIA GMEINER	4,96	5,92	5,04	**SI**	**NO**
L 03	4 P.L. PARCHEGGIO	1,13	0,47	0,49	**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,08949	MERIDIANI	11,1082			
TRENTO - GUETTI via						
QC055			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	721401		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.	DEHN		
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C16	1+N	300mA	AC				255	58
L 01	C16	2			4x4	FG7OR	>100		
L 02	C16	2			4x4	FG7OR	>100		
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,08949	**MERIDIANI**	11,1082			
TRENTO - GUETTI via						
QC055			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**5,59**			**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	2,70			**SI**	**NO**
L 02	CIRCUITO 2	2,89			**SI**	**NO**
L 03					**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. Mancata selettività fra interruttore generale e singole partenze.					

PARALLELI	46,06643	MERIDIANI	11,11736	
TRENTO - INAMA via				
QC056		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	637081		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		ADATTATA CARPENTERIA GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.		NON CONFORME				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.	CEP 325 HMU		
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	SEZ. 63A	4							
L 01	C16	2	300mA	AC	(1) 5X6	N1VVK	>100	275	44
L 02	C20	2	300mA	AC				270	28
L 03	C25	2	300mA	AC	4X6	FG7OR	>100	274	35
L 04	C20	2	300mA	AC	(1) 5X6	N1VVK	>100	272	36
L 05	C25	2	300mA	AC	(2) 5X6	N1VVK	>100	270	35
L 06	C25	2	300mA	AC				270	35
L 07	C16	2	300mA	AC	4X10	FG7OR		265	32
L 08	C16	2	300mA	AC	(2) 5X6	N1VVK	>100	265	28
L 09	C16	2	300mA	AC	3X1,5	FG7OR	>100	268	22
L 10	C16	2	300mA	AC				275	29
L 11	C16	2	300mA	AC	5X6	N1VVK	>100	260	28
L 12	C10	4/3	300mA	AC	1X4X10	RIGIDO	>100	265	42
L 13	C10	4/3	300mA	AC	1X4X4	RIGIDO	>100	265	33
L 14	C16	4/3	300mA	AC	1X4X10	RIGIDO	>100	272	32
L 15	C25	4/3	300mA	AC	1X4X6	RIGIDO	>100	278	36



PARALLELI	46,06643	MERIDIANI	11,11736				
TRENTO - INAMA via							
QC056				MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		30,88	29,60	30,32	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	CIRCUITO 1	9,26			SI	NO
L 02	CIRCUITO 2	1,80			SI	NO
L 03	CIRCUITO 3		1,58		SI	NO
L 04	CIRCUITO 4			6,88	SI	NO
L 05	CIRCUITO 5	3,12			SI	NO
L 06	CIRCUITO 6	0,00			SI	NO
L 07	CIRCUITO 7		7,80		SI	NO
L 08	CIRCUITO 8	2,44			SI	NO
L 09	CIRCUITO 9			1,18	SI	NO
L 10	CIRCUITO 10			1,57	SI	NO
L 11	CIRCUITO 11			1,57	SI	NO
L 12	VIA INANA SUD/OVEST (COLL. SSR)	6,40	2,70	6,70	SI	NO
L 13	VIA INANA NORD/EST (COLL. RSR)	1,99	0,92	2,79	SI	NO
L 14	VIA INANA NORD/OVEST (COLL. RST)	7,20	4,66	7,82	SI	NO
L 15	VIA INANA SUD/EST COLL (TST)	0,11	1,91	4,47	SI	NO
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere non presenti. Grado di protezione dell'involucro compromesso. Grado di protezione dell'involucro compromesso. Schemi elettrici non presenti. Mancato coord. fra protezione e linea.					


PARALLELI	46,05157	MERIDIANI	11,12092			
TRENTO - IORI via						
QC057			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	









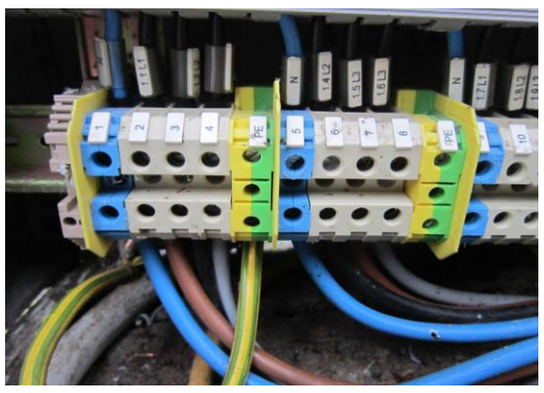

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	694792		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA	CONCHIGLIA					SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA	CONCHIGLIA					SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD.				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	MERLIN GERIN	
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	SEZ. 63A	4							
	PURO 63A	4	300mA	AC				280	43
L 01	C25	3			4X16	FG7OR	>100		
L 02	C25	3			4X16	FG7OR	>100		
L 03	C25	3							
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,05157	**MERIDIANI**	11,12092			
TRENTO - IORI via						
QC057			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**6,65**			**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	1,94	1,00	1,27	**SI**	**NO**
L 02	CIRCUITO 2	1,11	0,18	1,15	**SI**	**NO**
L 03					**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di protezione generale dal cortocircuito. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. Telaio sganciato dalla base.					

PARALLELI	46,08937	MERIDIANI	11,12109	
TRENTO - LARGAIOLI via				
QC058		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



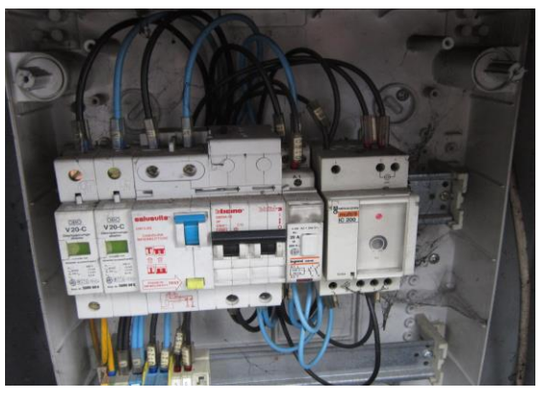



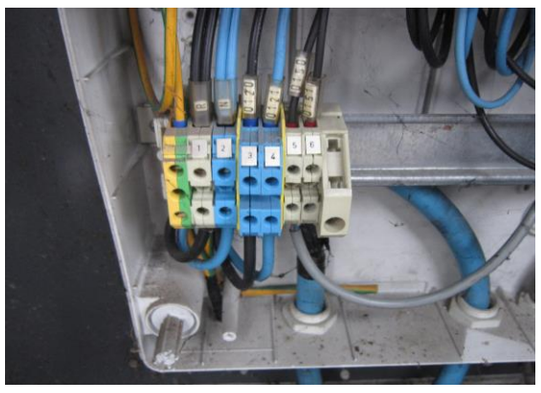



TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	628114		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		B-TICINO				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C10	2	300mA	AC	2x6	N1VVK	>100	280	42
L 01									
L 02									
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									





PARALLELI	46,08937	MERIDIANI	11,12109			
TRENTO - LARGAIOLI via						
QC058			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		6,90			SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	CIRCUITO 1	6,90			SI	NO
L 02					SI	NO
L 03					SI	NO
L 04					SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,07313	MERIDIANI	11,1188	
TRENTO - LAMPI sottopasso				
QC059		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



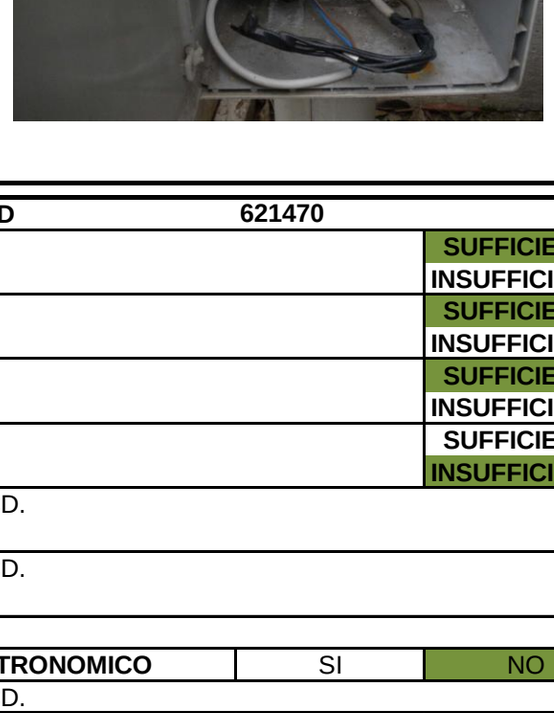

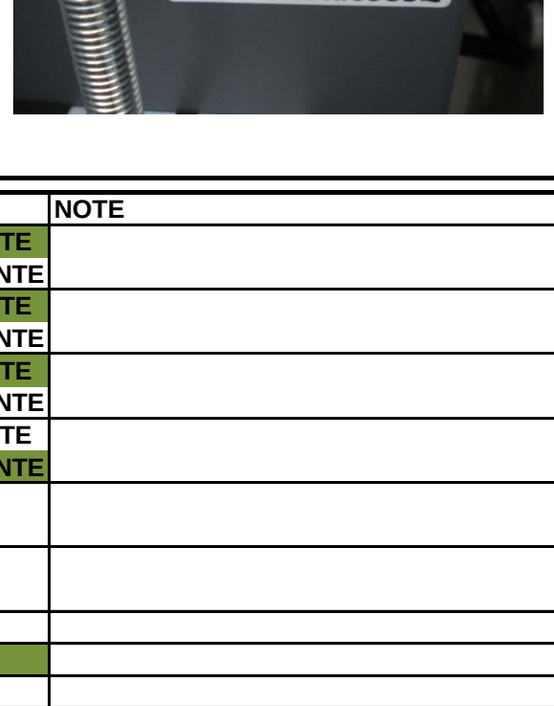





TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	621470		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		OEC				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO				
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	


TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C16	2							
L 01	C10	2	30mA	AC					
L 02	C10	2	30mA	AC	5X4	FG7OR	>100		
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,07313	**MERIDIANI**	11,1188			
TRENTO - LAMPI sottopasso						
QC059			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**6,72**			**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	(LINEA UPS)	3,30			**SI**	**NO**
L 02	(1/2 NON UPS+2 LED)	3,42			**SI**	**NO**
L 03					**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere non presenti. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,07172	MERIDIANI	11,13122	
TRENTO - LASTE via delle				
QC060		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

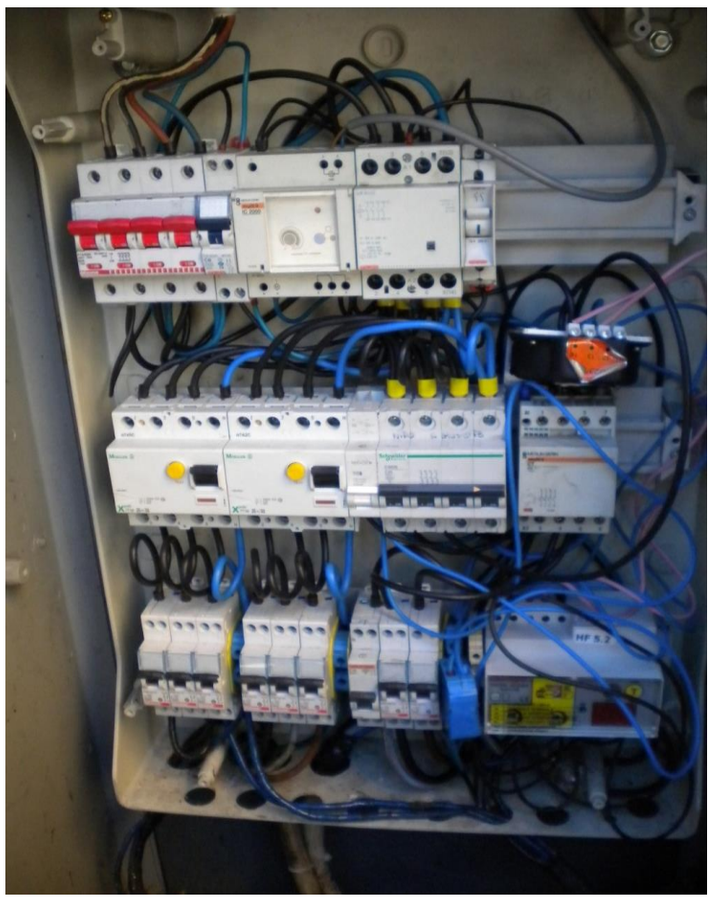

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	623959		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		B-TICINO				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.		DISORDINATE				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI


CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	SEZIONAT. 63A	4							
L 01	C10	4-3	300mA	AC	4X6+4X4V	FG70R+RIG.	>100	230	54
L 02	C10	4-3	300mA	AC	4X10	FG70R	>100	235	50
L 03	C16-10	4-3	300mA	REG. AC	4X16	FG70R	>100	285	68
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,07172	MERIDIANI	11,13122				
TRENTO - LASTE via delle							
QC060				MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		17,76	8,50	15,76	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	CIRCUITO 1	12,94	0,00	4,22	SI	NO
L 02	CIRCUITO 2	4,82	2,30	6,80	SI	NO
L 03	CIRCUITO 3	0,00	6,20	4,74	SI	NO
L 04					SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di protezione generale dal cortocircuito. Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere non presenti. Grado di protezione dell'involucro compromesso. Schemi elettrici non presenti. I carico > I interruttore.					

PARALLELI	46,07421	MERIDIANI	11,11698	
TRENTO - LEOPARDI GIACOMO l'Adige				
QC061		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

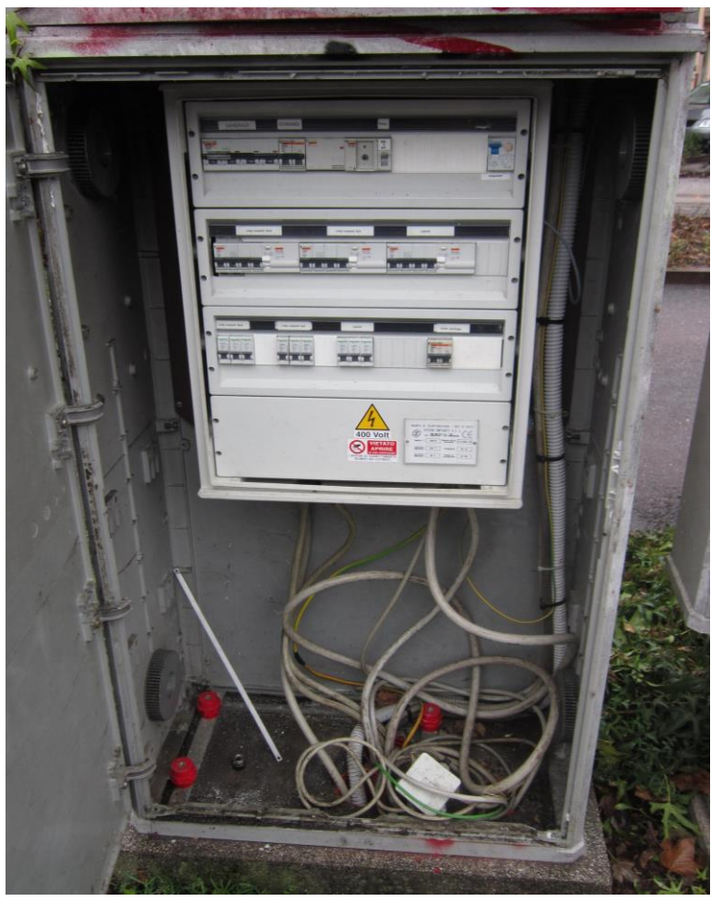









TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	621592		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C80	4							
L 01	C20	4-3	500mA	AC	4x6	FG7OR	>100	450	44
L 02	C20	4-3	500mA	AC	4x6	FG7OR	>100	460	42
L 03	C10	4-3	500mA	AC	4x6	FG7OR	>100	450	42
L 04	C25	2			3x2,5	FG7OR	>100		
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01	C6	2	300mA	AC	3x2,5	FG7OR	>100	245	24
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,07421	MERIDIANI	11,11698	
TRENTO - LEOPARDI GIACOMO l'Adige				
QC061		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		21,30	18,09	18,12	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	LUNGADIGE LEOPARDI NORD	6,78	5,95	6,51	SI	NO
L 02	LUNGADIGE LEOPARDI SUD	6,19	8,21	8,20	SI	NO
L 03	LATERALI	4,45	3,93	3,41	SI	NO
L 04	GUIDA PARCHEGGI	3,88			SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01	IRRIGAZIONE				SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Grado di protezione dell'involucro compromesso. Schemi elettrici non presenti. Mancato coordinamento fra protezione e linea.					

PARALLELI	46,06781	MERIDIANI	11,12347	
TRENTO - LODRON p.zza				
QC062		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	621592		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA - GEWISS - SHNEIDER				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD. ESCLUSO	CEP 322 GS		
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD. TOTALE	ALGORAB - RES 2		
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C63	4	300mA	REG. AC				285	82
L 01	C16	2			2X10+2X10	FG7OR	>100		
L 02	C25	2			2X10+2X10	FG7OR	>100		
L 03	C16	2			2X10+2X10	FG7OR	>100		
L 04	C25	2			1X2X25	FG7OR	>100		
L 05	C6	2			2X2,5+4X2,5	FG7OR	>100		
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01	C6	2	NO		2X1,5	FG7OR	>100		
CE 02	C10	2	300mA	AC	2X4	FG7OR	>100		
CE 03	C10	2	300mA	AC	2X4	FG7OR	>100		



PARALLELI	46,06781	MERIDIANI	11,12347			
TRENTO - LODRON p.zza						
QC062			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**18,58**	**15,68**	**15,73**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	PIAZZA LODRON			8,53	**SI**	**NO**
L 02	PIAZZA PASI	18,46			**SI**	**NO**
L 03	VIA ORIOLA			4,53	**SI**	**NO**
L 04	VIA CARDUCCI/SIMONCINO		15,68		**SI**	**NO**
L 05	GALLERIA ADRIA			2,64	**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01	TELEGESTIONE	0,12			**SI**	**NO**
CE 02	PIAZZA LODRON			0,03	**SI**	**NO**
CE 03	PIAZZA BATTISTI			0,00	**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere non presenti. Schemi elettrici non presenti. Mancanza di falsi poli su finestre DIN 35. Utenza senza protezione differenziale.					

PARALLELI	46,09254	MERIDIANI	11,11858	
TRENTO - LUNELLI G.				
QC063		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	626166		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 315 HMU				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.	BTICINO			
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI


CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	4	300mA	AC REG.				150	13
L 01	C20	3	NO		4X16	FG7			
L 02	C16	3	NO		4X25	FG7			
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,09254	MERIDIANI	11,11858	
TRENTO - LUNELLI G.				
QC063		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		12,28	14,22	13,83	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	CIRCUITO 1	4,51	5,22	8,10	SI	NO
L 02	CIRCUITO 2	7,77	9,00	5,73	SI	NO
L 03					SI	NO
L 04					SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza della targa del quadro di distribuzione. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Grado di protezione dell'involucro compromesso. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,06948	MERIDIANI	11,11559	
TRENTO - LUNG'ADIGE MONTE GRAPPA				
QC064		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

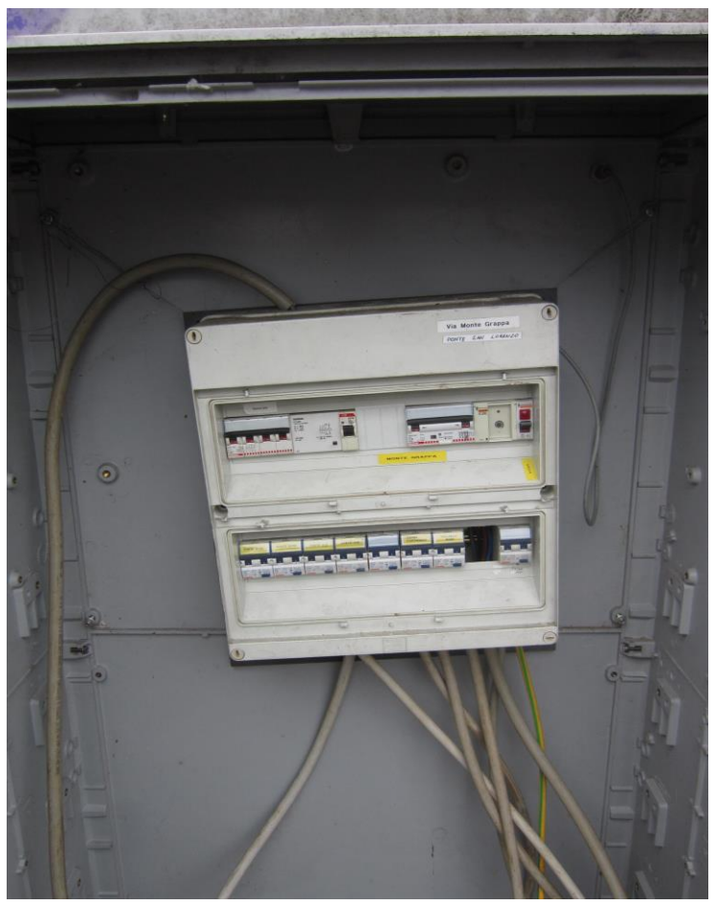

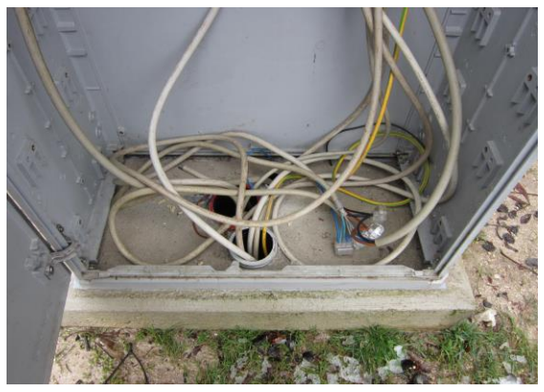







TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	622190		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.		DISORDINATO				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	4							
L 01	C10	4	300mA	AC	4x10	FG7OR	>100	230	28
L 02	C16	2	300mA	AC				245	30
L 03	C6	2	300mA	AC	4x4	FG7OR	>100	260	32
L 04	C10	2	300mA	AC				250	30
L 05	C10	2	300mA	AC	4x2,5	FG7OR	>100	240	30
L 06	C16	2	300mA	AC	4x4	FG7OR	>100	240	33
L 07	C20	2	300mA	AC	4x4	FG7OR	>100	250	44
L 08	C16	2	300mA	AC	4x4	FG7OR	>100	265	45
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01	C16	2	30mA	AC	3x2,5	FG7OR	>100	24	22
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,06948	MERIDIANI	11,11559				
TRENTO - LUNG'ADIGE MONTE GRAPPA							
QC064				MANUTENERE	RIFARE	BUONO	


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**22,15**	**8,43**	**16,10**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	MONTE GRAPPA	6,02	4,08	6,44	**SI**	**NO**
L 02	PONTE NORD 1	1,65			**SI**	**NO**
L 03	PONTE NORD 2		2,08		**SI**	**NO**
L 04	PONTE SUD 1			2,28	**SI**	**NO**
L 05	PONTE SUD 2		2,27		**SI**	**NO**
L 06	CIRCUITO 6			6,68	**SI**	**NO**
L 07	PARCHEGGIO	14,48			**SI**	**NO**
L 08	CICLABILE NORD				**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01	SITANGA COMUNE			0,70	**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere non presenti.					

PARALLELI	46,08486	MERIDIANI	11,11331	
TRENTO - MACCANI via				
QC065		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



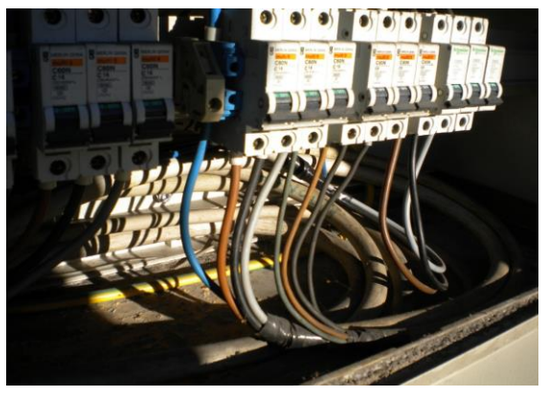



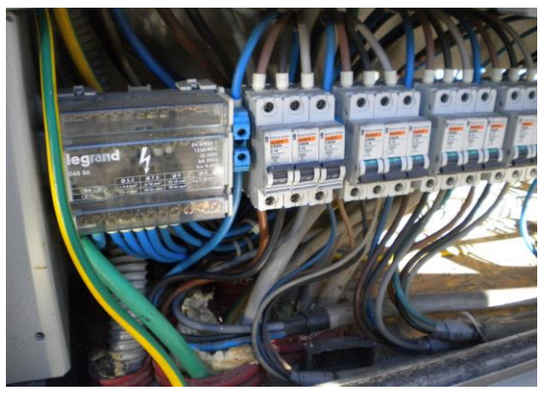



TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	649400		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		IREM				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		IREM				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD. PMR 330 EQ STABILUX			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	THEBEN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C63	4	300mA	REG. AC				280	46
L 01	C16	3			4x16	FG7OR	>100		
L 02	C16	3			4x4	FG7OR	>100		
L 03	C16	3			4x10	FG7OR	>100		
L 04	C16	3			4x10	FG7OR	>100		
L 05	C16	3			4x10	FG7OR	>100		
L 06	C6	3			4x4	FG7OR	>100		
L 07	C10	3			4x10	FG7OR	>100		
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01	C20	2			3x4	FG7OM1	>100		
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,08486	MERIDIANI	11,11331			
TRENTO - MACCANI via						
QC065			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		33,83	25,24	24,35	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	MACCANI NORD	13,07	6,80	8,80	SI	NO
L 02	CAVALCA FERROVIA	3,71	2,12	1,54	SI	NO
L 03	ROTATORIA	5,77	6,69	3,20	SI	NO
L 04	MACCANI SUD	3,45	2,44	2,81	SI	NO
L 05	CAMPO TRENTINO	3,54	3,59	2,90	SI	NO
L 06	FOIBE	0,87	0,00	1,15	SI	NO
L 07	LAVISOTTO	3,42	3,60	3,53	SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01	QUADRO FIBRE			0,42	SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere non presenti.					


PARALLELI	46,04098	MERIDIANI	11,13426	
TRENTO - BETTINI via civ 7/A				
QC066		MANUTENERE	RIFARE	BUONO









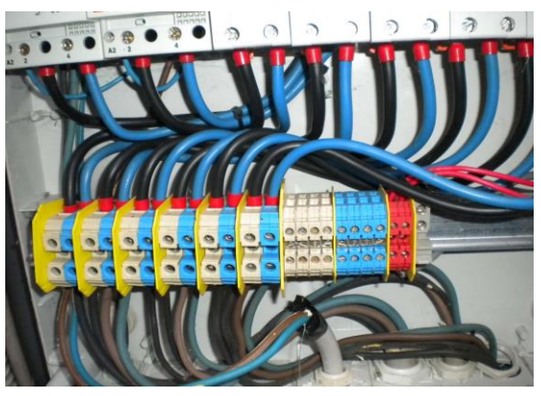

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	630387		NOTE ALIMENTA ANCHE 47
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD.				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	PERRY	
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C50	2							
L 01	C25	2	30mA	AC				28	30
L 02	C16	2	30mA	AC	4X10	FG7OR	>100	26	30
L 03	C25	2	30mA	AC				26	26
L 04	C20	2	30mA	AC	4X4	FG7OR	>100	25	34
L 05	C20	2	30mA	AC				26	32
L 06	C16	2	30mA	AC	4X6	FG7OR	>100	27	26
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01	NO				2X4	FG70R			
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,04098	MERIDIANI	11,13426			
TRENTO - BETTINI via civ 7/A						
QC066			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		26,26			SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	LINEA CHIESA TUTTA NOTTE	0,00			SI	NO
L 02	LINEA CHIESA MEZZA NOTTE	0,52			SI	NO
L 03	LINEA ASILO TUTTA NOTTE	2,29			SI	NO
L 04	LINEA ASILO MEZZA NOTTE	3,31			SI	NO
L 05	LINEA PALESTRA TUTTA NOTTE	6,40			SI	NO
L 06	LINEA PALESTRA MEZZA NOTTE	6,00			SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01	(QUADRO 47 SENZA PROTEZIONE)	7,74			SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. Mancanza di falsi poli su finestre DIN 35. Utenza senza protezione differenziale.					

PARALLELI	46,06353	MERIDIANI	11,11907			
TRENTO - MADRUZZO via						
QC067			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	637135		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO				
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	63A SEZION.	2							
L 01	C16	2	300mA	AC				240	38
L 02	C10	1+N	300mA	AC	4x4	FG7OR	>100	250	32
L 03	C16	1+N	300mA	AC				260	24
L 04	C16	1+N	300mA	AC	4x4	FG7OR	>100	260	18
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,06353	MERIDIANI	11,11907			
TRENTO - MADRUZZO via						
QC067			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**23,74**			**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	LINEE CIMITERO 1	5,26			**SI**	**NO**
L 02	LINEE CIMITERO 2	4,30			**SI**	**NO**
L 03	LINEE CIMITERO 3	11,22			**SI**	**NO**
L 04	LINEE CIMITERO 4	2,96			**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di protezione generale dal cortocircuito. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Grado di protezione dell'involucro compromesso. Schemi elettrici non presenti.					


PARALLELI	46,06374	MERIDIANI	11,12191	
TRENTO - MADRUZZO vicolo				
QC068		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



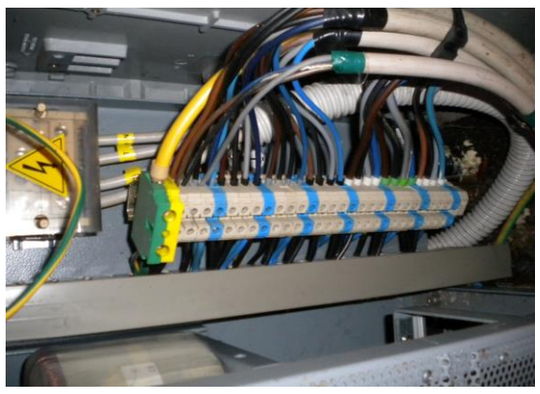





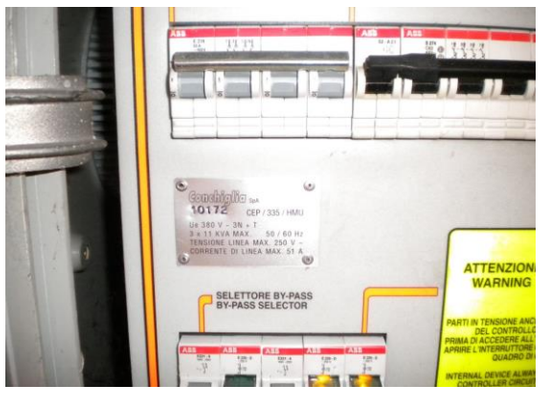

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	637097		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 335 HMU				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	THEBEN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN	
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C80	4	300mA	REG. AC				275	122
L 01	C10	3		4X4+4X4	FG7OR	>100			
L 02	C10	3		4X6	FG7OR	>100			
L 03	C10	3		4X4	FG7OR	>100			
L 04	C10	3		4X6	FG7OR	>100			
L 05	C16	3		4X10	FG7OR	>100			
L 06	C16	3		4X10	FG7OR	>100			
L 07	C16	3		4X10	FG7OR	>100			
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,06374	MERIDIANI	11,12191	
TRENTO - MADRUZZO vicolo				
QC068		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		23,50	23,71	23,21	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	VIA MADRUZZO EST	2,64	1,48	2,68	SI	NO
L 02	VIA MADRUZZO OVEST/VIC. AL NUOTO	3,63	3,05	3,05	SI	NO
L 03	VICOLO MADRUZZO	0,87	0,85	0,91	SI	NO
L 04	VIA 24 MAGGIO/ESTERLE OVEST	2,44	2,88	2,42	SI	NO
L 05	VIA ESTERLE EST/TORRIONE/BORSIERI	5,99	5,79	6,62	SI	NO
L 06	VIA ENDRICI	4,05	3,94	3,99	SI	NO
L 07	VIA TRAVAI	3,88	5,72	3,54	SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione.					

PARALLELI	46,04712	MERIDIANI	11,13246	
TRENTO - MALPENSADA via				
QC069		MANUTENERE	RIFARE	BUONO









TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	700593		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C25	4	300mA	AC				275	42
L 01	C16	3			4X10	FG7OR	>100		
L 02	C10	3			4X6+4X6	FG7OR	>100		
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,04712	MERIDIANI	11,13246	
TRENTO - MALPENSADA via				
QC069		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		11,37	10,41	9,84	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	CIRCUITO 1	7,51	7,10	7,09	SI	NO
L 02	CIRCUITO 2	3,86	3,31	2,75	SI	NO
L 03					SI	NO
L 04					SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti.					


PARALLELI	46,07685	MERIDIANI	11,12464	
TRENTO - MALVASIA via				
QC070		MANUTENERE	RIFARE	BUONO





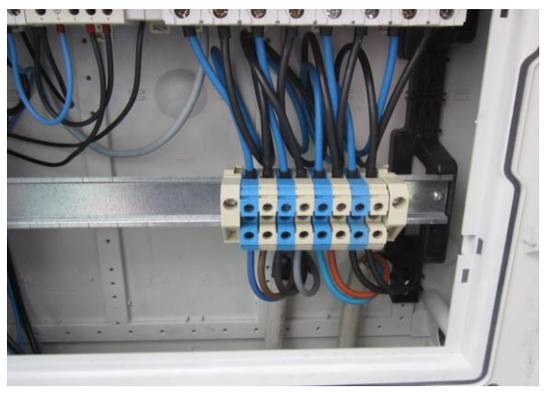



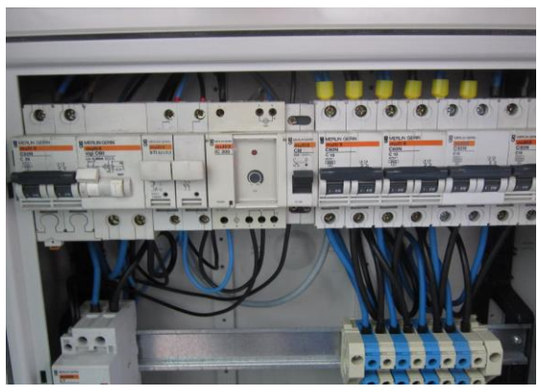

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	626398		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		B-TICINO				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO				
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C20	2	300mA	AC				265	29
L 01	C10	2							
L 02	C10	2			4x4	FG7OR	>100		
L 03	C10	2							
L 04	C10	2			4x4	FG7OR	>100		
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									

PARALLELI	46,07685	MERIDIANI	11,12464	
TRENTO - MALVASIA via				
QC070		MANUTENERE	RIFARE	BUONO


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		7,01			SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	VIA MALVASIA SUD 1	1,72			SI	NO
L 02	VIA MALVASIA SUD 2	2,04			SI	NO
L 03	VIA MALVASIA NORD 1	1,62			SI	NO
L 04	VIA MALVASIA NORD 2	1,63			SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti.					


PARALLELI	46,03242	MERIDIANI	11,1326	
TRENTO - EDMUND MACH via				
QC071		MANUTENERE	RIFARE	BUONO







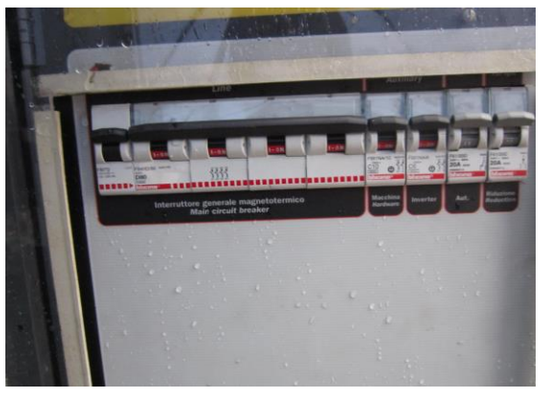

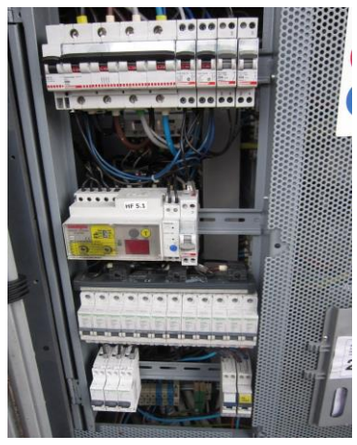

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	636068		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 325 HMU				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	THEBEN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	D80	4	500mA	REG. AC				365	87
L 01	C16	3			4x6	FG7OR	>100		
L 02	C16	3			4x6	FG7OR	>100		
L 03	C16	3			4x10	FG7OR	>100		
L 04	C16	3			4x6	FG7OR	>100		
L 05	C16	3			4x10	FG7OR	>100		
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01	C6	2	NO						
CE 02	C6	2	NO		3X2,5	FG7OR	>100		
CE 03									



PARALLELI	46,03242	MERIDIANI	11,1326	
TRENTO - EDMUND MACH via				
QC071		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**18,28**	**14,35**	**18,06**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	3,84	2,50	2,34	**SI**	**NO**
L 02	CIRCUITO 2	5,02	5,96	6,85	**SI**	**NO**
L 03	CIRCUITO 3	5,45	3,66	6,52	**SI**	**NO**
L 04	CIRCUITO 4	1,07	1,11	1,00	**SI**	**NO**
L 05	CIRCUITO 5	2,90	1,04	1,35	**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01	RISERVA				**SI**	**NO**
CE 02	RILEVAZIONE TRAFFICO		0,08		**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. Mancano n°2 protezioni differenziali.					


PARALLELI	46,05404	MERIDIANI	11,12308	
TRENTO - MEDICI via				
QC072		MANUTENERE	RIFARE	BUONO









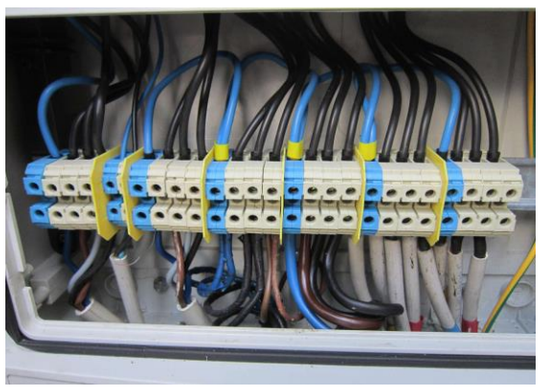

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	634882		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA - BTICINO				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD.				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.	BTICINO			
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	4	300mA	REG. AC				285	122
L 01	C10	3			4X4+4X4	FG7OR	>100		
L 02	C10	3			4X16	FG7OR	>100		
L 03	C10	3			1X4X16	FG7OR	>100		
L 04	C10	3			1X4X16	FG7OR	>100		
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,05404	MERIDIANI	11,12308			
TRENTO - MEDICI via						
QC072			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		16,62	14,24	13,81	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	VIA MEDICI	2,18	3,38	3,77	SI	NO
L 02	PARCO	6,81	4,16	3,54	SI	NO
L 03	VIA MARSALA NORD	4,45	5,22	4,96	SI	NO
L 04	VIA MARSALA SUD	3,18	1,48	1,54	SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :						

PARALLELI	46,07426	MERIDIANI	11,11698	
TRENTO - LEOPARDI GIACOMO l.Adige				
QC073		MANUTENERE	RIFARE	BUONO







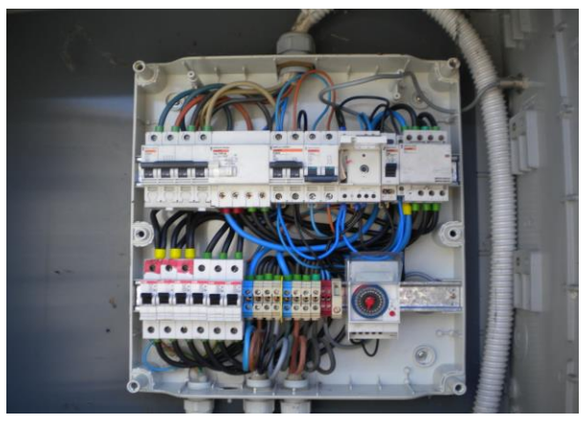



TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	793604		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	LEGRAND
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C63	4	300mA	AC				280	42
L 01	C32	3			4X10	FG7OR	>100		
L 02	C32	3			4X10	FG7OR	>100		
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,07426	MERIDIANI	11,11698	
TRENTO - LEOPARDI GIACOMO l.Adige				
QC073		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**26,00**	**21,66**	**26,15**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	LUNGADIGE NORD	11,31	7,51	10,86	**SI**	**NO**
L 02	LUNGADIGE SUD	14,69	14,15	15,29	**SI**	**NO**
L 03					**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. Mancanza di falsi poli su finestre DIN 35.					

PARALLELI	46,0411	MERIDIANI	11,1314			
TRENTO - MENGUZZATO via						
QC074			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	630385		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		MANCANO ALCUNE MORSETTIERE				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	MERLIN GERIN
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C40	4	300mA	REG. AC				310	78
L 01	C10	3			4X10+3X4	FG7OR	>100		
L 02	C10	3			4X10+3X4	FG7OR	>100		
L 03	C6	3			4X6	FG7OR	>100		
L 04	C3	1	VECCHIA RIDUZIONE		1X6	FG7OR	>100		
L 05	C10	3			4X10	FG7OR	>100		
L 06	C10	2			3X2,5	FG7OR	>100		
L 07	C6	3			4X4	FG7OR	>100		
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,0411	MERIDIANI	11,1314	
TRENTO - MENGUZZATO via				
QC074		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		17,01	14,14	18,80	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	LINEA SUD	4,13	3,65	7,43	SI	NO
L 02	LINEA NORD	4,40	2,08	1,23	SI	NO
L 03	LINEA PISCINA	1,24	1,55	1,73	SI	NO
L 04	VECCHIA RIDUZIONE	0,00			SI	NO
L 05	VIA MARIGHETTO	6,75	6,39	5,76	SI	NO
L 06	PASSAGGI PEDONALI			2,17	SI	NO
L 07	PARCO AREA CANI	0,49	0,47	0,48	SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,06221	MERIDIANI	11,13011	
TRENTO - MILANO via				
QC075		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	632287		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C63	4	300mA	AC					
L 01	C16	4			1X4X6	VECCIO ISOL.	>100		
L 02	C16	4			1X4X10	FG7OR	>100		
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									





PARALLELI	46,06221	**MERIDIANI**	11,13011			
TRENTO - MILANO via						
QC075			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**3,99**	**8,85**	**9,29**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	3,99	5,33	0,00	**SI**	**NO**
L 02	CIRCUITO 2	0,00	3,52	9,29	**SI**	**NO**
L 03					**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere non presenti. Grado di protezione dell’involucro compromesso. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,07595	MERIDIANI	11,12829	
TRENTO - MURALTA via				
QC076		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



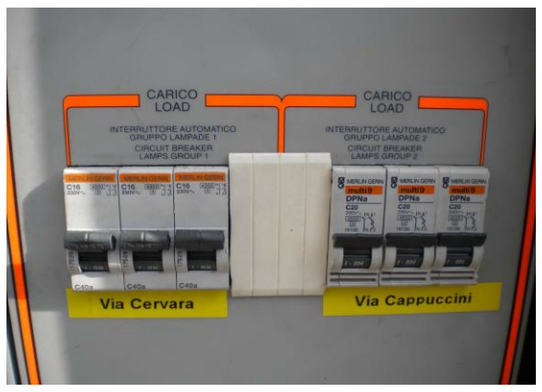

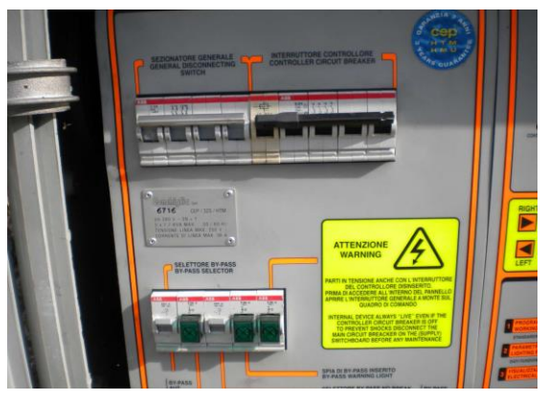

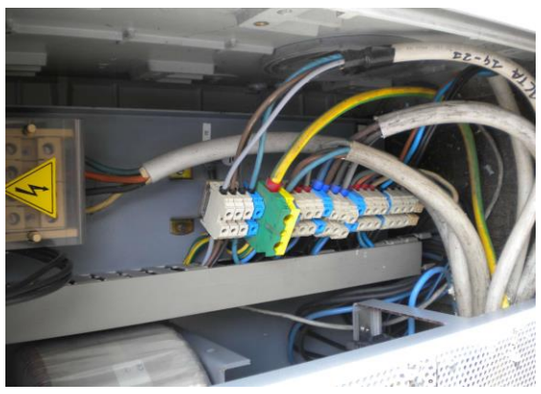



TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	614433		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		DISORDINATE				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD. CEP 325 HTM			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	THEBEN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C50	4	300mA	REG. AC				320	88
								MORS.	COLL.
L 01	C16				4X16	FG7OR	>100	3	TSR
L 02	C20				4X10	FG7OR	>100	2	TSR
L 03	C20				4X6	FG7OR	>100	5	RST
L 04	C16				4X6	FG7OR	>100	1	RST
L 05	C16				4X10	FG7OR	>100	4	TSR
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,07595	MERIDIANI	11,12829			
TRENTO - MURALTA via						
QC076			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**15,69**	**17,12**	**11,72**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	VIA CERVARA	3,00	3,90	3,29	**SI**	**NO**
L 02	VIA CAPPUCCINI	6,24	4,37	4,05	**SI**	**NO**
L 03	VIA MURALTA	4,12	5,04	1,75	**SI**	**NO**
L 04	ILLUMINAZIONE VIA MURALTA (14-21)	0,67	0,69	0,97	**SI**	**NO**
L 05	VIA M. AFRICANE	1,66	3,12	1,66	**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. Interruttore differenziale con corrente di intervento > a Idn.					


PARALLELI	46,07796	MERIDIANI	11,11717	
TRENTO - OBERZINER via				
QC077		MANUTENERE	RIFARE	BUONO









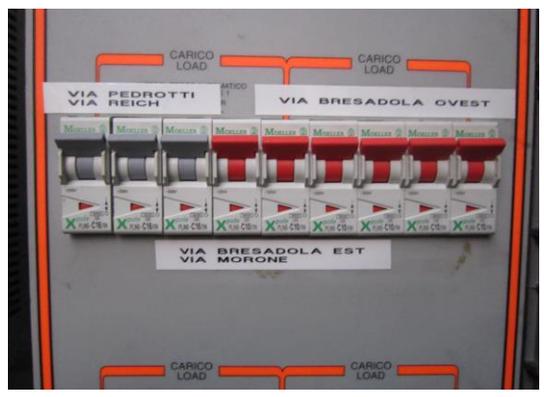

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	622290		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. LEC A 3X20A 35V				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C40	4							
L 01	C16	4-3	300mA	AC	4x10	FG7OR	>100	280	28
L 02	C10	4-3			4x6	FG7OR	>100		
L 03	C10	4-3	300mA	AC	4x10	FG7OR	>100	270	45
L 04	C16	4-3	300mA	AC				260	44
L 05	C16	4-3			4x6	FG7OR	>100		
L 06	C16	4-3	300mA	AC	4x4	FG7OR	>100	260	42
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,07796	MERIDIANI	11,11717	
TRENTO - OBERZINER via				
QC077		MANUTENERE	RIFARE	BUONO


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		19,00	12,91	9,51	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	VIA PEDROTTI/VIA REICH	9,95	3,55	4,03	SI	NO
L 02	VIA BRESADOLA/VIA MORONE	2,55	4,78	1,75	SI	NO
L 03	VIA BRESADOLA OVEST	1,76	0,66	0,00	SI	NO
L 04	RISERVA	0,00	0,00	0,00	SI	NO
L 05	VIA OBERZINER NORD	3,16	2,21	3,18	SI	NO
L 06	VIA OBERZINER SUD	1,58	1,71	0,55	SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,05801	MERIDIANI	11,12557	
TRENTO - ORTIGARA via				
QC078		MANUTENERE	RIFARE	BUONO







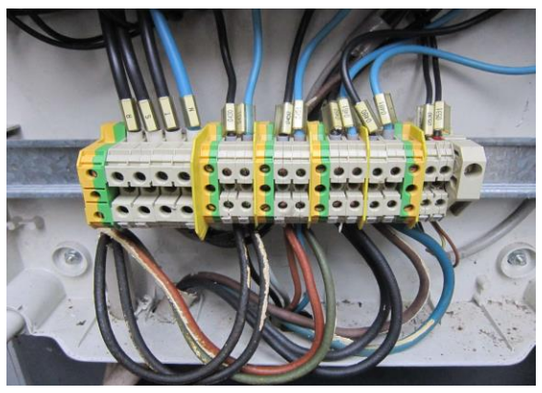



TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	635457		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD.				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	PERRY				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	GRASSLIN	
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C40	4	300mA	AC				275	44
L 01	C16	2							
L 02	C16	2			4X6+4X2,5	FG7OR	>100		
L 03	C16	2							
L 04	C16	2			4X10	FG7OR	>100		
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,05801	MERIDIANI	11,12557	
TRENTO - ORTIGARA via				
QC078		MANUTENERE	RIFARE	BUONO


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		9,09	4,74	3,62	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	CIRCUITO 1	4,09			SI	NO
L 02	CIRCUITO 2		4,74		SI	NO
L 03	CIRCUITO 3			3,62	SI	NO
L 04	CIRCUITO 4	5,00			SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. Interruttori di marche diverse.					

PARALLELI	46,05676	MERIDIANI	11,12621	
TRENTO - PALERMO via				
QC079		MANUTENERE	RIFARE	BUONO







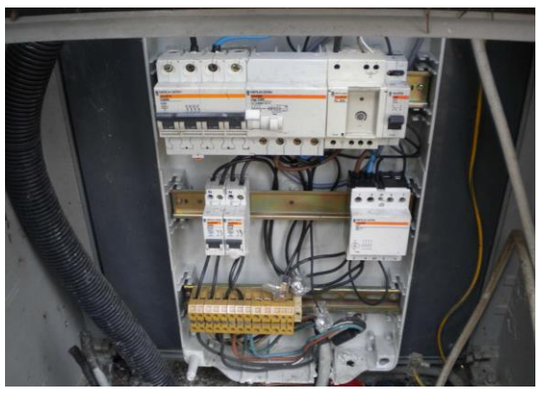



TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	635475		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	CONTATORE TRIFASE COLLEGATO IN MONOFASE
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.		COLORAZIONI NON RISPETTATE				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	THEBEN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	4	300mA	AC				280	46
L 01	C10	2			4X2,5	RIGIDO	>100		
L 02	C10	2			4X2,4	RIGIDO	>100		
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,05676	**MERIDIANI**	11,12621			
TRENTO - PALERMO via						
QC079			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**9,77**			**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	6,56			**SI**	**NO**
L 02	CIRCUITO 2	3,21			**SI**	**NO**
L 03					**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Grado di protezione dell'involucro compromesso. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,07158	MERIDIANI	11,10937	
TRENTO - DIVISIONI ALPINE piazzale				
QC080		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD 739446			NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		MERLIN GERIN				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C25	4	1A	SELETTIVO				750	960
L 01	C16	4	300mA	AC	4x10	FG7OR	>100	270	44
L 02	C16	4	300mA	AC	4x10	FG7OR	>100	270	42
L 03	C16	2	300mA	AC	3x2,5	FG7OR	>100	260	14
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01	C16	2	30mA	AC	2x2,5	FG7OR	>100	24	16
CE 02	C10	2	30mA	AC	2x2,5	FG7OR	>100	22	18
CE 03	C10	2	30mA	AC	2x6	FG7OR	>100	26	18
CE 04	C10	2	30mA	AC	2x2,5	FG7OR	>100	26	18




PARALLELI	46,07158	MERIDIANI	11,10937	
TRENTO - DIVISIONI ALPINE piazzale				
QC080		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**4,30**	**7,08**	**4,60**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	VALLE A	1,52	2,66	2,18	**SI**	**NO**
L 02	VALLE B	2,78	2,34	1,92	**SI**	**NO**
L 03	FARI CALPESTABILI		2,08		**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
CE 01	CANCELLO	0,00			**SI**	**NO**
CE 02	CANCELLO PIAZZA	0,00			**SI**	**NO**
CE 03	CANCELLO STRADA	0,00			**SI**	**NO**
CE 04	TELECAMERE			0,50	**SI**	**NO**
NOTE :	Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,05298	MERIDIANI	11,11555	
TRENTO - PARCO MASO SMALZ				
QC081		MANUTENERE	RIFARE	BUONO





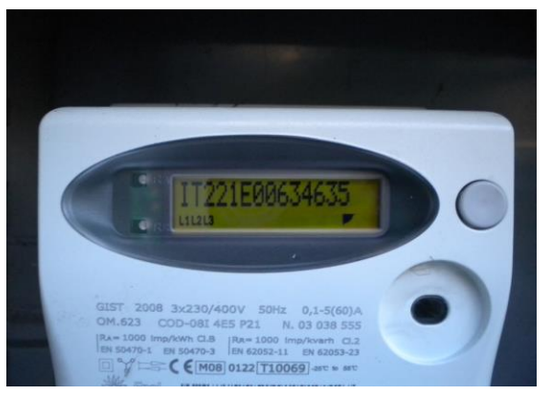





TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	634635		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		MERLIN GERIN				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C40	4							
L 01	C25	2	300mA	AC	4X6	FG7OR	>100	255	33
L 02	C25	2	300mA	AC	4X6	FG7OR	>100	245	22
L 03	C25	2	300mA	AC	4X6	FG7OR	>100	255	25
L 04	C25	2	300mA	AC	4X6	FG7OR	>100	265	28
L 05	C25	2	300mA	AC	4X6	FG7OR	>100	262	28
L 06	C25	2	300mA	AC	2X6	FG7OR	>100	264	28
L 07	C16	2	300mA	AC	2X6	FG7OR	>100	270	32
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,05298	MERIDIANI	11,11555	
TRENTO - PARCO MASO SMALZ				
QC081		MANUTENERE	RIFARE	BUONO


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**29,54**	**23,57**	**22,60**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	PIASTRA SUD TORRE A-B	13,90			**SI**	**NO**
L 02	PIASTRA SUD TORRE C-D		17,22		**SI**	**NO**
L 03	PIASTRA NORD TORRE C-D (NORM. SPENTI)			18,83	**SI**	**NO**
L 04	PIASTRA NORD TORRE E-F (NORM. SPENTI)	15,64			**SI**	**NO**
L 05	PISTA ROLLER EST		6,35		**SI**	**NO**
L 06	PISTA ROLLER OVEST			3,77	**SI**	**NO**
L 07	RISERVA				**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Schemi elettrici non presenti.					


PARALLELI	46,07041	MERIDIANI	11,11983			
TRENTO - GIARDINO di Piazza DANTE						
QC082			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	







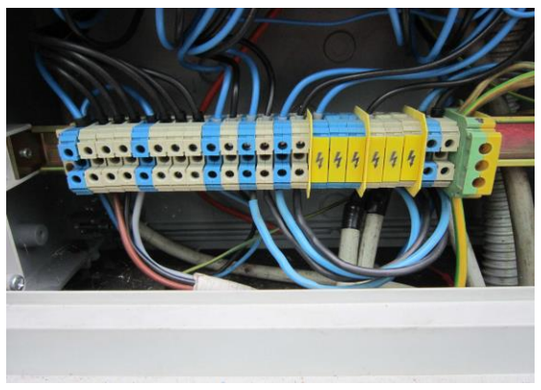

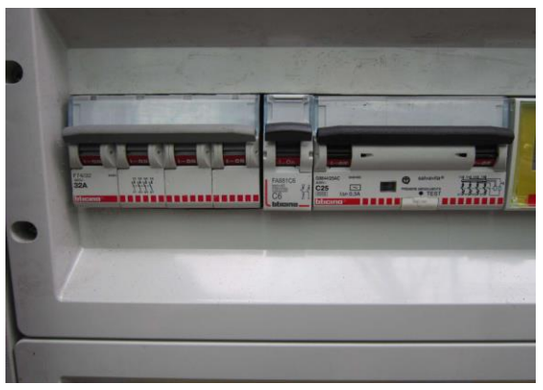

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	620784		NOTE ALIMENTA Q.E. 40-82
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA			SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE		ILLUMINAZIONE GIARDINI IN RIFACIMENTO
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS			SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE		
STATO DEI CABLAGGI Q.E.					SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE		
STATO MORSETTIERE					SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE		
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD.				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD. PREDISPOSIZIONE ALGORAB RES 2				
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		THEBEN
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C80	4							
GENERALE TLC	C25	4	300mA	AC				280	33
L 01 TLC	C10	3			4X6	FG7OR	>100		
L 02 TLC	C10	2							
L 03	C16	2	300mA	AC	2X6	FG7OR	>100		
L 04	C10	2	300mA	A	2X6	FG7OR	>100		
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01	C10	2	300mA	A	2X6	FG7OR	>100	255	42
CE 02	C20	2	300mA	AC	2X6	FG7OR	>100	265	32
CE 03									



PARALLELI	46,07041	MERIDIANI	11,11983			
TRENTO - GIARDINO di Piazza DANTE						
QC082			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		7,64	6,54	0,00	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	GIARDINO				SI	NO
L 02	GIARDINO				SI	NO
L 03	FARI CHIESA SUD-NORD-OVEST)	7,42			SI	NO
L 04	FARI CHIESA EST		6,54		SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01	ZTL	0,22			SI	NO
CE 02	CAMPER	0,00			SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. Mancanza di falsi poli su finestre DIN 35.					

PARALLELI	46,05597	MERIDIANI	11,1239			
TRENTO - CAURIOL via						
QC083			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	633529		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.		DIDORDINATO				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	GRASSLIN
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C25	4	300mA	REG. AC				310	94
L 01	C10	2							
L 02	C10	2							
L 03	C10	2			4X16	FG7OR	>100		
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,05597	**MERIDIANI**	11,1239			
TRENTO - CAURIOL via						
QC083			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**1,48**	**0,45**	**0,62**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	1,48			**SI**	**NO**
L 02	CIRCUITO 2		0,45		**SI**	**NO**
L 03	CIRCUITO 3			0,62	**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. Interruttore differenziale con corrente di intervento > a Idn.					

PARALLELI	46,05871	MERIDIANI	11,12657	
TRENTO - GIARDINO LUNGOFERSINA				
QC084		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



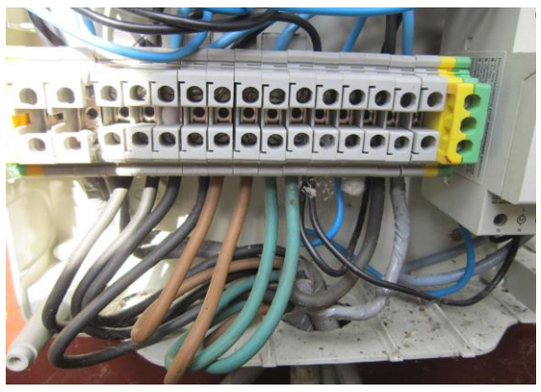







TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD 637930			NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD.				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	PERRY	
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		


TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	SEZ. 32A	2							
L 01	C25	2	300mA	AC	2X4+2X4	FG7OR	>100		
L 02	C10	2	300mA	AC	4X4	FG7OR	>100		
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									

PARALLELI	46,05871	**MERIDIANI**	11,12657			
TRENTO - GIARDINO LUNGOFERSINA						
QC084			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**12,78**			**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	7,92			**SI**	**NO**
L 02	CIRCUITO 2	4,86			**SI**	**NO**
L 03					**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di protezione generale dal cortocircuito. Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Grado di protezione dell'involucro compromesso. Schemi elettrici non presenti.					


PARALLELI	46,05842	MERIDIANI	11,11782	
TRENTO - PARCO MASO GINOCCHIO				
QC085		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

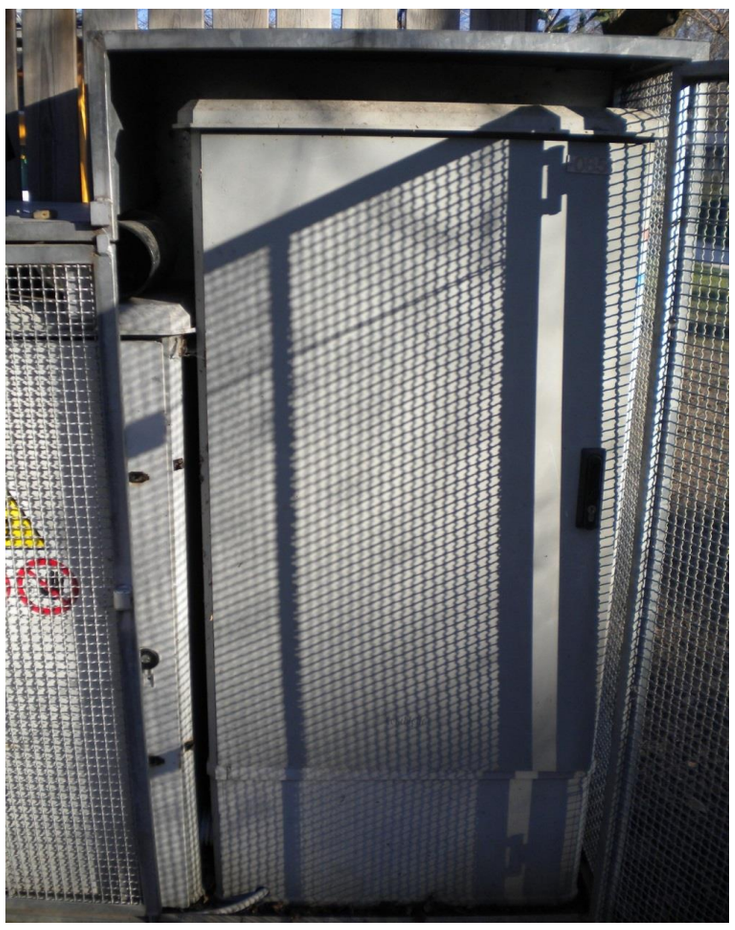





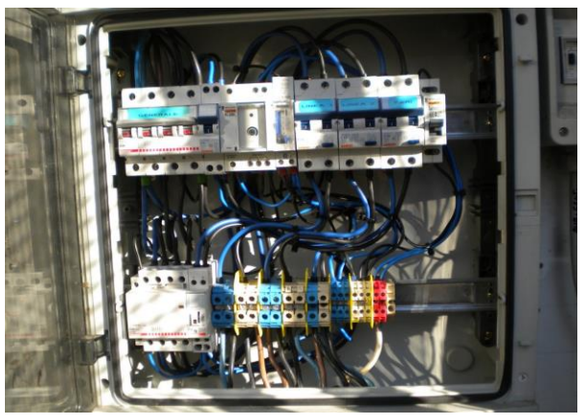

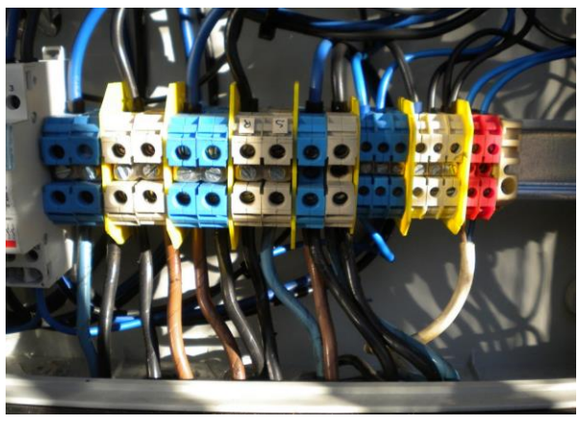

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	NON ACCESSIBILE	NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA			SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS			SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.					SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE					SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN
SCARICATORI	SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI


CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE									
L 01	C16	2	300mA	AC	4X6	RIGIDO	>100	248	22
L 02	C16	2	300mA	AC	4X6	RIGIDO	>100	248	28
L 03	C16	2	300mA	AC	4X6	RIGIDO	>100	265	44
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01	C25	2	30mA	AC	3X1,5	FG7OR	>100	24	28
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,05842	MERIDIANI	11,11782			
TRENTO - PARCO MASO GINOCCHIO						
QC085			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**5,78**	**9,81**	**3,91**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	LINEA 1	5,78			**SI**	**NO**
L 02	LINEA 2		9,81		**SI**	**NO**
L 03	FARI			3,91	**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01	IRRIGAZIONE	0,00			**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di protezione generale dal cortocircuito. Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. Mancato coord. fra protezione e linea.					

PARALLELI	46,07148	MERIDIANI	11,11192	
TRENTO - DOSS TRENTO galleria				
QC086		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

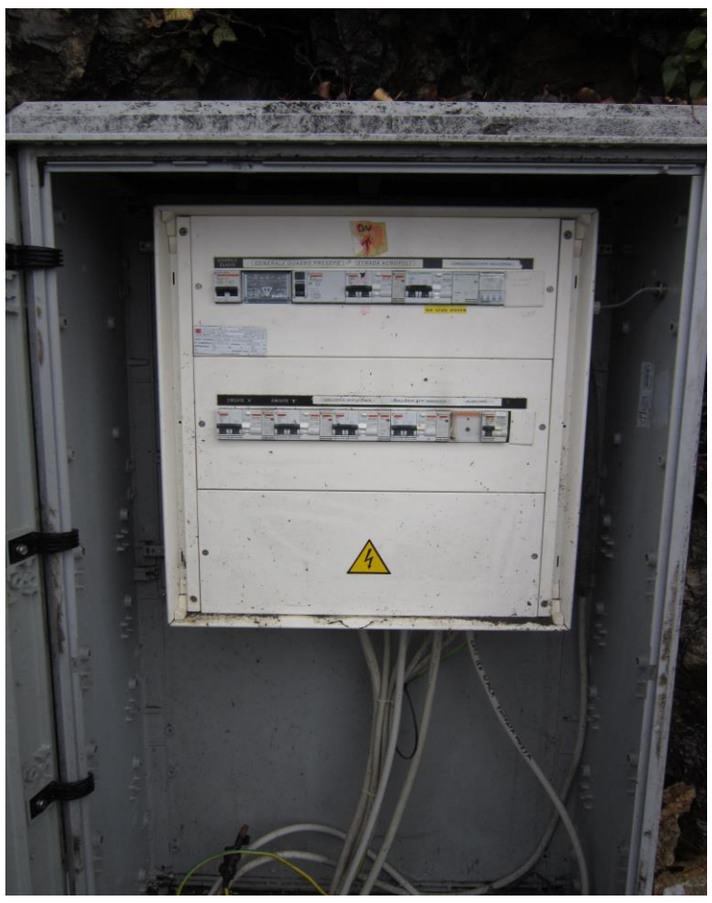



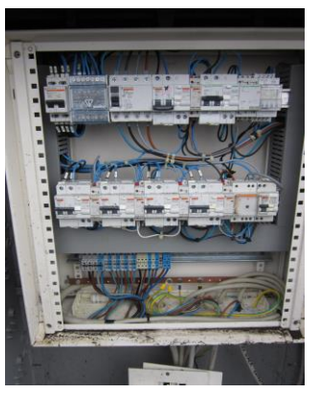

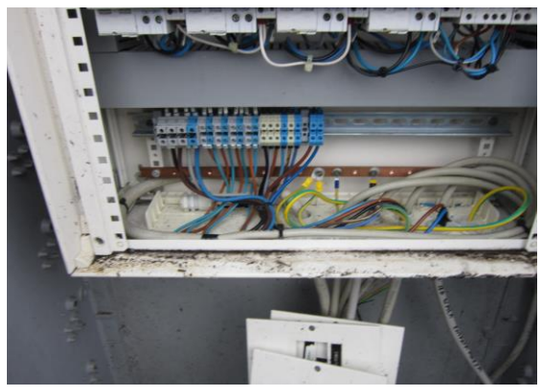



TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	739446		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		MERLIN GERIN				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD.				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN	
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	32A SEZION.	4							
L 01	C10	2	300mA	AC	3x4	FG7OR	>100	260	12
L 02	C10	2	300mA	AC	3x4	FG7OR	>100	240	22
L 03	C16	2	300mA	AC	2x4	FG7OR	>100	240	38
L 04	C16	2	300mA	AC	2x4	FG7OR	>100	250	40
L 05	C16	2	300mA	AC	3x4	FG7OR	>100	245	38
L 06	C16	2	300mA	AC	3x4	FG7OR	>100	230	42
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01	NO	4	300mA	AC PURO	4x4	FG7OR	>100	260	44
CE 02									
CE 03									

PARALLELI	46,07148	**MERIDIANI**	11,11192	
TRENTO - DOSS TRENTO galleria				
QC086		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**4,66**	**10,29**	**7,53**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	ACROPOLI	3,62			**SI**	**NO**
L 02	LED PIAZZA		7,33		**SI**	**NO**
L 03	CIRCUITO A			4,46	**SI**	**NO**
L 04	CIRCUITO B			3,07	**SI**	**NO**
L 05	GALLERIA 1	1,04			**SI**	**NO**
L 06	GALLERIA 2		2,96		**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01	QUADRO PRESEPE	0,00	0,00	0,00	**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di protezione generale dal cortocircuito. Schemi elettrici non presenti. Manca protezione magnetotermica sull'utenza CE01					

PARALLELI	46,07299	MERIDIANI	11,1264			
TRENTO - TORRE d' AUGUSTO via						
QC087			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	628652		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.		DISORDINATI				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	ESTERNO			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	PERRY
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	2	300mA	AC				272	28
L 01	C10	2							
L 02	C10	2			4X6	FG7OR	>100		
L 03	C16	2			4X6	FG7OR	>100		
L 04	C16	2							
L 05	C16	2							
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
CE 01	C25	2	NO		3X10	FG7OR	>100		
CE 02	C25	2	300mA	AC	2X6	FG7OR	>100	275	34
CE 03									





PARALLELI	46,07299	MERIDIANI	11,1264			
TRENTO - TORRE d' AUGUSTO via						
QC087			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		9,61			SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	PUBBLICA TUTTA NOTTE	2,97			SI	NO
L 02	PUBBLICA MEZZA NOTTE	2,05			SI	NO
L 03	PARCO	4,57			SI	NO
L 04	FARI (RISERVA)	0,00			SI	NO
L 05	PING PONG (RISERVA)	0,00			SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01	LINEA BOY SCOUT	0,02			SI	NO
CE 02	QUADRO POMPE E IRRIGAZIONE	0,00			SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere non presenti. Schemi elettrici non presenti. Manca differenziale sull'utenza CE01					


PARALLELI	46,07038	MERIDIANI	11,12641	
TRENTO - S. MARCO via				
QC088		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



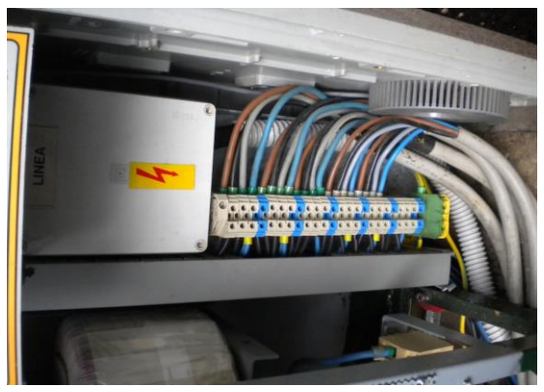

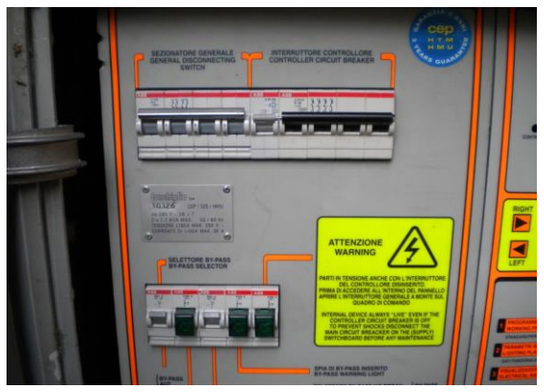

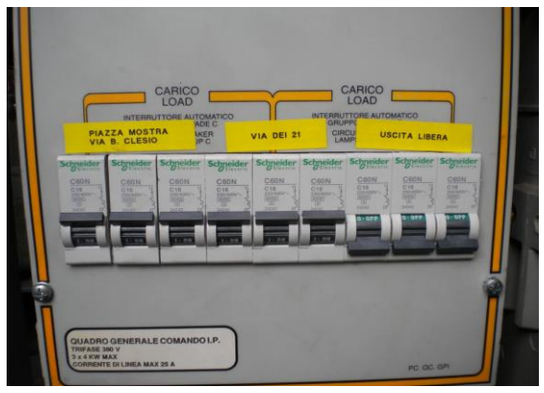

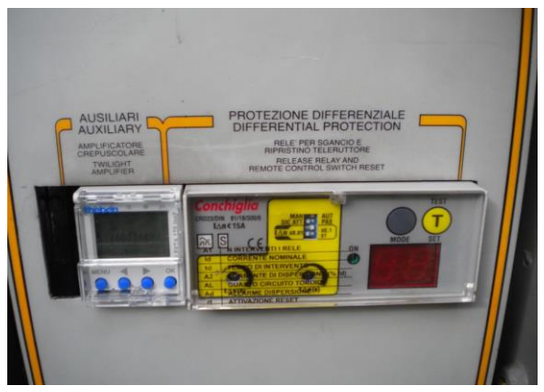

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	627615		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. ESCLUSO	CEP 325 HMU			
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD. TOTALE	ALGORAB - REV2			
CREPUSCOLARE	SI	NO					
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		THEBEN
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	D63	4	300mA	REG. AC				290	92
L 01	C16	3			4X16	FG7OR	>100		
L 02	C16	3			4X16	FG7OR	>100		
L 03	C16	3			4X16	FG7OR	>100		
L 04	C16	3			4X10	FG7OR	>100		
L 05	C16	3			4X10	FG7OR	>100		
L 06	C16	3							
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,07038	MERIDIANI	11,12641	
TRENTO - S. MARCO via				
QC088		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**14,85**	**18,85**	**18,96**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	FARI SOTTOGRONDA SAN MARCO	2,07	1,45	0,70	**SI**	**NO**
L 02	LAMPIONCINI VIA SAN MARCO	1,91	2,15	3,31	**SI**	**NO**
L 03	VIA MARCHETTI VICOLO SAN MARCO	4,38	4,17	5,39	**SI**	**NO**
L 04	PIAZZA MOSTRA VIA CLESIO	3,64	7,80	8,82	**SI**	**NO**
L 05	VIA DEI VENTUNO	2,85	3,28	0,74	**SI**	**NO**
L 06	RISERVA				**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. Mancanza di falsi poli su finestre DIN 35.					

PARALLELI	46,06266	MERIDIANI	11,12625	
TRENTO - PARCO S.CHIARA				
QC089		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	ALIMENTATO DA Q,E, 93	NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA			SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		LUME			SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.		CABLAGGIO Q.E R-S-N DISORDINATO E NON CONFORME			SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE					SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN
SCARICATORI	SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	3							
L 01	C20	2	300mA	AC				245	22
L 02	C20	2	300mA	AC	5X6	FG7OR	>100	248	28
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01	C25	2	300mA	AC	4X4	FG7OR	>100	250	44
CE 02									
CE 03									

PARALLELI	46,06266	**MERIDIANI**	11,12625			
TRENTO - PARCO S.CHIARA						
QC089			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**5,62 (13,22)**	**6,72**		**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	5,62			**SI**	**NO**
L 02	CIRCUITO 2		6,72		**SI**	**NO**
L 03					**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01	FARI (PROIETTORI SU PALI PARCO)	7,60			**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Grado di protezione dell'involucro compromesso. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,06761	MERIDIANI	11,12694	
TRENTO - PIAZZA VENEZIA				
QC090		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	638102		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD.				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	THEBEN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.	B-TICINO			
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C80	4	300mA	REG. AC				290	41
L 01	C16	3			4x16	FG7OR	>100		
L 02	C16	3			4x16	FG7OR	>100		
L 03	C20	3			4x10	FG7OR	>100		
L 04	C10	3			4x4+4x10	FG7OR	>100		
L 05	C25	3			4x16	FG7OR	>100		
L 06	C32	3			4x16	FG7OR	>100		
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,06761	MERIDIANI	11,12694	
TRENTO - PIAZZA VENEZIA				
QC090		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		29,20	27,18	28,19	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	PARCO LINEA 1	5,44	4,04	4,32	SI	NO
L 02	PARCO LINEA 2	4,96	5,48	4,05	SI	NO
L 03	VIA VENEZIA	5,62	6,98	7,05	SI	NO
L 04	VIA GRAZIOLI	3,48	4,42	5,38	SI	NO
L 05	VIA GALILEI ROGGIA GRANDE	3,35	4,43	5,19	SI	NO
L 06	PIAZZA VENEZIA	6,35	1,83	2,20	SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,07346	MERIDIANI	11,11286	
TRENTO - DOSS TRENTO				
QC091		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	739474		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	14 LAMPADE GUASTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 310 HMU				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	THEBEN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	4	300mA	REG. AC				288	67
L 01	C6	3			4x16	FG7OR	>100		
L 02	C6	3			4x16	FG7OR	>100		
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,07346	MERIDIANI	11,11286	
TRENTO - DOSS TRENTO				
QC091		MANUTENERE	RIFARE	BUONO


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		8,10	6,47	4,30	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	CIRCUITO 1	4,32	4,97	2,22	SI	NO
L 02	CIRCUITO 2	3,78	1,50	2,08	SI	NO
L 03					SI	NO
L 04					SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,06049	MERIDIANI	11,11847	
TRENTO - PASCOLI via				
QC092		MANUTENERE	RIFARE	BUONO





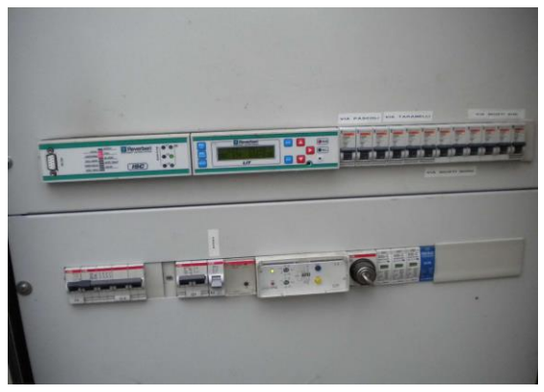

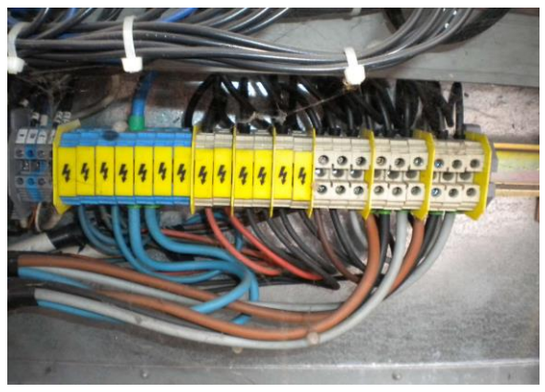



TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	720284		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		REVERBERI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		REVERBERI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. SEC STP 36				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	ABB				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.	OBO			
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C63	4	250mA	REG. AC				242	122
L 01	C10	3			4X4+4X2,5	FG7OR	>100		
L 02	C10	3			4X6	FG7OR	>100		
L 03	C16	3			4X16	FG7OR	>100		
L 04	C16	3			4X16	FG7OR	>100		
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,06049	MERIDIANI	11,11847	
TRENTO - PASCOLI via				
QC092		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		16,60	14,44	12,72	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	VIA PASCOLI	3,22	3,43	3,06	SI	NO
L 02	VIA TARAMELLI	2,04	2,12	2,20	SI	NO
L 03	VIA GIUSTI NORD	3,62	6,61	4,02	SI	NO
L 04	VIA GIUSTI SUD	7,72	2,28	3,44	SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,06268	MERIDIANI	11,12624	
TRENTO - PIAVE via Parco				
QC093		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



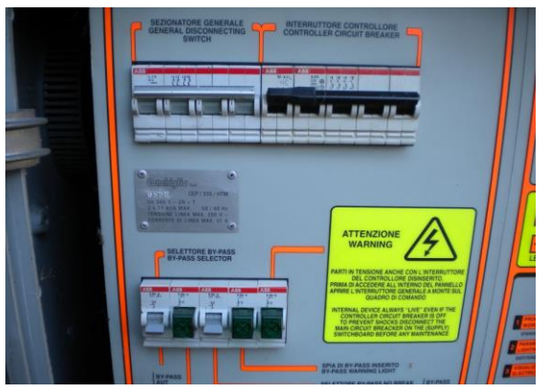







TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	632519		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD. CEP 335 HTM			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	THEBEN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C80	4	500mA	REG. AC				432	118
L 01	C16	3			1X4X16	FG7OR	>100		
L 02	C6	3			4X4	FG7OR	>100		
L 03	C10	3							
L 04	C10	3			4X10	FG7OR	>100		
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,06268	MERIDIANI	11,12624	
TRENTO - PIAVE via Parco				
QC093		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**12,52**	**7,25**	**9,45**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	BRIGATI/ACQUI	4,12	0,00	1,01	**SI**	**NO**
L 02	VIA PIAVE	2,18	1,78	1,93	**SI**	**NO**
L 03	VIA PILATI (RISERVA)	0,00	0,00	0,00	**SI**	**NO**
L 04	VIA S.G. PRATO	6,22	5,47	6,51	**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione					

PARALLELI	46,0797	MERIDIANI	11,12461	
TRENTO - PIAZZINA loc.				
QC094		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	627101		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C20	4	30mA	AC				25	29
L 01	B10	3			4X16	FG7OR	>100		
L 02	B10	3							
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,0797	**MERIDIANI**	11,12461			
TRENTO - PIAZZINA loc.						
QC094			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**4,72**	**4,96**	**4,94**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	VIA PIANIZZA	4,72	4,96	4,94	**SI**	**NO**
L 02					**SI**	**NO**
L 03					**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Morsettiere non presenti. Mancanza di falsi poli su finestre DIN 35.					

PARALLELI	46,08652	MERIDIANI	11,12275	
TRENTO - PIAZZINA loc.				
QC095		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	627117		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	FINDER			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C20	4	30mA	AC				26	32
L 01	B10	3			4X4	FG7OR	>100		
L 02	B10	3							
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,08652	**MERIDIANI**	11,12275			
TRENTO - PIAZZINA loc.						
QC095			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**1,80**	**2,64**	**2,06**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	SENTIERO MESO TREKKING	1,80	2,64	2,06	**SI**	**NO**
L 02	RISERVA				**SI**	**NO**
L 03					**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Morsettiere non presenti. Mancanza di falsi poli su finestre DIN 35.					

PARALLELI	46,07691	MERIDIANI	11,12565	
TRENTO - PIETRASTRETTA via				
QC096		MANUTENERE	RIFARE	BUONO







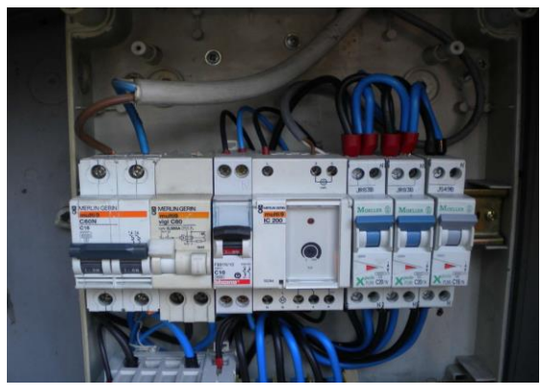



TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	627219		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD.				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI


CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C16	2	300mA	AC				280	32
L 01	C20	2			4X6	FG7OR	>100		
L 02	C20	2			4X6	FG7OR	>100		
L 03	C16	2			2X6	FG7OR	>100		
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									

PARALLELI	46,07691	**MERIDIANI**	11,12565	
TRENTO - PIETRASTRETTA via				
QC096		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**14,06**			**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	7,46			**SI**	**NO**
L 02	CIRCUITO 2	3,28			**SI**	**NO**
L 03	CIRCUITO 3	3,32			**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Grado di protezione dell'involucro compromesso. Schemi elettrici non presenti. Interruttori di marche diverse.					

PARALLELI	46,08918	MERIDIANI	11,11892	
TRENTO - PRANZELORES via				
QC097		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



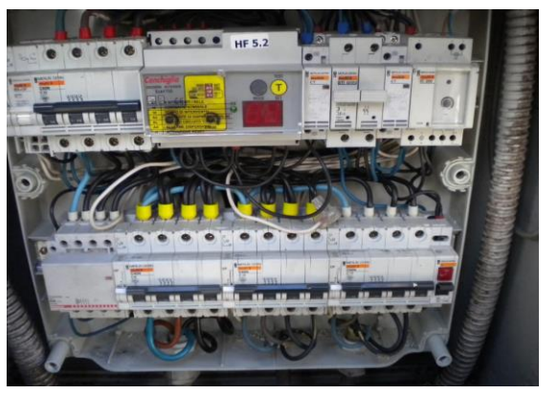







TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	627291		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.	UNPI ELETTRONICA (NON IN USO)		
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	4	300mA	REG. AC				265	82
L 01	C16	4			4x16	FG7OR	>100		
L 02	C10	4			4x4	FG7OR	>100		
L 03	C10	4			4x4	FG7OR	>100		
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									





PARALLELI	46,08918	MERIDIANI	11,11892			
TRENTO - PRANZELORES via						
QC097				MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**7,37**	**4,48**	**4,58**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	2,75	2,88	3,96	**SI**	**NO**
L 02	CIRCUITO 2	2,18	1,05	0,00	**SI**	**NO**
L 03	CIRCUITO 3	2,44	0,55	0,62	**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere non presenti. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,03815	MERIDIANI	11,12442	
TRENTO - FERSINA via				
QC098		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



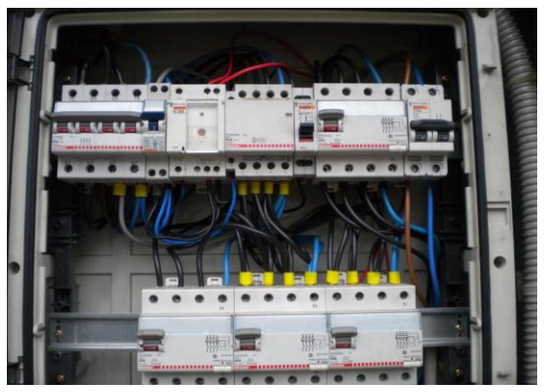

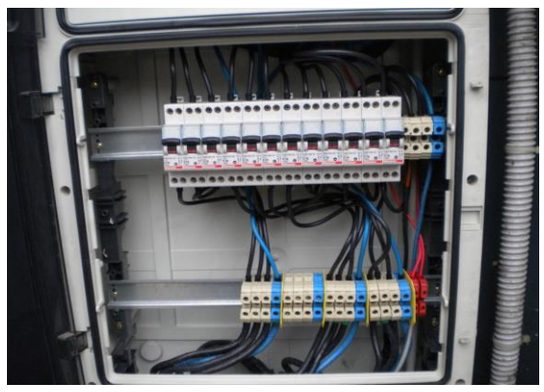





TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	634275		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	


TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	63A SEZION.	4	NO						
L 01	C16	4/3	300mA	AC	4X16	FG7OR	>100	280	44
L 02	C16	4/3	300mA	AC	4X16	FG7OR	>100	265	32
L 03	C16	4/3	300mA	AC	4X16	FG7OR	>100	265	32
L 04	C16	4/3	300mA	AC	2X4	FG7OR	>100	270	38
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01	C16	2	NO		2X6	FG7OR	>100		
CE 02									
CE 03									


PARALLELI	46,03815	MERIDIANI	11,12442			
TRENTO - FERSINA via						
QC098			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**5,04**	**5,44**	**8,33**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1(SVINCOLO)	1,36	0,61	3,76	**SI**	**NO**
L 02	CIRCUITO 2(SUD)	2,62	3,00	2,71	**SI**	**NO**
L 03	CIRCUITO 3(NORD)	1,04	1,83	1,86	**SI**	**NO**
L 04	LINEA NON IDENTIFICATA	0,02	0,00	0,00	**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01	PASSAGGIO PEDONALE		0,00		**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di protezione generale dal cortocircuito. Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. Manca differenziale sull'utenza CE01					


PARALLELI	46,05082	**MERIDIANI**	11,1309			
TRENTO - ROBINIE via						
QC099			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	



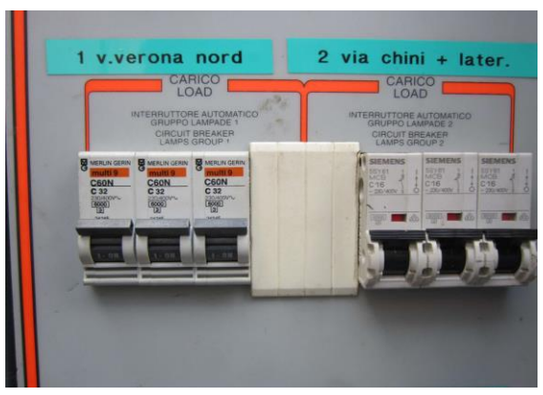

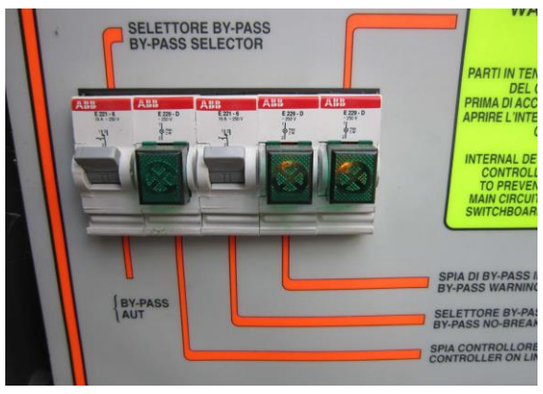

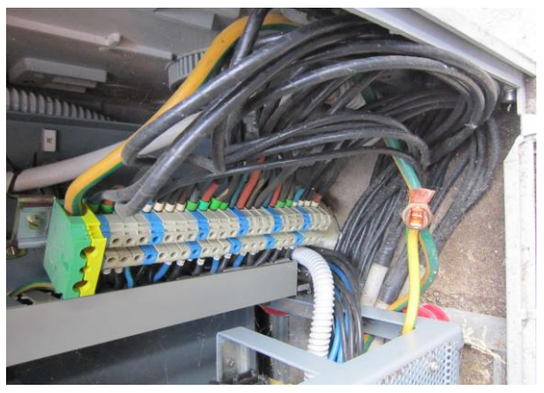

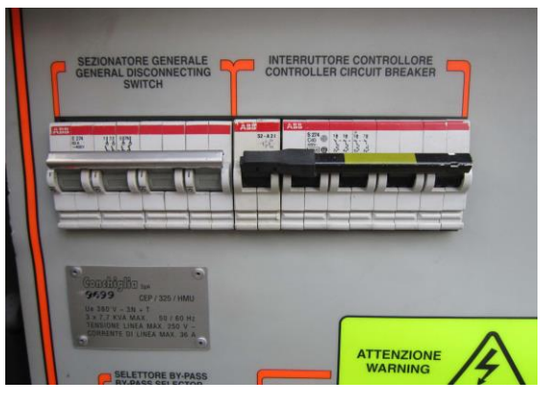

TENSIONE	**230V MF**	**230V 3F**	**400V 3F**	**POD**	**630773**			**NOTE**		
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		**CONCHIGLIA**				**SUFFICIENTE** / **INSUFFICIENTE**				
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		**CONCHIGLIA**				**SUFFICIENTE** / **INSUFFICIENTE**				
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						**SUFFICIENTE** / **INSUFFICIENTE**				
STATO MORSETTIERE						**SUFFICIENTE** / **INSUFFICIENTE**				
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 325 HMU							
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.							
CREPUSCOLARE	SI	NO	THEBEN							
OROLOGIO	SI	NO	**ASTRONOMICO**	SI	NO					
SCARICATORI	SI	NO	MOD.							
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	**DISEGNI Q.E.**	SI	NO					
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	**PE SU PALI**	SI	NO					

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C50	4	300mA	REG. AC				285	82
L 01	C10	3			4X10	FG7OR	>100		
L 02	C16	3			4X10	FG7OR	>100		
L 03	C32	3			4X16	FG7OR	>100		
L 04	C16	3			4X16	FG7OR	>100		
L 05	C16	3			4X16	FG7OR	>100		
L 06	C16	3			4X10	FG7OR	>100		
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,05082	MERIDIANI	11,1309	
TRENTO - ROBINIE via				
QC099		MANUTENERE	RIFARE	BUONO


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**31,22**	**36,87**	**36,27**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	VIALE TIGLI	0,40	0,00	0,00	**SI**	**NO**
L 02	VIA FERMI	7,02	16,09	7,12	**SI**	**NO**
L 03	VIA VERONA NORD	6,80	6,76	8,62	**SI**	**NO**
L 04	VIA CHINI + LATERALE	3,58	5,09	7,94	**SI**	**NO**
L 05	VIA ROBINIE/OLMI	6,23	3,21	4,84	**SI**	**NO**
L 06	VIA VERONA SUD	7,19	5,72	7,75	**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. Cavi nastrati in uscita dal quadro. Interruttori di marche diverse. I carico > I interruttore.					

PARALLELI	46,06094	MERIDIANI	11,12975	
TRENTO - ROVERETO viale				
QC100		MANUTENERE	RIFARE	BUONO





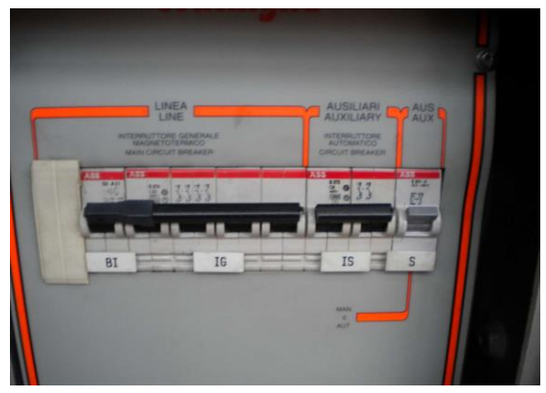

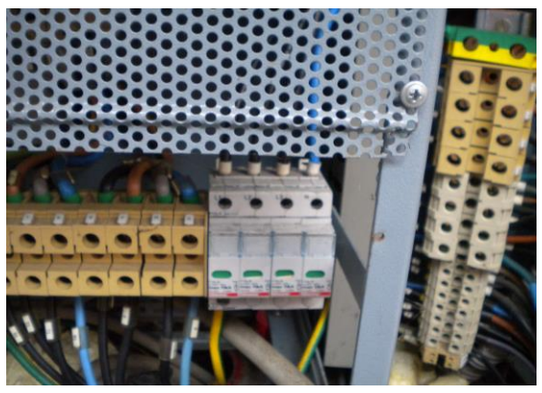



TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	632632		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 325 HMU				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	THEBEN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN	
SCARICATORI	SI	NO	MOD.	BTICINO			
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C50	4	300mA	REG. AC				280	78
L 01	C32	3			4X25	FG7OR	>100		
L 02	C32	3			4X16+4X10	FG7OR	>100		
L 03	C32	3			4X10	FG7OR	>100		
L 04	C16	3			4X6+4X2,5	FG7OR	>100		
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,06094	MERIDIANI	11,12975	
TRENTO - ROVERETO viale				
QC100		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		21,81	24,92	28,23	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	VIA ADAMELLO	8,03	9,85	8,30	SI	NO
L 02	VIALE ROVERETO	6,11	7,56	12,20	SI	NO
L 03	VIALE ROVERETO	3,12	4,22	3,14	SI	NO
L 04	PONTE AZZURRO VIALE BOLOGNINI	4,55	3,29	4,59	SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione.					

PARALLELI	46,06826	MERIDIANI	11,11857	
TRENTO - ROSMINI via				
QC101		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



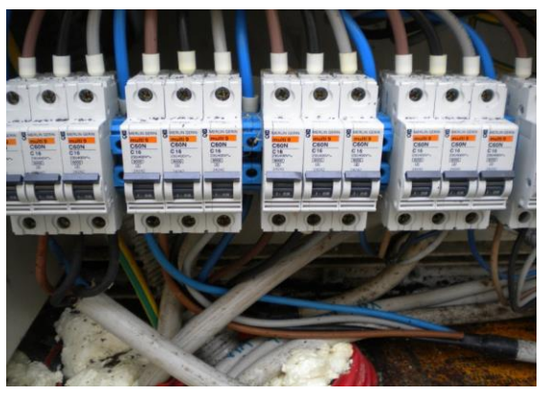







TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	649674		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		IREM				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		IREM				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.	PMR 321 EQ		
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	THEBEN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN
SCARICATORI		SI	NO	MOD.	OBO		
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C50	4	500mA	REG AC				390	84
L 01	C16	3			4X10	FG7OR	>100		
L 02	C16	3			4X10	FG7OR	>100		
L 03	C16	3			4X10	FG7OR	>100		
L 04	C16	3			4X4	FG7OR	>100		
L 05	C16	3			4X4	FG7OR	>100		
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,06826	MERIDIANI	11,11857	
TRENTO - ROSMINI via				
QC101		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		27,88	26,59	24,51	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	VIA ROSMINI EST	5,23	5,88	6,72	SI	NO
L 02	VIA ROSMINI OVEST	6,99	3,52	4,28	SI	NO
L 03	VIA SAN GIOVANNI/ROMA/PIAZZA	8,54	7,11	5,95	SI	NO
L 04	PIAZZA MAGGIORE DX/PIAZZA VERZERI	1,74	5,90	4,82	SI	NO
L 05	VIA PREPOSITURA	5,38	4,18	2,74	SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere non presenti. Schemi elettrici non presenti.					


PARALLELI	46,07074	MERIDIANI	11,11399	
TRENTO - S.APOLLINARE piazzetta				
QC102		MANUTENERE	RIFARE	BUONO









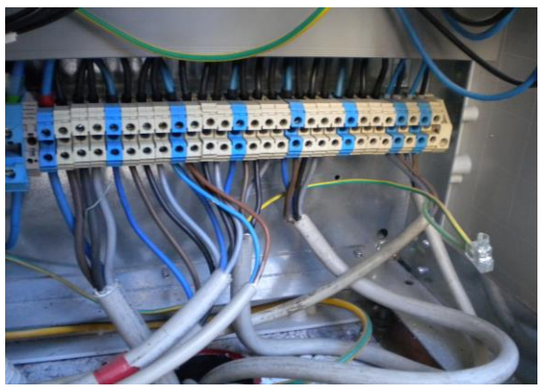

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	622935		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		GE				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		REVERBERI				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD. SEC STP 36			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO				
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	K50	4	300mA	AC				244	46
L 01	C16	3	NO			FG7OR	>100		
L 02	C16	3	NO			FG7OR	>100		
L 03	C16	3	NO			FG7OR	>100		
L 04	C16	3	NO			FG7OR	>100		
L 05	C16	3	NO			FG7OR	>100		
L 06	C16	3	NO			FG7OR	>100		
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01	C6	2	NO		3X1,5	FG7OR	>100		
CE 02	C10	2	300mA	AC	3X1,5	FG7OR	>100	248	50
CE 03									




PARALLELI	46,07074	MERIDIANI	11,11399	
TRENTO - S.APOLLINARE piazzetta				
QC102		MANUTENERE	RIFARE	BUONO


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**16,43**	**14,45**	**13,07**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	MOTORIZZAZIONE	7,16	7,52	7,61	**SI**	**NO**
L 02	ROTATORIA OVEST	4,50	3,40	2,45	**SI**	**NO**
L 03	ROTATORIA EST	3,30	1,91	2,44	**SI**	**NO**
L 04	PARCHEGGIO CHIESA	0,08	0,58	0,00	**SI**	**NO**
L 05	SCUOLA MATERNA E PARCHEGGIO	1,25	0,00	0,57	**SI**	**NO**
L 06	PIAZZA FONTANA	0,00	0,00	0,00	**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01	RIV. TRAFFICO	0,14			**SI**	**NO**
CE 02	SOTTOPASSO S.A.		1,01		**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. Manca differenziale sull'utenza CE01					

PARALLELI	46,05254	MERIDIANI	11,13491	
TRENTO - S.BARTOLOMEO				
QC103		MANUTENERE	RIFARE	BUONO





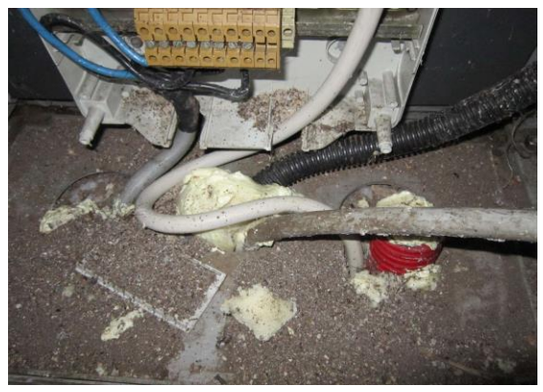

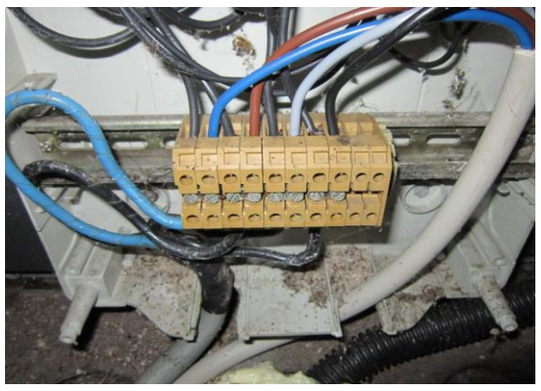



TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	630897		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.		COLORAZIONI NON RISPETTATE				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD.				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	MERLIN GERIN	
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C25	2	300mA	AC				275	44
L 01	C16	2							
L 02	C16	2			4X4+4X4	FG7OR	>100		
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,05254	**MERIDIANI**	11,13491			
TRENTO - S.BARTOLOMEO						
QC103			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**9,83**			**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	6,71			**SI**	**NO**
L 02	CIRCUITO 2	3,12			**SI**	**NO**
L 03					**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Grado di protezione dell'involucro compromesso. Schemi elettrici non presenti. Cavi nastrati in uscita dal quadro. Mancanza di falsi poli su finestre DIN 35					

PARALLELI	46,06947	MERIDIANI	11,12515	
TRENTO - S.PIETRO via				
QC104		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



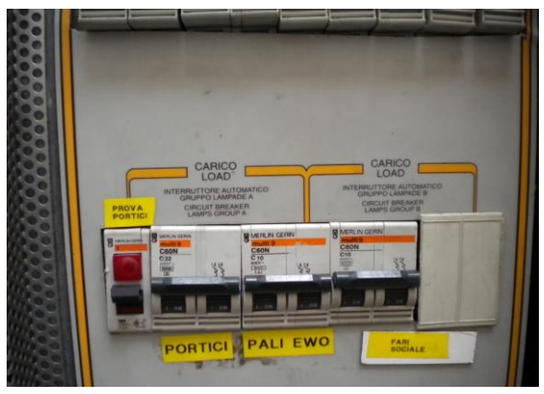







TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	627829		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA -GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. ESCLUSO	CEP 322 GS			
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD. TOTALE	ALGORAB RES-2			
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN	
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C50	4	300mA	REG. AC				230	124
L 01	C10	3			4X4	FG7OR	>100		
L 02	C10	3			4X4	FG7OR	>100		
L 03	C10	3			4X4	FG7OR	>100		
L 04	C32	2							
L 05	C10	2			4X10	FG7OR	>100		
L 06	C10	2			3X6	FG7OR	>100		
L 07	C50	2			1X2X25	FG7OR	>100		
L 08	C6	2			1X2X6	FG7OR	>100		
L 09	C32	2			1X2X25	FG7OR	>100		
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,06947	MERIDIANI	11,12515	
TRENTO - S.PIETRO via				
QC104		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		35,04	24,91	26,07	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	VIA FERRUCCIO/DIETRO LEMURA		5,35		SI	NO
L 02	VICOLO MADDALENA		4,64		SI	NO
L 03	PIAZZA ANFITEATRO		3,84		SI	NO
L 04	PORTICI		4,38		SI	NO
L 05	FARI EWO		1,26		SI	NO
L 06	FARI SOCIALE		5,00		SI	NO
L 07	CIRCUITO 7	35,04			SI	NO
L 08	VIA SAN PIETRO/CARDUCCI		0,44		SI	NO
L 09	VIA SAN PIETRO/MANCI			26,07	SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere non presenti Schemi elettrici non presenti. Interruttori di marche diverse.					

PARALLELI	46,05577	MERIDIANI	11,12004	
TRENTO - S.PIO X				


QC105		MANUTENERE	RIFARE	BUONO









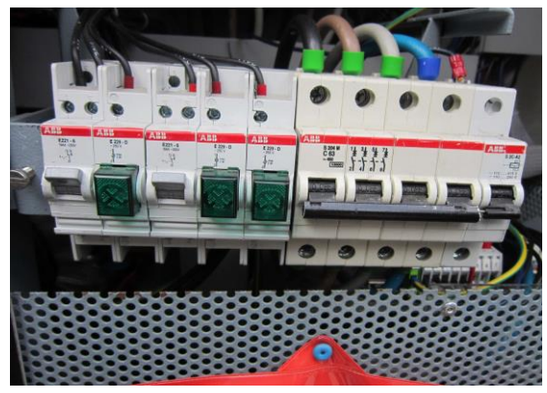

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	635878		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. ESCLUSO	CEP 335 HMU			
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	THEBEN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN	
SCARICATORI	SI	NO	MOD.	BTICINO			
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C80	4	500mA	REG. AC				420	102
L 01	C16	3			4X6	FG7OR	>100		
L 02	C16	3			4X10	FG7OR	>100		
L 03	C16	3			4X6	FG7OR	>100		
L 04	C16	3			4X6	FG7OR	>100		
L 05	C16	3			4X35	FG7OR	>100		
L 06	C16	3			4X6	FG7OR	>100		
L 07	C16	3			4X6+4X6	FG7OR	>100		
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									





PARALLELI	46,05577	MERIDIANI	11,12004			
TRENTO - S.PIO X						
QC105			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**34,39**	**31,84**	**34,50**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	VIA PIO X NORD-EST PALON BAR	4,06	3,49	2,74	**SI**	**NO**
L 02	VIA DON SORDO LUCI BIANCHE	6,72	4,39	1,60	**SI**	**NO**
L 03	VIA MATTEOTTI	2,47	0,15	1,72	**SI**	**NO**
L 04	VIA ZANDONAI	0,00	1,76	1,04	**SI**	**NO**
L 05	VIA MUREDEI	0,63	8,87	8,83	**SI**	**NO**
L 06	VIA MARTINI - PIO X NORD	11,11	8,75	6,87	**SI**	**NO**
L 07	VIA PIO X SUD	9,40	4,43	11,70	**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti.					


PARALLELI	46,06548	MERIDIANI	11,11405	
TRENTO - SANSEVERINO via				
QC106		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



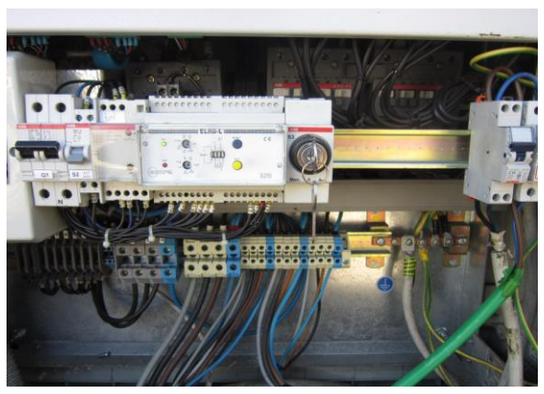

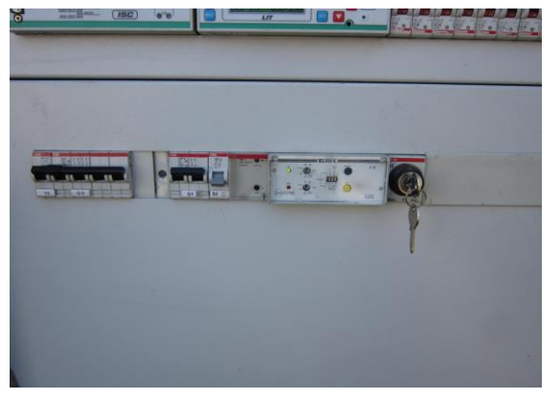

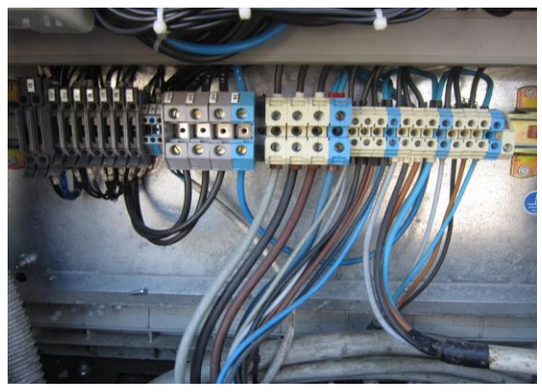

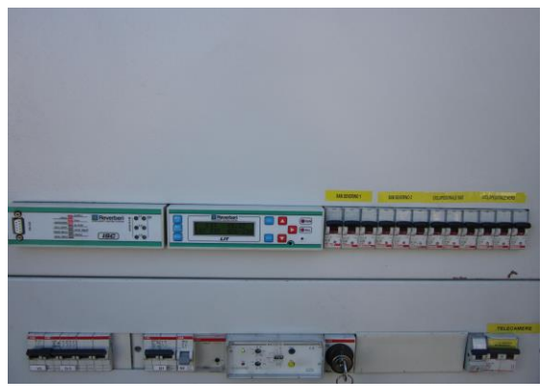

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	623275		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		REVERBERI				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		REVERBERI				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD. SEC STP 36			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	ABB			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C63	4	500mA	REG. AC				380	78
L 01	C16	3			4x16	FG7OR	>100		
L 02	C10	3			4x4+4x4	FG7OR	>100		
L 03	C16	3			4x6	FG7OR	>100		
L 04	C16	3			4x4	FG7OR	>100		
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01	C16	2			2X6	FG7OM1	>100		
CE 02	C25	2			2X6	FG7OR	>100		
CE 03									




PARALLELI	46,06548	MERIDIANI	11,11405	
TRENTO - SANSEVERINO via				
QC106		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**18,86**	**7,00**	**11,71**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	SAN SEVERINO 1	0,80	0,72	3,55	**SI**	**NO**
L 02	SAN SEVERINO 2	13,80	2,00	2,64	**SI**	**NO**
L 03	CICLOPEDONALE SUD	3,04	2,83	3,35	**SI**	**NO**
L 04	CICLOPEDONALE NORD	1,22	1,45	1,30	**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01	LINEA QUADRO BRIMASCO			0,62	**SI**	**NO**
CE 02	TELECAMERE			0,25	**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. I carico > I interruttore.					


PARALLELI	46,05717	MERIDIANI	11,11254	
TRENTO - SANSEVERINO via				
QC107		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



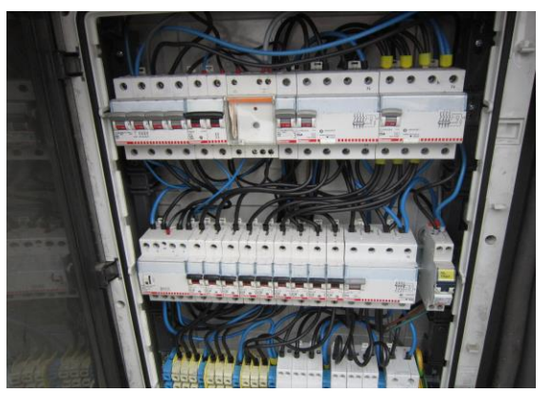





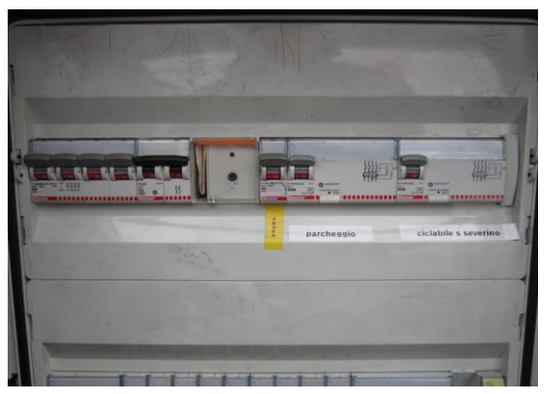

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	637676		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		B-TICINO				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		PARZIALMENTE PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	SEZ. 63A	4							
L 01	C16	3-4	300mA	4x25A PURO AC	4x6	N1VVK	>100	250	34
L 02	C16	3-4			4x6	FG7OR	>100		
L 03	C16	3-4	300mA	4x25A PURO AC	4x10	FG7OR	>100	260	34
L 04	C16	3-4			4x1x10	FG7OR	>100		
L 05	C16	3-4	300mA	4x25A PURO AC	4x1x10	FG7OR	>100	260	28
L 06	C16	1+N	300mA	AC	2x4	FG7OR	>100	255	18
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01	C16	1+N		AC	3x2,5	FG7OR	>100		
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,05717	MERIDIANI	11,11254	
TRENTO - SANSEVERINO via				
QC107		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		17,48	16,92	16,50	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	PARCHEGGIO	3,52	3,48	3,44	SI	NO
L 02	CICLABILE	1,25	1,10	1,28	SI	NO
L 03	SAN SEVERINO	0,82	1,18	1,22	SI	NO
L 04	CICLABILE	5,04	4,98	4,75	SI	NO
L 05	CICLABILE	6,53	6,18	5,56	SI	NO
L 06	PASSERELLA			0,25	SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01	RILEVAMENTO TRAFFICO	0,32			SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di protezione generale dal cortocircuito. Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere non presenti. Grado di protezione dell'involucro compromesso. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,05243	MERIDIANI	11,11207	
TRENTO - SANSEVERINO via				
QC108		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	635930		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 335 HMU				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	THEBEN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.	B-TICINO			
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C80	4	300mA	REG. AC				260	89
L 01	C16	3			4x10	FG7OR	>100		
L 02	C16	3			4x6	FG7OR	>100		
L 03	C16	3			4x6	FG7OR	>100		
L 04	C16	3			4x16	FG7OR	>100		
L 05	C10	3			4x10	FG7OR	>100		
L 06	C6	1+N			2x2,5	FG7OR	>100		
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,05243	MERIDIANI	11,11207	
TRENTO - SANSEVERINO via				
QC108		MANUTENERE	RIFARE	BUONO


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**21,82**	**22,19**	**20,73**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	ROTATORIA NORD EST TRENTO	5,02	4,96	5,06	**SI**	**NO**
L 02	SANSEVERINO SUD USCITA TANG.	5,22	4,14	4,52	**SI**	**NO**
L 03	SANSEVERINO NORD FINO TELECOM	2,05	3,70	3,38	**SI**	**NO**
L 04	SOTTOPASSO ROTATORIA SUD OVEST	6,35	5,35	5,30	**SI**	**NO**
L 05	SVINCOLO TANGENZIALE RAVINA	2,38	4,04	2,47	**SI**	**NO**
L 06	PENSILINA	0,80			**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non aggiornati.					

PARALLELI	46,08173	MERIDIANI	11,11755	
TRENTO - SENESI via				
QC109		MANUTENERE	RIFARE	BUONO







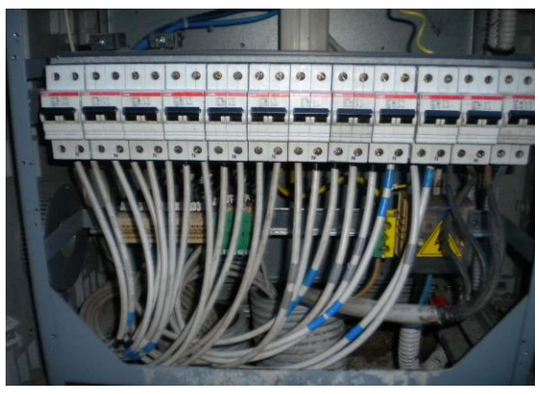



TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	621498		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.	CEP 108 HMU		
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	THEBEN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C40	2	300mA	REG. AC				295	102
L 01	C6	2			1X2X4	FG7OR	>100		
L 02	C6	2			1X2X4	FG7OR	>100		
L 03	C6	2			1X2X4	FG7OR	>100		
L 04	C6	2			1X2X4	FG7OR	>100		
L 05	C6	2			1X2X4	FG7OR	>100		
L 06	C6	2			1X2X4	FG7OR	>100		
L 07	C6	2			1X2X6	FG7OR	>100		
L 08	C6	2			1X2X6	FG7OR	>100		
L 09	C6	2			1X2X6	FG7OR	>100		
L 10	C6	2			1X2X6	FG7OR	>100		
L11	C10	2			4X10	FG7OR	>100		
L12	C10	2							



PARALLELI	46,08173	**MERIDIANI**	11,11755			
TRENTO - SENESI via						
QC109			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**30,52**			**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	LAMPIONCINI INGRESSO SCUOLA	1,06			**SI**	**NO**
L 02	LAMPIONCINI INGRESSO SCUOLA	1,56			**SI**	**NO**
L 03	LAMPIONI PARCHEGGIO	1,22			**SI**	**NO**
L 04	LAMPIONI PARCHEGGIO	1,54			**SI**	**NO**
L 05	PASS.PEDONALE FRONTE Q.E.	0,63			**SI**	**NO**
L 06	PASS.PEDONALE FRONTE Q.E.	1,77			**SI**	**NO**
L 07	VIA SENESI OVEST PARCH. SCUOLA	3,38			**SI**	**NO**
L 08	VIA SENESI OVEST PARCH. SCUOLA	3,90			**SI**	**NO**
L 09	VIA SENESI EST - LAVISOTTO NORD	2,27			**SI**	**NO**
L 10	VIA SENESI EST - LAVISOTTO NORD	2,79			**SI**	**NO**
L11	VIA LAVISOTTO SUD	3,72			**SI**	**NO**
L12	VIA LAVISOTTO SUD	6,68			**SI**	**NO**
					SI	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere non presenti. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,07663	MERIDIANI	11,11795			
TRENTO - SCOPOLI via						
QC110			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	







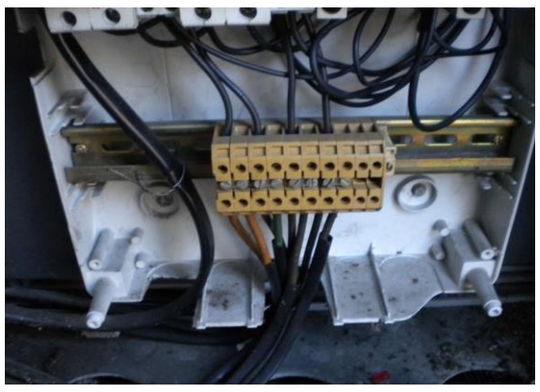



TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	623307		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.		NON RISPETTATI COLORI				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	MERLIN GERIN
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C25	2	300mA	AC					
L 01	C20	2							
L 02	C16	2			4X4+4X4	RIGIDI	>100		
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,07663	**MERIDIANI**	11,11795			
TRENTO - SCOPOLI via						
QC110			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**7,02**			**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	3,80			**SI**	**NO**
L 02	CIRCUITO 2	3,22			**SI**	**NO**
L 03					**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione Grado di protezione dell’involucro compromesso Schemi elettrici non presenti. Cavo interno quadro non idoneo.					


PARALLELI	46,08794	MERIDIANI	11,12118	
TRENTO - SOLTERI via				
QC111		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



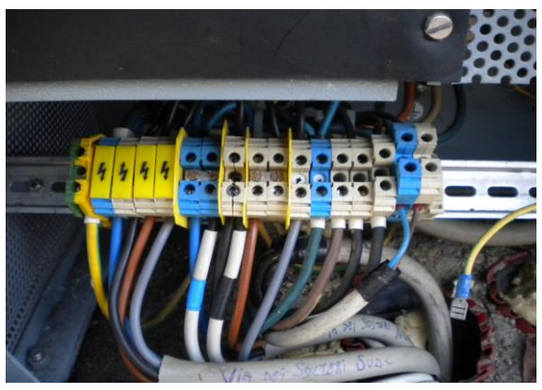





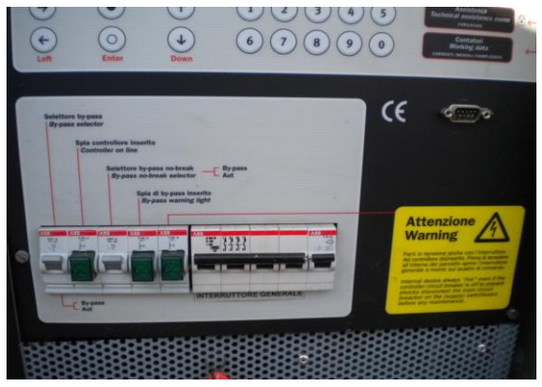

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	628259				NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA					SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE		
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA					SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE		
STATO DEI CABLAGGI Q.E.							SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE		
STATO MORSETTIERE							SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE		
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD. CEP 325 HMU					
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.					
CREPUSCOLARE		SI	NO	THEBEN					
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO			
SCARICATORI		SI	NO	MOD.	OBO				
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO			
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO			

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C50	4	300mA	REG. AC				290	80
L 01	C16	3			4x10	FG7OR	>100		
L 02	C16	3			4x10+2x1x6	FG7OR	>100		
L 03	C16	3			4x10	FG7OR	>100		
L 04	C6	1+N			2x1,5	FG7OR	>100		
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,08794	**MERIDIANI**	11,12118			
TRENTO - SOLTERI via						
QC111			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**12,68**	**11,91**	**10,56**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	SOLTIERI SUD	3,94	4,93	6,25	**SI**	**NO**
L 02	SOLTIERI SUD	5,58	3,45	2,79	**SI**	**NO**
L 03	PARCHEGGIO NORD	2,66	3,53	1,52	**SI**	**NO**
L 04	PENSILINA BUS	0,50			**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione Schemi elettrici non presenti. Cavo PE scollegato interno quadro.					

PARALLELI	46,08209	MERIDIANI	11,12244			
TRENTO - SOLTERI via						
QC112			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	628308		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 335 HMU				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	LEGRAND	
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C80	4	500mA	REG. AC				390	111
L 01	C16	3/2			4X16	FG7OR	>100	NON SOTTO REGOLATORE	
L 02	C16	3/2			4X16	FG7OR	>100		
L 03	C10/16/10	3			4X2,5+4X2,5	FG7OR	>100		
L 04	C10/16/10	3			4X10	FG7OR	>100		
L 05	C16	3			4X16	FG7OR	>100		
L 06	SEZ. 16A 1P	3			4X16	FG7OR	>100		
L 07	C16	3			4X16	FG7OR	>100		
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,08209	MERIDIANI	11,12244	
TRENTO - SOLTERI via				
QC112		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		26,02	25,81	22,96	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	CICLABILE NORD	2,12	1,47	0,88	SI	NO
L 02	CICLABILE SUD	0,13	0,52	0,72	SI	NO
L 03	SOLTIERI MARCONI	8,33	5,24	6,87	SI	NO
L 04	SOLTIERI BRENNERO	2,50	3,91	3,30	SI	NO
L 05	VIA COMBONI	3,81	4,76	2,75	SI	NO
L 06	VIA SPALLIERA	5,09	5,91	5,22	SI	NO
L 07	CIRCUITO 7	4,04	4,00	3,22	SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione Schemi elettrici non aggiornati. Interruttori di marche diverse.					

PARALLELI	46,07038	MERIDIANI	11,12641	
TRENTO - SAN MARCO parco				
QC113		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	627615		NOTE STESSO CONTATORE DEL 88
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C16	2	300mA	AC	3X4	FG7OR	>100	265	30
L 01									
L 02									
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,07038	MERIDIANI	11,12641			
TRENTO - SAN MARCO parco						
QC113			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE				**5,73**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	GENERALE/ILLUMINAZIONE GIARDINO			5,73	**SI**	**NO**
L 02					**SI**	**NO**
L 03					**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione Morsettiere non presenti Schemi elettrici non presenti. Interruttori di marche diverse.					

PARALLELI	46,07158	MERIDIANI	11,12491	
TRENTO - SUFFRAGIO via del				
QC114		MANUTENERE	RIFARE	BUONO







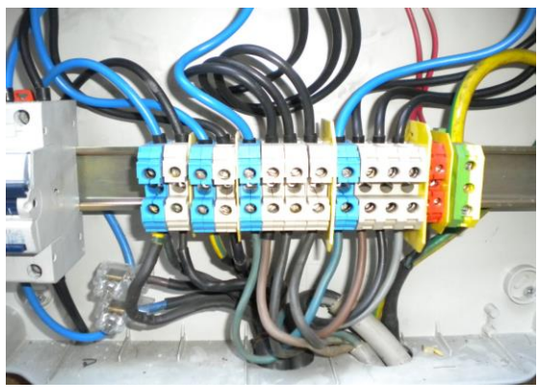



TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	628468		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		NICCHA INCASSATA NEL MURO CON PORTA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD.				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	SEZ. 63A	4							
L 01	C16	2	300mA	AC	2X4	RIGIDO	>100	265	34
L 02	C16	4	300mA	AC	4X6	FG7OR	>100	255	32
L 03	C16	4	300mA	AC	4X4	FG7OR	>100	262	32
L 04	C16	2	300mA	AC	3X2,5	RIGIDO	>100	265	36
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,07158	MERIDIANI	11,12491			
TRENTO - SUFFRAGIO via del						
QC114			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**2,14**	**1,85**	**5,85**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	PIAZZA SUFFRAGIO			3,20	**SI**	**NO**
L 02	VIA SUFFRAGIO	1,61	0,55	2,65	**SI**	**NO**
L 03	PALAZZO TRAUMANDROF	0,53	0,00	0,00	**SI**	**NO**
L 04	CIRCUITO 4		1,30		**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di protezione generale dal cortocircuito Mancanza della targa del quadro Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione Grado di protezione dell’involucro compromesso Schemi elettrici non presenti. Mancanza di falsi poli su finestre DIN 35.					


PARALLELI	46,07095	MERIDIANI	11,12471	
TRENTO - SUFFRAGIO via del				
QC115		MANUTENERE	RIFARE	BUONO









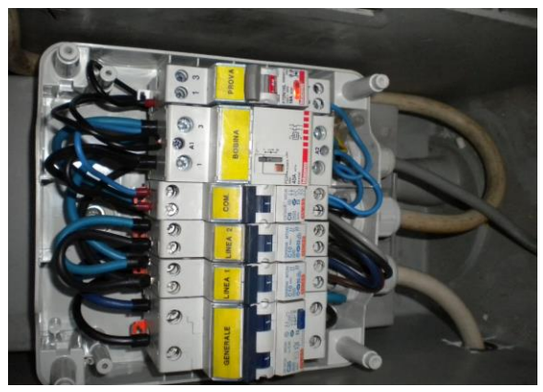

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	628516		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		ENEL				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	ESTERNO			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	SCATOLE DI DERIVAZIONE INCASSO

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C25	2	300mA	AC				265	44
L 01	C10	2							
L 02	C10	2			4X2,5	FG7OR	>100		
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,07095	**MERIDIANI**	11,12471			
TRENTO - SUFFRAGIO via del						
QC115			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**9,40**			**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	4,93			**SI**	**NO**
L 02	CIRCUITO 2	4,47			**SI**	**NO**
L 03					**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere non presenti. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,06724	MERIDIANI	11,12044	
TRENTO - TERLAGO vicolo				
QC116		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	61920084		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD. TOTALE	ALGORAB RES-2		
CREPUSCOLARE		SI	NO				
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	MERLIN GERIN
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C40	4	300mA	REG AC				280	96
L 01	C16	3			4X16	FG7OR	>100		
L 02	C16	3			4X4	FG7OR	>100		
L 03	C16	3			4X4	FG7OR	>100		
L 04	C16	3			4X4	FG7OR	>100		
L 05	C16	3			4X4	FG7OR	>100		
L 06	C10	2			4X4	FG7OR	>100		
L 07	C10	2			2X2,5	FG7OR	>100		
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,06724	MERIDIANI	11,12044	
TRENTO - TERLAGO vicolo				
QC116		MANUTENERE	RIFARE	BUONO


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**12,33**	**5,83**	**4,88**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	VIA CAVOUR	5,69	2,09	3,22	**SI**	**NO**
L 02	VIA BENASSUTTI	0,70	0,32	0,71	**SI**	**NO**
L 03	VIA BIRRI	1,07	0,90	0,45	**SI**	**NO**
L 04	VIA DON RIZZI	0,71	0,70	0,32	**SI**	**NO**
L 05	VIA PIEVANO	1,12	1,82	0,38	**SI**	**NO**
L 06	PORTICI	3,04			**SI**	**NO**
L 07	FARO PORTICO			0,25	**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non aggiornati.					


PARALLELI	46,05127	MERIDIANI	11,1321			
TRENTO - TIGLI viale						
QC117			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	







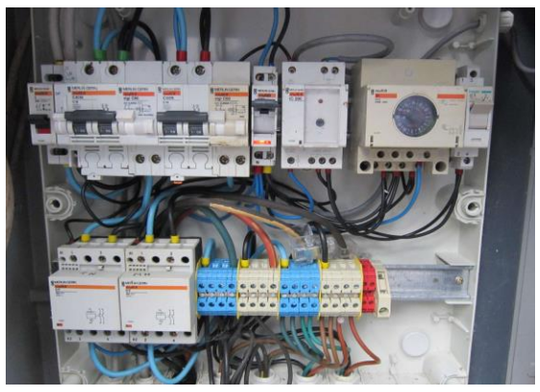

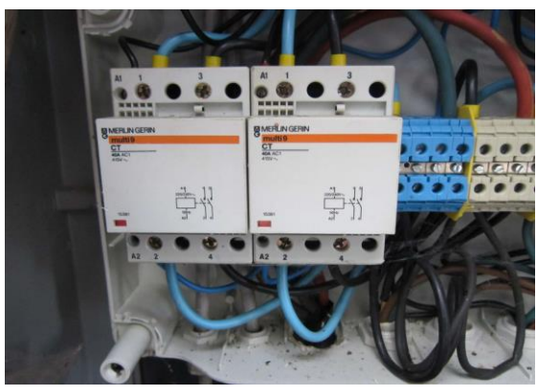

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	630937		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	MERLIN GERIN
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	SEZ. 32A	2							
L 01	C16	2	300mA	AC	4X4+4X4+4X16	FG7OR	>100	280	32
L 02	C16	2	300mA	AC	4X4+4X4	FG7OR	>100	275	28
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,05127	**MERIDIANI**	11,1321			
TRENTO - TIGLI viale						
QC117			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**10,94**			**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	5,92			**SI**	**NO**
L 02	CIRCUITO 2	5,02			**SI**	**NO**
L 03					**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di protezione generale dal cortocircuito Mancanza della targa del quadro Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione Schemi elettrici non presenti. Mancanza di falsi poli su finestre DIN 35					

PARALLELI	46,07098	MERIDIANI	11,12321	
TRENTO - TORRE VERDE				
QC118		MANUTENERE	RIFARE	BUONO





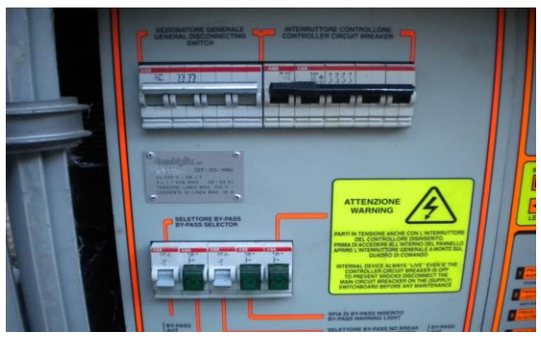





TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	623565		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 325 HMU				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	THEBEN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN	
SCARICATORI	SI	NO	MOD.	DEHN			
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C40	4	500mA	REG. AC				350	112
L 01	C10	3			4X16+2X4	FG7OR	>100		
L 02	C16	3			4X16	FG7OR	>100		
L 03	C16	3			4X16	FG7OR	>100		
L 04	C16	2			4X16	FG7OR	>100		
L 05	C10	2			4X6	FG7OR	>100		
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01	C10	2	30mA	AC	2X2,5	FG7OR	>100		
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,07098	MERIDIANI	11,12321	
TRENTO - TORRE VERDE				
QC118		MANUTENERE	RIFARE	BUONO


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**22,18**	**18,40**	**25,34**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	2,05	4,15	1,56	**SI**	**NO**
L 02	VIA TORRE VERDE NORD	5,57	10,87	11,72	**SI**	**NO**
L 03	VIA TORRE VERDE SUD	5,05	3,38	4,62	**SI**	**NO**
L 04	VICOLO D'ADIGE GALASSO			7,44	**SI**	**NO**
L 05	VICOLO D'ADIGE SENTINEL	4,12			**SI**	**NO**
L 06	ZTL VICOLO ADIGE (SEGNALI)	1,27			**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01	VICOLO VO ADIGE SENTINEL SEMPRE ACC.	4,12			**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione Schemi elettrici non presenti. Cavi nastrati in uscita dal quadro. Interruttori di marche diverse.					


PARALLELI	46,0663	MERIDIANI	11,1362	
TRENTO - TOVAZZI salita				
QC119		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



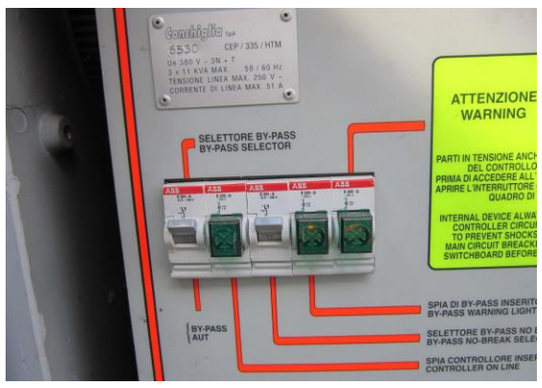



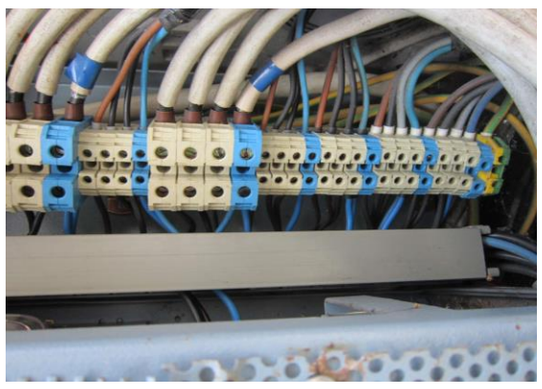

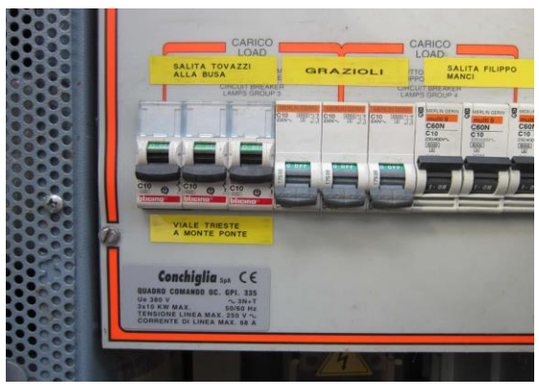

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	633048		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 335 HTM				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	THEBEN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.	OBO			
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C80	4	500mA	REG. AC				410	106
L 01	C16	3			1X4X25	FG7OR	>100		
L 02	C10	3			4X4	FG7OR	>100		
L 03	C16	3			1X4X25	FG7OR	>100		
L 04	C10	3			4X4	FG7OR	>100		
L 05	C10	3			4X6	FG7OR	>100		
L 06	C10	3			4X10	FG7OR	>100		
L 07	C10	3			4X10	FG7OR	>100		
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,0663	MERIDIANI	11,1362			
TRENTO - TOVAZZI salita						
QC119			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		28,81	29,32	28,86	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	VIA VENEZIA 1	8,56	11,40	4,80	SI	NO
L 02	VIA VENEZIA 2	1,90	1,86	1,98	SI	NO
L 03	VIA VALSUGANA 1	4,46	4,30	3,98	SI	NO
L 04	VIA VALSUGANA 2	2,24	1,68	4,94	SI	NO
L 05	SALITA TOVAZZI VIA TRIESTE	4,70	3,03	5,06	SI	NO
L 06	VIA GRAZIOLI	3,77	3,19	3,16	SI	NO
L 07	SALITA MANCI	3,18	3,86	4,94	SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,09414	MERIDIANI	11,10982	
TRENTO - UNTERVEGER via				
QC120		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



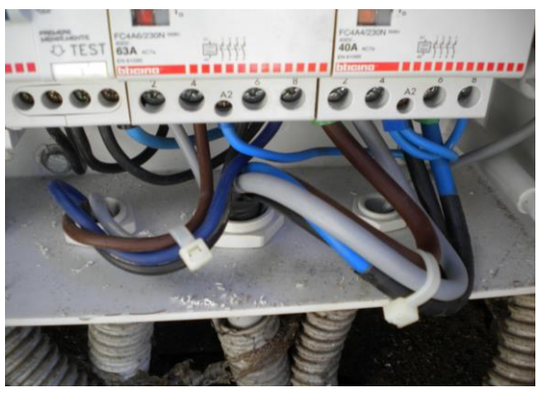



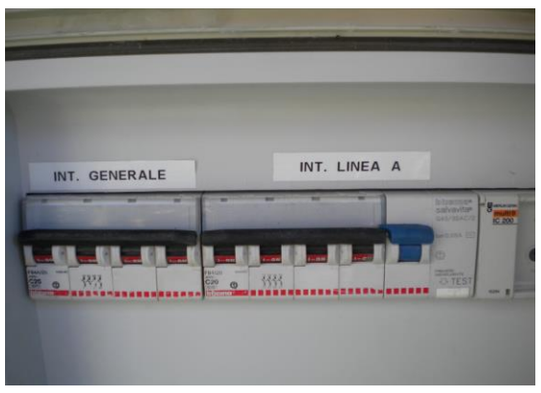



TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	607455		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		B-TICINO				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C25	4							
L 01	C20	4	300mA	AC	4x6	FG7OR		270	34
L 02	C20	4	300mA	AC	4x16	FG7OR		270	38
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,09414	MERIDIANI	11,10982				
TRENTO - UNTERVEGER via							
QC120				MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**7,84**	**9,05**	**6,95**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	LINEA A	7,02	7,31	6,07	**SI**	**NO**
L 02	LINEA B	0,82	1,74	0,88	**SI**	**NO**
L 03					**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere non presenti. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,07449	MERIDIANI	11,10641	
TRENTO - SS. Cosma Damiano				
QC121		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



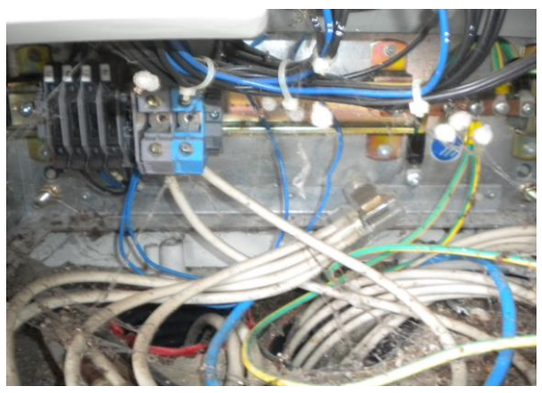







TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD 623106			NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		GE				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		REVERBERI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. SEC STPM 07				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	ABB				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	2	300mA	REG. AC	2X4X4X1	FG7OR	>100	292	92
L 01									
L 02									
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,07449	**MERIDIANI**	11,10641			
TRENTO - SS. Cosma Damiano						
QC121			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**18,40**			**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	GENERALE	18,40			**SI**	**NO**
L 02					**SI**	**NO**
L 03					**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione Morsettiere non presenti Schemi elettrici non presenti. Mancato coord. fra protezione e linea.					

PARALLELI	46,07869	MERIDIANI	11,10374	
TRENTO - SS. Cosma Damiano				
QC122		MANUTENERE	RIFARE	BUONO





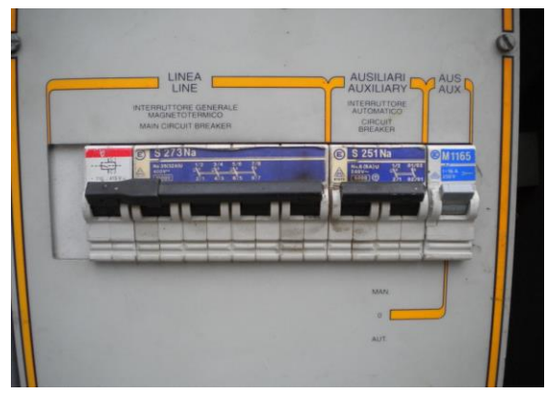





TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	622943		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 311 GS				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	THEBEN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	4	500mA	REG. AC				420	67
L 01	C16	4			4X4	FG7OR	>100		
L 02	C10	4			4X1X16	FG7OR	>100		
L 03	C16	3			4X1X16	FG7OR	>100		
L 04	C10	4			4X1X16	FG7OR	>100		
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,07869	MERIDIANI	11,10374	
TRENTO - SS. Cosma Damiano				
QC122		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**14,42**	**15,40**	**17,18**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	SOTTOPASSO(NO REGOLATORE)	1,22	1,00	1,00	**SI**	**NO**
L 02	NORD	3,66	5,74	6,62	**SI**	**NO**
L 03	SUD	4,45	6,17	6,45	**SI**	**NO**
L 04	VIA ALLA SCALA	5,09	2,49	3,11	**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione Schemi elettrici non presenti. Interruttori di marche diverse. Carpenteria ammalorata.					

PARALLELI	46,08196	MERIDIANI	11,10287	
TRENTO - SS. Cosma Damiano				
QC123		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	623653		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		PLOYSAFE				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		REVERBERI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. SEC STP 21				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO					
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	4	300mA	REG. AC					
L 01	C16	3	NO		FG7	4X6			
L 02	C20	3	NO						
L 03	C16	2	NO		FG7	3X2,5			
L 04	C10	3	NO		FG7	4X1X16			
L 05	C10	3	NO		FG7	4X10			
L 06	C10	3	NO						
L 07	C16	3	NO		FG7	4X6			
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,08196	MERIDIANI	11,10287	
TRENTO - SS. Cosma Damiano				
QC123		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**8,68**	**6,88**	**9,88**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	PIAZZA/RETRO CHIESA	0,00	0,65	0,67	**SI**	**NO**
L 02	RISERVA				**SI**	**NO**
L 03	LUCI SOTTO PASSO	0,13			**SI**	**NO**
L 04	SRADA DISCARICA	3,40	2,89	2,28	**SI**	**NO**
L 05	LATERALE STRADA FONDA	1,37	1,68	1,43	**SI**	**NO**
L 06	PIAZZA RETRO CHIESA	0,00	0,00	0,00	**SI**	**NO**
L 07	STRADA FONDA	3,78	1,66	5,50	**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione Schemi elettrici non presenti. Mancanza di falsi poli su finestre DIN 35.					

PARALLELI	46,07777	MERIDIANI	11,11106	
TRENTO - DI CENTA località				
QC124		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD 620500			NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	MERLIN GERIN
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	


TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C20	2	NO						
L 01	C16	2	300mA	AC				265	32
L 02	C16	2	300mA	AC	4X6+4X6+4X6	FG7OR	>100	260	24
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									

PARALLELI	46,07777	**MERIDIANI**	11,11106	
TRENTO - DI CENTA località				
QC124		MANUTENERE	RIFARE	BUONO


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**10,06**			**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	LINEA 1	5,22			**SI**	**NO**
L 02	LINEA 2	4,84			**SI**	**NO**
L 03					**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,05841	MERIDIANI	11,12177	
TRENTO - VENETO via				
QC125		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



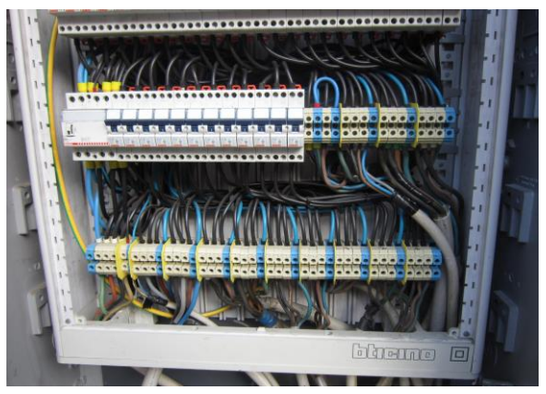



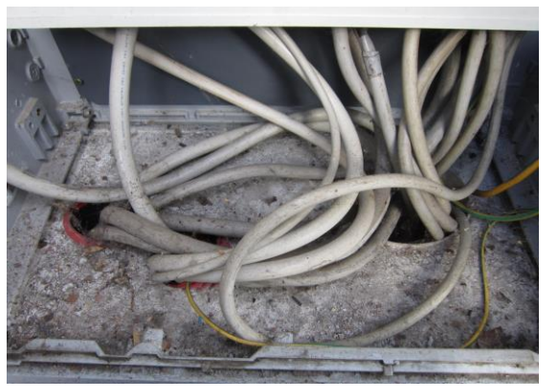



TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD 636442		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA			SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA/B-TICINO			SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.					SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE					SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	

REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 335 HMU			
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN
SCARICATORI	SI	NO	MOD.	B-TICINO		
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	100A SEZION.	4							
L 01	C16	4-3	300mA	AC	4x4	FG7OR	>100	260	44
L 02	C16	4-3	300mA	AC	4x16	FG7OR	>100	260	48
L 03	C20	4-3	300mA	AC	4x10	FG7OR	>100	265	40
L 04	C20	4-3	300mA	AC	4x10	FG7OR	>100	265	37
L 05	C20	4-3	300mA	AC	4x10	FG7OR	>100	260	44
L 06	C20	4-3	300mA	AC	4x16	FG7OR	>100	270	42
L 07	C16	4-3	300mA	AC	4x10	FG7OR	>100	260	38
L 08	C16	4-3	300mA	AC	4x16	FG7OR	>100	260	22
L 09	C16	4-3	300mA	AC	4x6	FG7OR	>100	250	8
L 10	C16	4-3	300mA	AC	4x6	FG7OR	>100	275	18
L11	C16	4-3	300mA	AC	4x6	FG7OR	>100	260	40
L12	C16	4-3	300mA	AC	4x4	FG7OR	>100	260	42



DOC. 02.3


Censimento puntuale dei quadri di comando di pubblica illuminazione

PARALLELI	46,05841	**MERIDIANI**	11,12177			
TRENTO - VENETO via						
QC125			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**43,47**	**40,72**	**54,38**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	VIA FILZI DX NORD/DAMIANO CHIESA	2,35	1,52	8,46	**SI**	**NO**
L 02	VIA VITTORIO VENETO DX	0,62	0,72	0,52	**SI**	**NO**
L 03	VIA LORENZONI	4,65	5,18	5,24	**SI**	**NO**
L 04	LUCI BIANCHE	3,22	3,66	4,21	**SI**	**NO**
L 05	QUARTIERE DUCA D'AOSTA	8,34	6,47	9,27	**SI**	**NO**
L 06	VIA VITTORIO VENETO SX PRATI	7,14	6,55	7,78	**SI**	**NO**
L 07	VIA PERINI	1,06	5,38	4,18	**SI**	**NO**
L 08	VIA ROVERETI	4,68	2,04	1,41	**SI**	**NO**
L 09	VIA BUCCELLA	2,30	0,51	2,06	**SI**	**NO**
L 10	VIA BRONZETTI SX FILZI SX BEZZI SISTER	5,35	3,86	6,36	**SI**	**NO**
L 11	VIA BRONZETTI DX	1,66	2,00	2,52	**SI**	**NO**
L 12	VIA VITTORIO VENETO 4PL FRONTE QE	2,10	2,83	2,37	**SI**	**NO**
					SI	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro di distribuzione Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione Schemi elettrici non presenti. Mancanza di falsi poli su finestre DIN 35.					

PARALLELI	46,06993	**MERIDIANI**	11,11162			
TRENTO - VERRUCA via						
QC126			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	



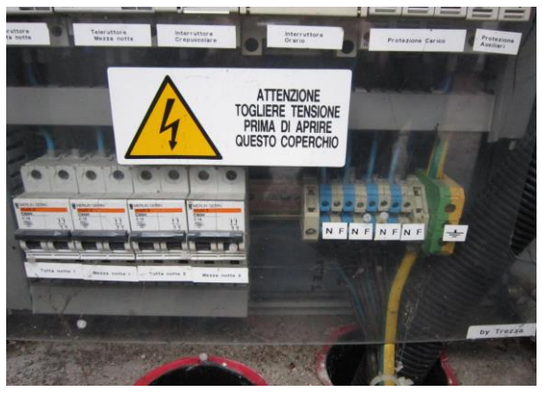





TENSIONE	**230V MF**	**230V 3F**	**400V 3F**	**POD**	**623795**		**NOTE**	
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		**CONCHIGLIA**				**SUFFICIENTE INSUFFICIENTE**		
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA						**SUFFICIENTE INSUFFICIENTE**		
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						**SUFFICIENTE INSUFFICIENTE**		
STATO MORSETTIERE						**SUFFICIENTE INSUFFICIENTE**		
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.				
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO		SI	NO	**ASTRONOMICO**	SI	NO	MERLIN GERIN	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	**DISEGNI Q.E.**	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	**PE SU PALI**	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	**PROT. MT**	**POLI**	**PROT. DIFF.**	**TIPO DIFF.**	**SEZIONE CAVO**	**TIPO CAVO**	**RES. ISOL. CAVO**	**DIFF. mA**	**DIFF. mS**
GENERALE	C32	4	500mA	REG. AC				425	111
L 01	C16	2							
L 02	C16	2			4X4	RIGIDO	>100		
L 03	C16	2							
L 04	C16	2			4X4	RIGIDO	>100		
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,06993	MERIDIANI	11,11162			
TRENTO - VERRUCA via						
QC126			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		5,20	4,91	4,50	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	TUTTA NOTTE	5,20			SI	NO
L 02	MEZZA NOTTE		2,21		SI	NO
L 03	TUTTA NOTTE			4,50	SI	NO
L 04	MEZZA NOTTE		2,70		SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,04239	MERIDIANI	11,13126	
TRENTO - VERONA viale				
QC127		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



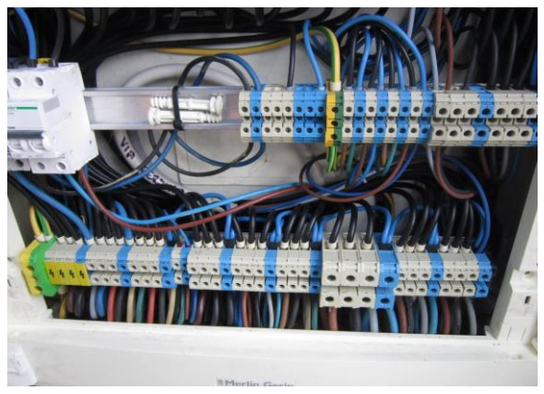







TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	636140		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 325 HMU				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.	OBO			
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C60	4	300mA	REG. AC				290	42
L 01	C16	3			4x10	FG7OR	>100		
L 02	C10	3			4x10	FG7OR	>100		
L 03	C10	3			4x4	FG7OR	>100		
L 04	C16	3			4x10	FG7OR	>100		
L 05	C16	3			4x16	FG7OR	>100		
L 06	C16	3			4x10	FG7OR	>100		
L 07	C10	3			4x10	FG7OR	>100		
L 08	C10	3			4x4+4x4	FG7OR	>100		
L 09	C6	1+N	300mA	AC	3x2,5	FG7OR	>100	245	32
L 10	C6	1+N	300mA	AC	3x2,5	FG7OR	>100	260	34
L 11	C6	1+N	300mA	AC	3x2,5	FG7OR	>100	260	32
L 12	C6	2			3x2,5	FG7OR	>100		
CE 01	C16	2			2x6	FG7OR	>100		
CE 02	C20	2			2x6	FG7OR	>100		



PARALLELI	46,04239	MERIDIANI	11,13126	
TRENTO - VERONA viale				
QC127		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		31,29	32,18	32,33	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	VIA VERONA EST	5,82	4,52	5,08	SI	NO
L 02	VIA VERONA OVEST	2,04	2,01	2,08	SI	NO
L 03	VIA VERONA SUD 1°T	4,05	4,38	3,52	SI	NO
L 04	VIA VERONA SUD 2°T	4,58	3,32	4,68	SI	NO
L 05	VIA DE GASPERI OVEST	4,94	3,96	4,43	SI	NO
L 06	VIA DE GASPERI EST	3,93	5,12	5,03	SI	NO
L 07	VIA FERSINA	1,50	1,46	1,51	SI	NO
L 08	PROIETTORI ROTA	1,15	3,74	2,88	SI	NO
L 09	PEDONALI NORD		2,04		SI	NO
L 10	PEDONALI SUD			3,12	SI	NO
L 11	PEDONALI DE GASPERI	2,72			SI	NO
L 12	PENSILINA BUS		0,68		SI	NO
CE 01	RACCOLTA DATI TRAFFICO	0,56			SI	NO
CE 02	FIBRE		0,95		SI	NO
NOTE :	Mancanza della targa del quadro di distribuzione. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere parzialmente presenti. Schemi elettrici non presenti.					


PARALLELI	46,05624	MERIDIANI	11,12854	
TRENTO - VERONA viale				
QC128		MANUTENERE	RIFARE	BUONO









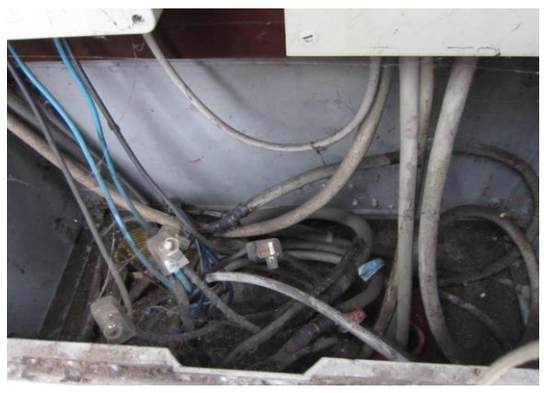

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	636174		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS - SAREL				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	SAREL			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C25	4	300mA	AC				280	44
L 01	C25-10-10	3			4x4+4x4	FG7OR	>100		
L 02	C10	3			4x6	FG7OR	>100		
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,05624	MERIDIANI	11,12854			
TRENTO - VERONA viale						
QC128			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		5,51	4,72	15,47	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	OVEST	3,80	2,00	10,08	SI	NO
L 02	EST	1,71	2,72	5,39	SI	NO
L 03					SI	NO
L 04					SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Da smantellare vecchio quadro all'interno Mancanza della targa del quadro Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione Grado di protezione dell’involucro compromesso Schemi elettrici non presenti. Mancanza di falsi poli su finestre DIN 35. Interruttori diversi. Cavi nastrati .					

PARALLELI	46,06204	MERIDIANI	11,13354			
TRENTO - VICENZA piazza						
QC129			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	629997		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 333 HS				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN	
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C63	4	300mA	REG. AC				275	118
L 01	C16	3			4X16+4X2,5	FG7OR	>100		
L 02	C16	3			4X10	FG7OR	>100		
L 03	C25	3			4X10	FG7OR	>100		
L 04	C16	3			4X10+4X2,5	FG7OR	>100		
L 05	C16	3			4X10+4X10	FG7OR	>100		
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,06204	MERIDIANI	11,13354	
TRENTO - VICENZA piazza				
QC129		MANUTENERE	RIFARE	BUONO


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		33,98	34,13	30,07	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	CIRCUITO 1	8,37	6,54	6,71	SI	NO
L 02	CIRCUITO 2	6,04	7,51	6,28	SI	NO
L 03	CIRCUITO 3	7,84	5,00	6,08	SI	NO
L 04	CIRCUITO 4	7,58	8,05	7,27	SI	NO
L 05	CIRCUITO 5	4,15	7,03	3,73	SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione Schemi elettrici non presenti. Cavo PE scollegato interno quadro.					

PARALLELI	46,06204	MERIDIANI	11,13676	
TRENTO - VICENZA via				
QC130		MANUTENERE	RIFARE	BUONO







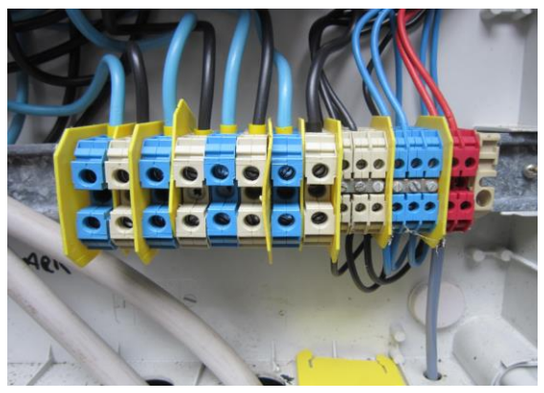



TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	828653		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		CAVI COLLEGAMENTI DIRETTAMENTE A TELERUTTORI				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	MERLIN GERIN
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	4	300mA	AC				270	32
L 01	C25	2							
L 02	B25	2							
L 03	B25	2							
L 04	C20	2							
L 05					4X6+4X6	FG70R	>100		
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,06204	**MERIDIANI**	11,13676			
TRENTO - VICENZA via						
QC130			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**2,91**	**6,64**	**6,11**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	0,00			**SI**	**NO**
L 02	CIRCUITO 2	0,00			**SI**	**NO**
L 03	CIRCUITO 3	0,00			**SI**	**NO**
L 04	CIRCUITO 4	0,00			**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Morsettiere presenti ma cavi collegati sotto teleruttori direttamente. Grado di protezione dell'involucro compromesso. Schemi elettrici non presenti.					


PARALLELI	46,06421	MERIDIANI	11,13254	
TRENTO - ZARA via				
QC131		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



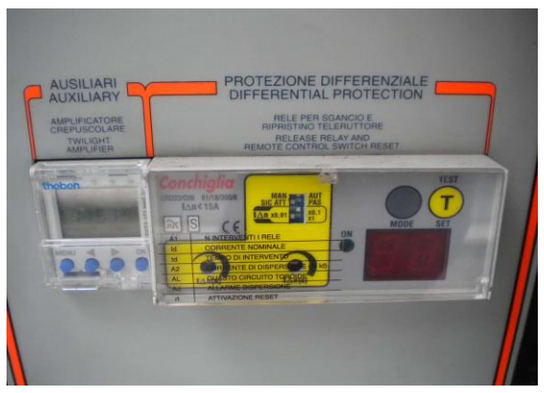





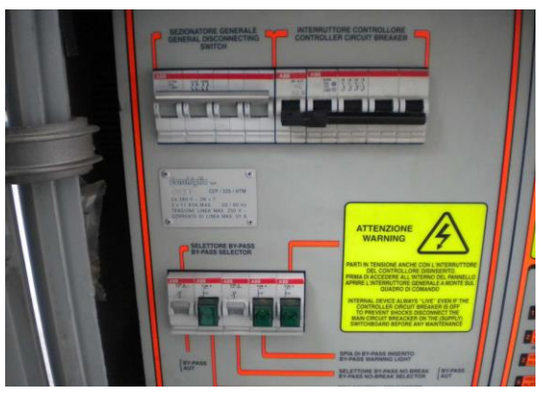

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	633126		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA					SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE		
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA					SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE		
STATO DEI CABLAGGI Q.E.		DISORDINATI			SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE		
STATO MORSETTIERE		DISORDINATE			SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE		
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD. ESCLUSO CEP 335 HTM			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO				
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C80	4	500mA	REG. AC				420	98
								MORS.	COLL.
L 01	C16	3			4X6	FG7OR	>100	2	TSR
L 02	C10	3			1X4X6	FG7OR	>100	7	RTS
L 03	C16	3			4X10	FG7OR	>100	3	RST
L 04	C16	3			4X6	FG7OR	>100	1	TSR
L 05	C10	3			4X10	FG7OR	>100	4	RST
L 06	C10	3			4X10	FG7OR	>100	5	TSR
L 07	C10	3			4X10	FG7OR	>100	6	RST
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,06421	MERIDIANI	11,13254	
TRENTO - ZARA via				
QC131		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		23,46	22,10	22,17	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	VIA ZARA 5 PUNTI LUCE	1,00	0,97	0,45	SI	NO
L 02	VIA FIUME E PONTE	6,50	6,56	6,44	SI	NO
L 03	VIA GRAZIOLI DX	3,85	2,22	3,29	SI	NO
L 04	VIA ZARA 9 PUNTI LUCE	0,95	2,01	1,01	SI	NO
L 05	VIA BONELLI-GIOVANELLI	4,49	2,60	4,88	SI	NO
L 06	VIA DEI MOLINI	2,80	4,06	3,00	SI	NO
L 07	VIA SAN BERNARDINO	3,87	3,68	3,10	SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,07558	MERIDIANI	11,10843	
TRENTO – ZUFFO pizzale ex				
QC132		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	619372		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 325 HMU				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO					
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	4	300mA	REG. AC				265	62
L 01	C16	3			4X16	FG7OR	>100		
L 02	C16	3			4X6	FG7OR	>100		
L 03	C10	3			4X6	FG7OR	>100		
L 04	C10	3			4X6	FG7OR	>100		
L 05	C6	3			4X4+4X4	FG7OR	>100		
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01	C32	2			2X10	FG7OR	>100		
CE 02	C40	2			2X6	FG7OR	>100		
CE 03									



PARALLELI	46,07558	MERIDIANI	11,10843	
TRENTO – ZUFFO pizzale ex				
QC132		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**25,82**	**16,48**	**21,75**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	LATO NORD	8,50	5,95	9,45	**SI**	**NO**
L 02	LATO SUD	7,12	2,71	4,75	**SI**	**NO**
L 03	CAPOLINEA BUS	3,88	2,02	2,88	**SI**	**NO**
L 04	CAMPER	2,04	2,29	2,12	**SI**	**NO**
L 05	INGRESSO PALESTRA	2,90	3,51	2,55	**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01	FIBRE SUD	1,38			**SI**	**NO**
CE 02	FIBRE NORD	0,00			**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione Schemi elettrici non presenti. Interruttori di marche diverse. Mancato coordinamento fra protezione e linea.					

PARALLELI	45,988515	MERIDIANI	11,12107	
TRENTO - ACQUAVIVA località				
QC133		MANUTENERE	RIFARE	BUONO









TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	616469	NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA	CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA	GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.					SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE					SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI	SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	SEZ. 40A	2							
L 01	C16	2	300mA	AC				285	28
L 02	C16	2	300mA	AC	4X10	FG7	>100	288	29
L 03	C16	2	300mA	AC				275	32
L 04	C16	2	300mA	AC	4X10	FG7	>100	275	32
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	45,988515	**MERIDIANI**	11,12107			
TRENTO - ACQUAVIVA località						
QC133			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**7,76**			**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	1,35			**SI**	**NO**
L 02	CIRCUITO 2	0,70			**SI**	**NO**
L 03	CIRCUITO 3	3,70			**SI**	**NO**
L 04	CIRCUITO 4	1,90			**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di protezione generale dal cortocircuito Mancanza della targa del quadro Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione Grado di protezione dell'involucro compromesso Schemi elettrici non presenti. Mancanza di falsi poli su finestre DIN 35.					

PARALLELI	46,07767	MERIDIANI	11,04571	
TRENTO - BASELGA DI BONDONE				
QC134		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



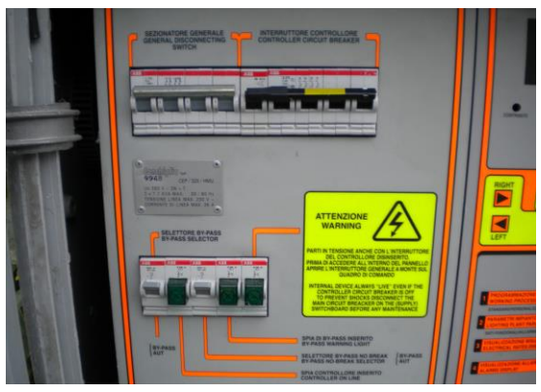







TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	617785		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 325 HMU				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.	BTICINO			
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C50	4	300mA	AC REG.				270	40
L 01	C10	3	NO		4X16	FG7	>100		
L 02	C10	3	NO		4X16	FG7	>100		
L 03	C10	3	NO		2X4X16	FG7	>100		
L 04	C10	3	NO		4X16	FG7	>100		
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,07767	MERIDIANI	11,04571			
TRENTO - BASELGA DI BONDONE						
QC134			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		23,50	15,69	24,86	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	VIA CASAI PAESE-VIA VILLA	10,14	5,54	6,14	SI	NO
L 02	STRADA PER SOPRAMONTE-VIA VILLA	1,70	1,70	12,20	SI	NO
L 03	CHIESA E PARCO	2,29	3,29	4,90	SI	NO
L 04	VIA DEL DOS PER TRENTO	5,93	4,85	4,30	SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione Schemi elettrici non presenti. I carico > I interruttore. Interruttori marche diverse.					


PARALLELI	46,06748	MERIDIANI	11,16428	
TRENTO - POVO via Pinara				
QC135		MANUTENERE	RIFARE	BUONO





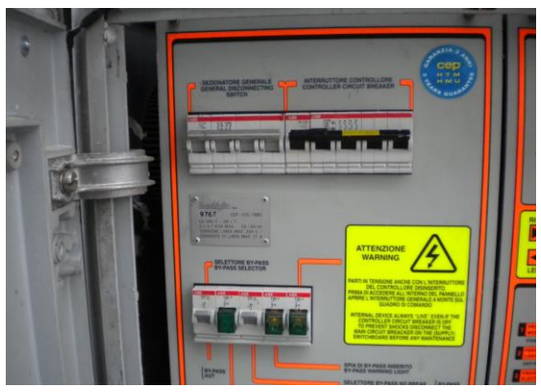

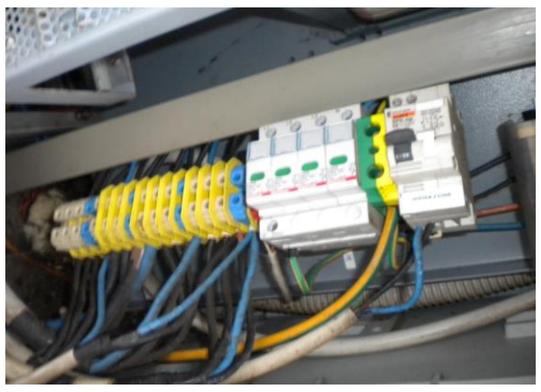

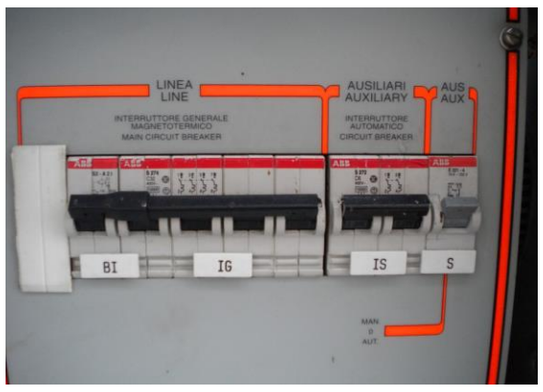

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	614958		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 315 HMU				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.	BTICINO			
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	4P	300mA	AC REGOLABILE				285	58
L 01	C10	3P			4x6+2x4	FG7OR	>100		
L 02	C10	3P			4x16	FG7OR	>100		
L 03	C10	3P			4x25	FG7OR	>100		
L 04	C10	3P			4x4	FG7OR	>100		
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01	C6	1P+N	300mA	AC	3x4	FG7OR	>100	240	45
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,06748	MERIDIANI	11,16428	
TRENTO - POVO via Pinara				
QC135		MANUTENERE	RIFARE	BUONO


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**11,18**	**12,24**	**10,42**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	VIA BORINO	4,00	3,10	1,92	**SI**	**NO**
L 02	VIA BORINO BASSA	2,50	2,64	3,35	**SI**	**NO**
L 03	VIA BORINO ALTA	1,95	0,52	3,77	**SI**	**NO**
L 04	VIA PINARA	1,47	2,89	1,13	**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01	IRRIGAZIONE	0,00			**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione Schemi elettrici non presenti. Interruttori marche diverse.					

PARALLELI	46,08911	MERIDIANI	11,06876	
TRENTO - CADINE Caman via di (località cultura)				
QC136		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



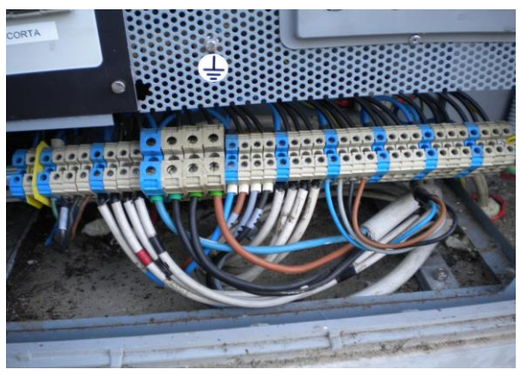



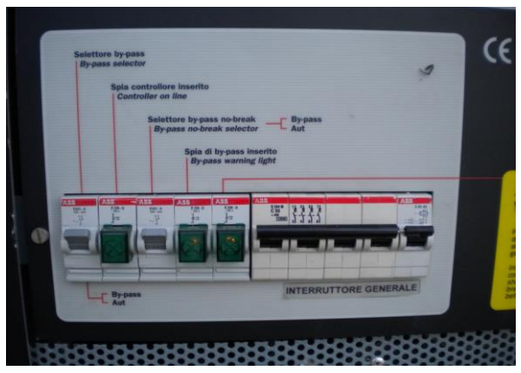



TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD 617957		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA			SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA			SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.					SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE					SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	

REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 325 HMU				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO					
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN	
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C63	4	300mA	AC REG.				267	76
L 01	C16	2							
L 02	C16	3			4X4	FG7OR	>100		
L 03	C16	3			1x4X10	FG7OR	>100		
L 04	C16	3			4X25	FG7OR	>100		
L 05	C16	3			4X16	FG7OR	>100		
L 06	C16	3			1x4x16	FG7OR	>100		
L 07	C16	3			4X4	FG7OR	>100		
L 08	C16	3							
L 09	C16	2							
L 10	C16	3							
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									

PARALLELI	46,08911	**MERIDIANI**	11,06876			
TRENTO - CADINE Caman via di (località cultura)						
QC136				MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**15,00**	**25,64**	**20,70**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	SCORTA				**SI**	**NO**
L 02	VIALETTO PEDONALE 1	1,00	4,59	2,80	**SI**	**NO**
L 03	VIA DI CANAN 1	0,90	0,90	1,92	**SI**	**NO**
L 04	VIA DI CULTURA	8,12	9,60	11,18	**SI**	**NO**
L 05	VIA DELLA GIARA	2,69	7,89	0,34	**SI**	**NO**
L 06	VIA DELLA GIARA 2	1,93	1,80	3,50	**SI**	**NO**
L 07	VIALETTO PEDONALE 1	0,36	0,86	0,96	**SI**	**NO**
L 08	SCORTA				**SI**	**NO**
L 09	SCORTA				**SI**	**NO**
L 10	SCORTA				**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione.					


PARALLELI	46,08592	MERIDIANI	11,06076	
TRENTO - CADINE Capitello via del				
QC137		MANUTENERE	RIFARE	BUONO









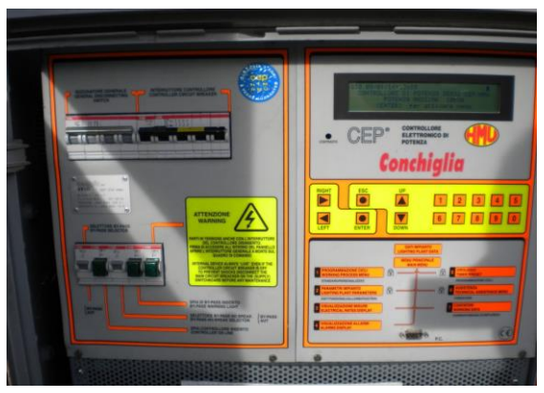

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	617883		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.		CAVI DAL CONTATORE DA SOSTITUIRE				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD. CEP 310 HMU			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	4	300mA	AC REG.				320	98
L 01	C16	3			4X16	FG7OR	>100		
L 02	C10	3			1X4X6+4X4	FG7OR+RIGIDO	>100		
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									


PARALLELI	46,08592	**MERIDIANI**	11,06076			
TRENTO - CADINE Capitello via del						
QC137			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**8,00**	**8,67**	**11,11**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	VIA DEL CAPITELLO	2,90	2,10	4,90	**SI**	**NO**
L 02	VIA DELCAPITENO/STRADA PER SOPRAMONTE	5,10	6,57	6,21	**SI**	**NO**
L 03					**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Interruttore differenziale con corrente di intervento > a Idn. Interruttori di marche diverse.					

PARALLELI	46,08759	MERIDIANI	11,0649	
TRENTO - CADINE Posta via della				
QC138		MANUTENERE	RIFARE	BUONO





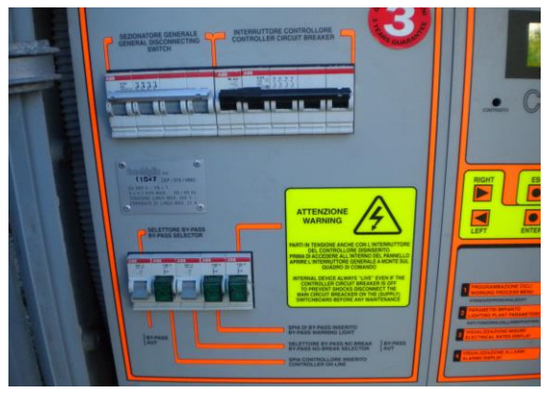





TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	617919		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD. CEP 315 HMU			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	4	500mA	REG. AC				345	112
L 01	C10	3			4X4	FG7OR	>100		
L 02	C10	3			4X6	FG7OR	>100		
L 03	C10	3			4X10	FG7OR	>100		
L 04	C10	3			4X4	FG7OR	>100		
L 05	C10	3							
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,08759	MERIDIANI	11,0649	
TRENTO - CADINE Posta via della				
QC138		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**7,04**	**11,38**	**9,53**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CASSA RURALE CADINE/DELLA POSTA	0,49	1,55	0,00	**SI**	**NO**
L 02	STRADA DI CADINE	0,82	3,06	2,82	**SI**	**NO**
L 03	VIA DELLA POSTA CENTRO PAESE	3,68	3,82	4,33	**SI**	**NO**
L 04	PARCO DI CADINE	2,05	2,95	2,38	**SI**	**NO**
L 05	RISERVA				**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Interruttori di marche diverse.					

PARALLELI	46,08596	**MERIDIANI**	11,06613			
TRENTO - CADINE Voltei via dei						
QC139			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	



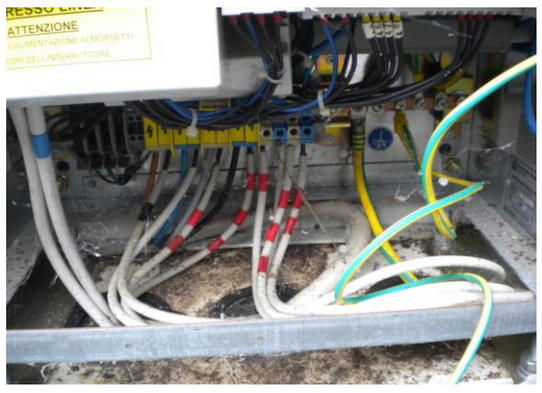







TENSIONE	**230V MF**	**230V 3F**	**400V 3F**	**POD**	**618035**		**NOTE**
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		**GE POLYESTER**			**SUFFICIENTE** / **INSUFFICIENTE**		
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		**REVERBERY/GE**			**SUFFICIENTE** / **INSUFFICIENTE**		
STATO DEI CABLAGGI Q.E.					**SUFFICIENTE** / **INSUFFICIENTE**		
STATO MORSETTIERE					**SUFFICIENTE** / **INSUFFICIENTE**		
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. SEC STPM 07				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	TWS 1				
OROLOGIO	SI	NO	**ASTRONOMICO**	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.	OBO			
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	**DISEGNI Q.E.**	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	**PE SU PALI**	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	2	300mA	AC REG.				280	78
L 01	C10	2			2X1X16	FG7	>100		
L 02	C10	2			4X1X4	FG7	>100		
L 03	C16	2			4X10	FG7	>100		
L 04	C16	2			4X1X4	FG7	>100		
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,08596	**MERIDIANI**	11,06613			
TRENTO - CADINE Voltei via dei						
QC139			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**10,11**			**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	VIA VOLTEI MONTE 1	3,00			**SI**	**NO**
L 02	VIA VOLTEI MONTE 2	2,37			**SI**	**NO**
L 03	VIA VOLTEI VALLE 1	2,08			**SI**	**NO**
L 04	VIA VOLTEI VALLE 2	2,66			**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione Schemi elettrici non presenti. Interruttori di marche diverse.					

PARALLELI	46,09935	MERIDIANI	11,06076	
TRENTO - CANOVA parco				
QC140		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	759526		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. LEC A 3X50A 35V				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C63	4	500mA	AC REG.				422	114
L 01	C16	3			4X10	FG7OR	>100		
L 02	C16	3			4X4	FG7OR	>100		
L 03	C16	3			4X6	FG7OR	>100		
L 04	C16	3			4X4	FG7OR	>100		
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,09935	MERIDIANI	11,06076	
TRENTO - CANOVA parco				
QC140		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**13,92**	**10,33**	**5,86**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CHIESA BOCCIDRORO	2,67	2,51	1,88	**SI**	**NO**
L 02	PARCO 1	2,25	2,53	1,03	**SI**	**NO**
L 03	PARCHEGGIO 1	5,98	3,51	1,60	**SI**	**NO**
L 04	PARCO 2	3,02	1,78	1,35	**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione Schemi elettrici non presenti. Mancanza di falsi poli su finestre DIN 35. Cavi nastrati in uscita dal quadro.					

PARALLELI	46,09661	MERIDIANI	11,11017	
TRENTO - CANOVA via Bassa				
QC141		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



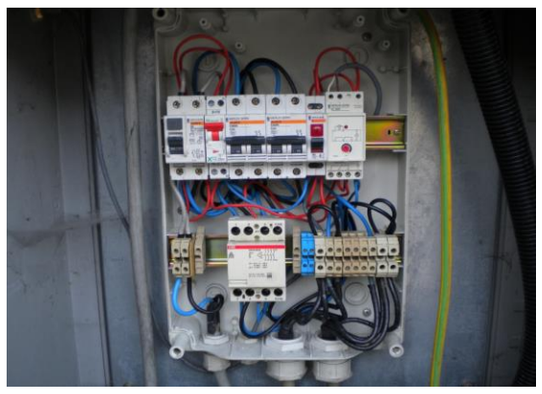







TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	607483		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD.				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	NO	2	300mA	AC				240	22
L 01	C20	2			4X6	FG7OR	>100		
L 02	C20	2			4X6	FG7OR	>100		
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,09661	MERIDIANI	11,11017			
TRENTO - CANOVA via Bassa						
QC141			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**9,27**			**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	5,82			**SI**	**NO**
L 02	CIRCUITO 2	3,45			**SI**	**NO**
L 03					**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di protezione generale dal cortocircuito Mancanza della targa del quadro Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione Schemi elettrici non presenti. Interruttori di marche diverse. Manca protezione magnetotermica sul differenziale generale.					

PARALLELI	46,099	MERIDIANI	11,10883	
TRENTO - CANOVA via della				
QC142		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	608003		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD.				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	PERRY	
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	2	300mA	AC				278	78
L 01	C20	2			4X4	FG7OR	>100		
L 02	C20	2			4X4	FG7OR	>100		
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,099	MERIDIANI	11,10883				
TRENTO - CANOVA via della							
QC142					MANUTENERE	RIFARE	BUONO


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		6,59			SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	CIRCUITO 1	0,49			SI	NO
L 02	CIRCUITO 2	6,10			SI	NO
L 03					SI	NO
L 04					SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti.					


PARALLELI	46,07185	MERIDIANI	11,17677	
TRENTO - CELVA via				
QC143		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



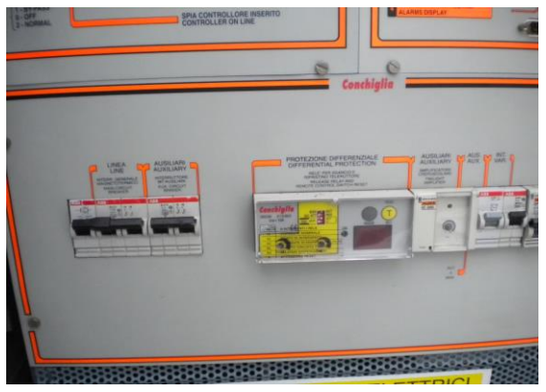



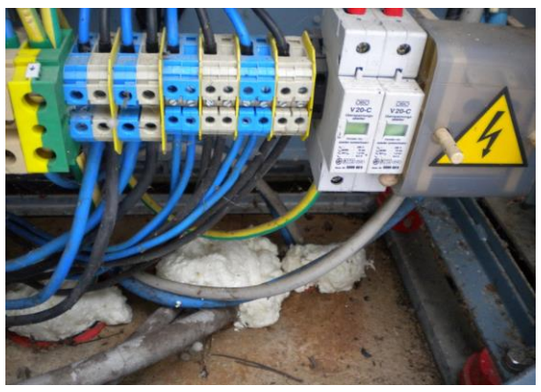

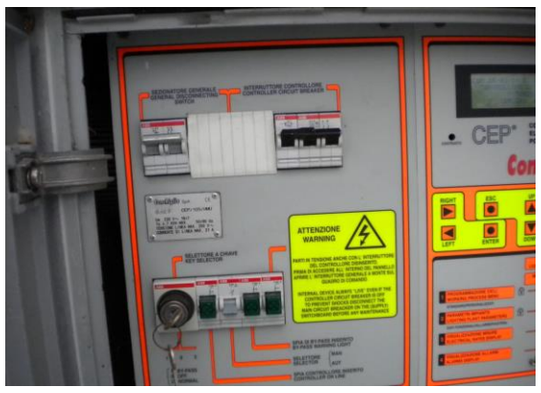

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	614598		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 105 HMU				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.	OBO			
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	2P	300mA	AC REGOLABILE				290	44
L 01	C10	1P+N							
L 02	C10	1P+N			4x10	FG7OR	>100		
L 03	C10	1P+N							
L 04	C10	1P+N			4x4+4x4	FG7OR	>100		
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									

PARALLELI	46,07185	**MERIDIANI**	11,17677	
TRENTO - CELVA via				
QC143		MANUTENERE	RIFARE	BUONO


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**10,31**			**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	2,64			**SI**	**NO**
L 02	CIRCUITO 2	3,05			**SI**	**NO**
L 03	CIRCUITO 3	2,68			**SI**	**NO**
L 04	CIRCUITO 4	1,69			**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. Interruttori di marche diverse.					


PARALLELI	46,06789	MERIDIANI	11,18404	
TRENTO - CIMIRLO (alto)				
QC144		MANUTENERE	RIFARE	BUONO







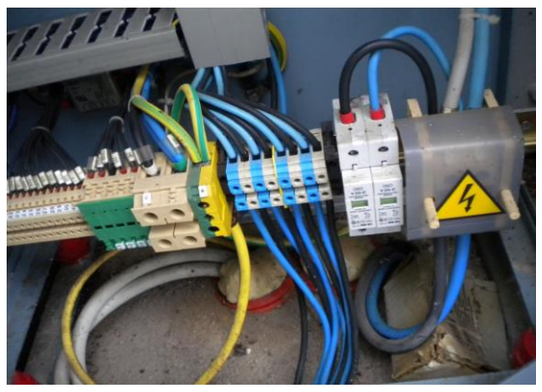

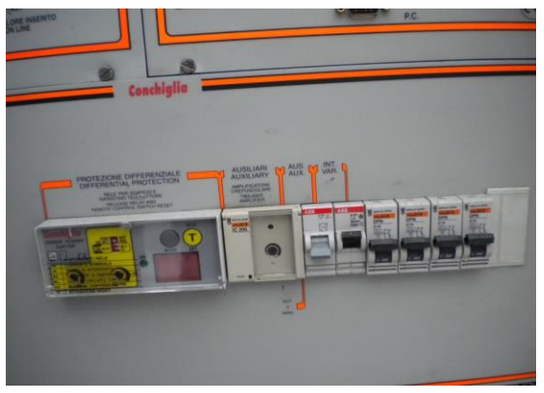

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	614622		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 105 HMU				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.	OBO			
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	2P	300mA	AC REGOLABILE				255	72
L 01	C10	1P+N							
L 02	C10	1P+N			4x10	FG7OR	>100		
L 03	C10	1P+N							
L 04	C10	1P+N			4x10	FG7OR	>100		
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,06789	**MERIDIANI**	11,18404			
TRENTO - CIMIRLO (alto)						
QC144			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**11,62**			**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	3,83			**SI**	**NO**
L 02	CIRCUITO 2	3,12			**SI**	**NO**
L 03	CIRCUITO 3	2,60			**SI**	**NO**
L 04	CIRCUITO 4	3,86			**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. Interruttori di marche diverse.					


PARALLELI	46,07038	MERIDIANI	11,1833	
TRENTO - CIMIRLO (basso)				
QC145		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



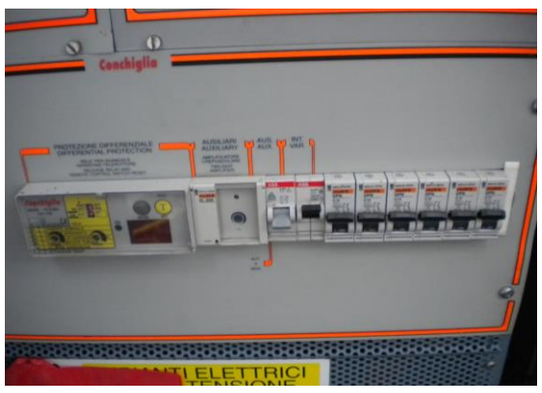





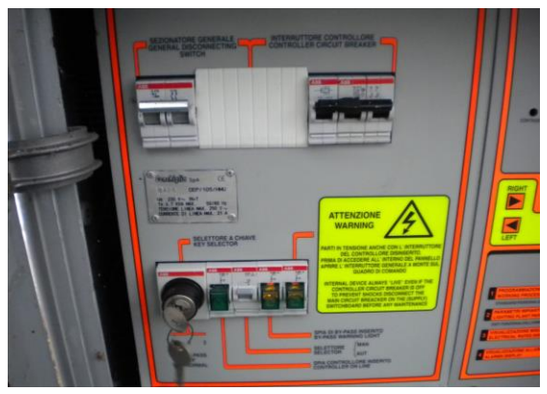

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	614616		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 105 HMU				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	MERLIN GERIN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.	OBO			
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	2P	300mA	AC REGOLABILE				290	60
L 01	C10	1P+N							
L 02	C10	1P+N			4x10	FG7OR	>100		
L 03	C10	1P+N							
L 04	C10	1P+N			4x6	FG7OR	>100		
L 05	C10	1P+N							
L 06	C10	1P+N			4x10	FG7OR	>100		
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									




PARALLELI	46,07038	MERIDIANI	11,1833	
TRENTO - CIMIRLO (basso)				
QC145		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		10,65			SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	CIRCUITO 1	2,07			SI	NO
L 02	CIRCUITO 2	1,40			SI	NO
L 03	CIRCUITO 3	0,78			SI	NO
L 04	CIRCUITO 4	2,29			SI	NO
L 05	CIRCUITO 5	1,21			SI	NO
L 06	CIRCUITO 6	2,55			SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. Interruttori di marche diverse.					

PARALLELI	46,07649	MERIDIANI	11,13507	
TRENTO - COGNOLA parco via delle Coste				
QC146		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



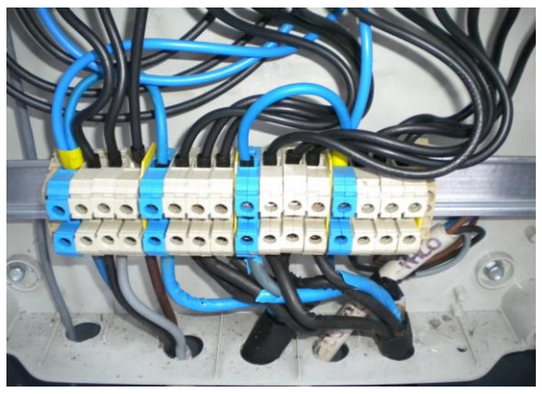







TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	613535		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI


CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	4							
GENERALE 1	C16	4	300mA	AC				260	34
GENERALE 2	C16	4	300mA	AC				260	38
G1 L 01	C10	3			4x10	FG7OR	>100		
G1 L 02	C16	3			4x10	FG7OR	>100		
G2 L 03	C16	3			4x10	FG7OR	>100		
G2 L 04	C16	3			4x4	FG7OR	>100		
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									

PARALLELI	46,07649	MERIDIANI	11,13507			
TRENTO - COGNOLA parco via delle Coste						
QC146			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		16,52	16,48	16,80	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	LASTE	6,55	4,05	5,90	SI	NO
L 02	STRADA PRINCIPALE	4,22	5,52	5,74	SI	NO
L 03	PARCO	2,60	4,93	3,73	SI	NO
L 04	VIA OLIVI	2,79	2,59	2,36	SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza della targa del quadro Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione Grado di protezione dell’involucro compromesso Schemi elettrici non presenti. Cavi nastrati in uscita dal quadro. Interruttori di marche diverse.					


PARALLELI	46,07097	MERIDIANI	11,14011	
TRENTO - COGNOLA loc San Donà piazza				
QC147		MANUTENERE	RIFARE	BUONO



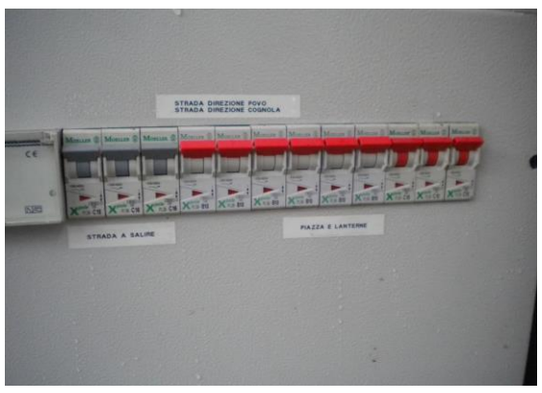



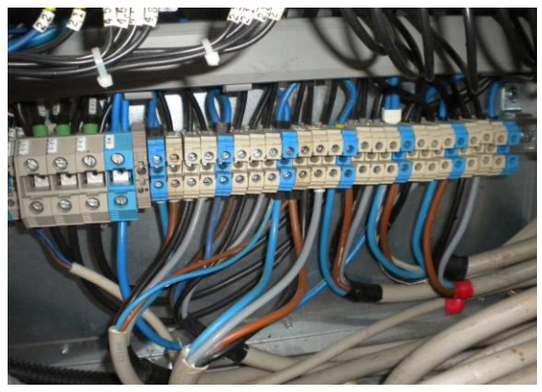

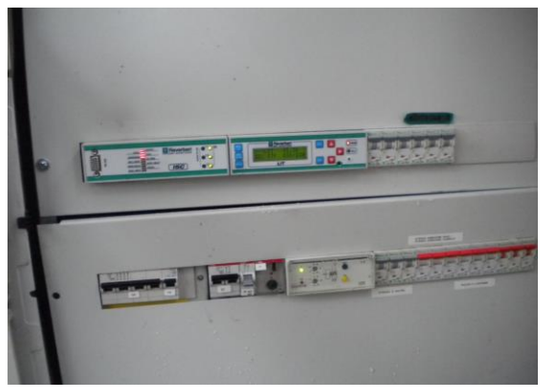

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	806288		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		POLYSAFE GE				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		REVERBERI				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. SEC STP 36				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	ABB				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C50	4	300mA	REG. AC				230	86
L 01	C16	3			4x10	FG7OR	>100		
L 02	C16	3			4x6	FG7OR	>100		
L 03	C16	3			4x10+2x2,5	FG7OR	>100		
L 04	B10	3			4x10	FG7OR	>100		
L 05	B10	3			4x10	FG7OR	>100		
L 06	C10	3			4x10	FG7OR	>100		
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,07097	MERIDIANI	11,14011	

TRENTO - COGNOLA loc San Donà piazza

QC147		MANUTENERE	RIFARE	BUONO


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**21,70**	**23,82**	**22,92**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	2,77	4,48	3,21	**SI**	**NO**
L 02	ROTATORIA	1,30	0,60	1,42	**SI**	**NO**
L 03	STRADA A SALIRE	4,12	3,88	3,72	**SI**	**NO**
L 04	STRADA POVO E COGNOLA	4,36	5,10	4,29	**SI**	**NO**
L 05	PIAZZA E LANTERNE	3,62	3,95	3,93	**SI**	**NO**
L 06	CIRCUITO 6	5,53	5,81	6,35	**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Interruttori di marche diverse.					


PARALLELI	46,08047	MERIDIANI	11,13906	
TRENTO - COGNOLA loc. Zell				
QC148		MANUTENERE	RIFARE	BUONO







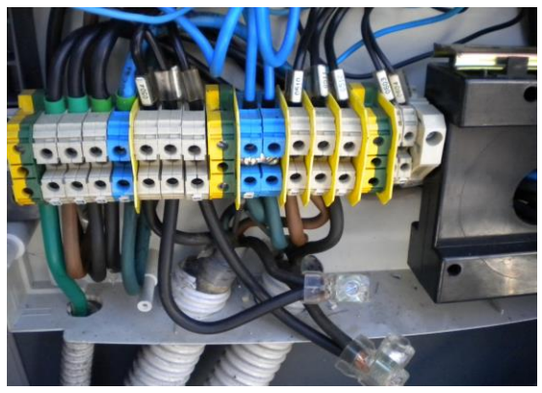

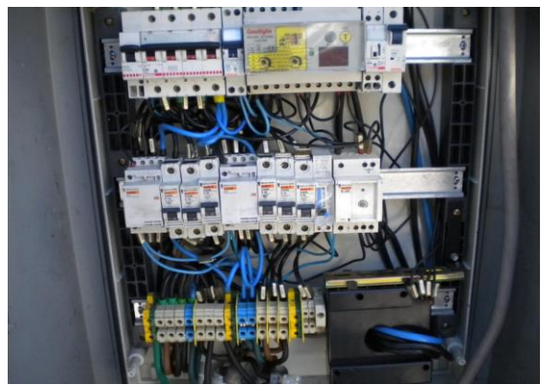

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	614325		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		COLLEGAMENTO CAVI MISTO				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	THEBEN
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C40	4	300mA	REG. AC				290	66
L 01	C32	3			4x16	FG7OR	>100		
L 02	C32	3			4x16	FG7OR	>100		
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,08047	MERIDIANI	11,13906			
TRENTO - COGNOLA loc. Zell						
QC148			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**16,14**	**15,15**	**9,81**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	MEZZA NOTTE	6,79	2,80	5,33	**SI**	**NO**
L 02	TUTTA NOTTE	9,00	11,76	4,25	**SI**	**NO**
L 03					**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti. Mancanza di falsi poli su finestre DIN 35.					


PARALLELI	46,07844	MERIDIANI	11,13999			
TRENTO - COGNOLA VIA Marnighe (laterale)						
QC149			MANUTENERE	RIFARE	BUONO	







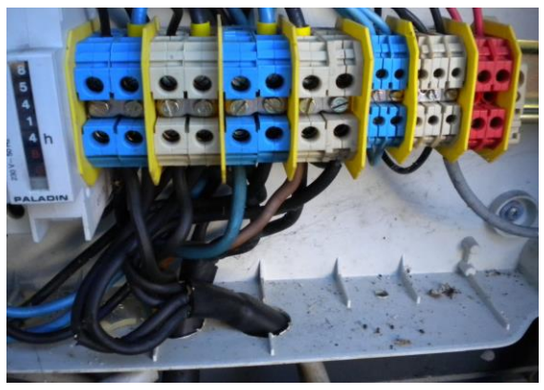

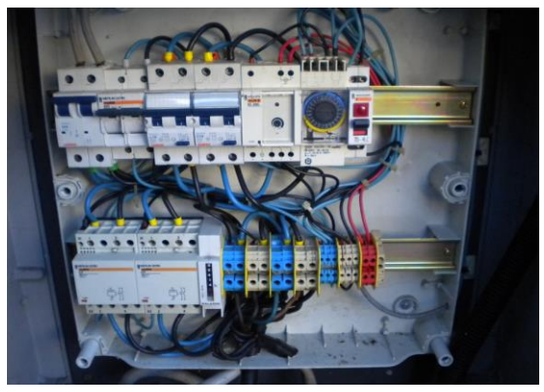

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	613711		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	PERRY
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	32A SEZION.	2							
L 01	C16	1+N	300mA	AC				240	44
L 02	C16	1+N	300mA	AC	3 CAVI 4x4	FG7OR	>100	265	42
L 03									
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,07844	MERIDIANI	11,13999	
TRENTO - COGNOLA VIA Marnighe (laterale)				
QC149		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		7,30			SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	NOTTE	5,53			SI	NO
L 02	MEZZA NOTTE	1,70			SI	NO
L 03					SI	NO
L 04					SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di protezione generale dal cortocircuito. Mancanza della targa del quadro. Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Schemi elettrici non presenti.					

PARALLELI	46,0742	MERIDIANI	11,14528	


TRENTO - COGNOLA vie Campanelle


QC151		MANUTENERE	RIFARE	BUONO







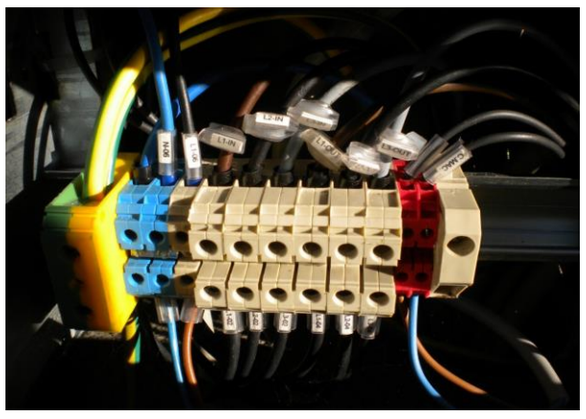

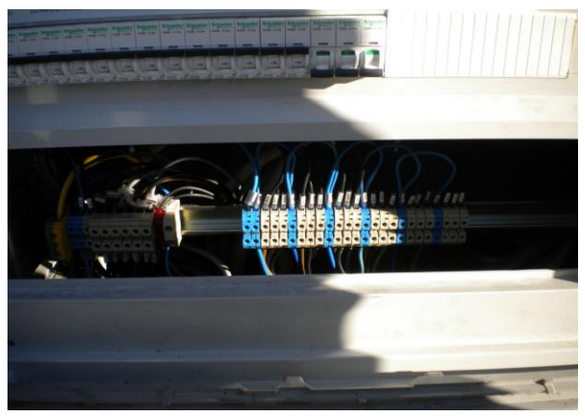

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	613519		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. LEC A 3x20A/35V				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO					
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.				
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	4	300mA	REG. AC				290	58
L 01	C10	3			4x10	FG7OR	>100		
L 02	C10	3			4x6	FG7OR	>100		
L 03	C10	3			4x6	FG7OR	>100		
L 04	C10	3			4x6	FG7OR	>100		
L 05	C10	3			4x6	FG7OR	>100		
L 06	C10	3			4x6	FG7OR	>100		
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									



PARALLELI	46,0742	MERIDIANI	11,14528	
TRENTO - COGNOLA vie Campanelle				
QC151		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**13,27**	**7,44**	**7,43**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	VIA PONTE ALTO EST	2,73	1,03	1,00	**SI**	**NO**
L 02	VIA PONTE ALTO OVEST	4,16	2,98	2,38	**SI**	**NO**
L 03	VIA GREZONI	2,64	0,82	1,30	**SI**	**NO**
L 04	VIA ALLE CAMPANELLE + DEI POZATI	2,63	1,61	1,82	**SI**	**NO**
L 05	VIA DOSS CASTION	1,11	1,00	0,93	**SI**	**NO**
L 06	RISERVA				**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :						

PARALLELI	46,07693	MERIDIANI	11,14121	
TRENTO - COGNOLA via Carlo e Valeria Julg				
QC152		MANUTENERE	RIFARE	BUONO











TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	613737		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD. CEP 325 HMU				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	THEBEN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.	B-TICINO			
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	4	300mA	REG. AC				275	72
L 01	C16	3			4x16	FG7OR	>100		
L 02	C16	3			4x16	FG7OR	>100		
L 03	C16	3			4x10	FG7OR	>100		
L 04	C16	3			4x10	FG7OR	>100		
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									

PARALLELI	46,07693	MERIDIANI	11,14121	

TRENTO - COGNOLA via Carlo e Valeria Julg

QC152		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**20,12**	**16,14**	**13,75**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	MARNIGHE	4,42	2,27	2,99	**SI**	**NO**
L 02	PELLEGRINA	6,10	4,05	4,68	**SI**	**NO**
L 03	CIRCOSCRIZIONE (RETRO) VIA KLOFER	4,89	7,15	3,61	**SI**	**NO**
L 04	DA SISTER CHIESA A SISTER VEDUTA	4,71	2,67	2,47	**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione. Interruttori di marche diverse.					


PARALLELI	46,07601	MERIDIANI	11,14723	
TRENTO - COGNOLA-via alla Veduta, Masetti				

QC153		MANUTENERE	RIFARE	BUONO







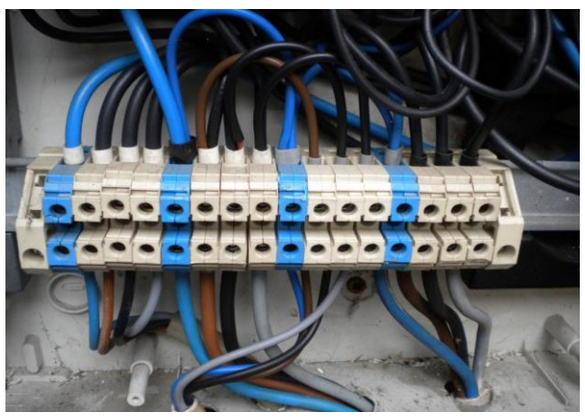



TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	614169		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		CONCHIGLIA				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		GEWISS				SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI						SUFFICIENTE	
Q.E.						INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C32	4	500mA	REG. AC				345	84
L 01	C32	3			4x16+4x4	FG7OR	>100		
L 02	C32	3			4x16	FG7OR	>100		
L 03	C10	1+N	300mA	AC	2x2,5	FG7OR	>100	250	42
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									

PARALLELI	46,07601	MERIDIANI	11,14723	
TRENTO - COGNOLA-via alla Veduta, Masetti				
QC153		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**15,66**	**12,27**	**16,28**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	CIRCUITO 1	8,76	3,93	6,58	**SI**	**NO**
L 02	CIRCUITO 2	6,90	8,34	8,48	**SI**	**NO**
L 03	PASSAGGIO PEDONALE			1,22	**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione Grado di protezione dell'involucro compromesso Schemi elettrici non presenti. Mancanza di falsi poli su finestre DIN 35.					


PARALLELI	46,07561	MERIDIANI	11,14112	
TRENTO - COGNOLA via S.Vito				


QC154		MANUTENERE	RIFARE	BUONO







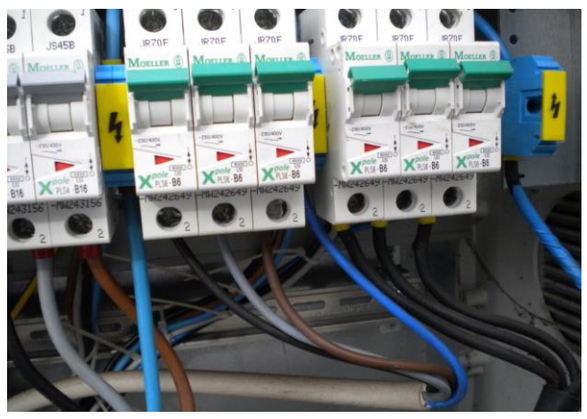

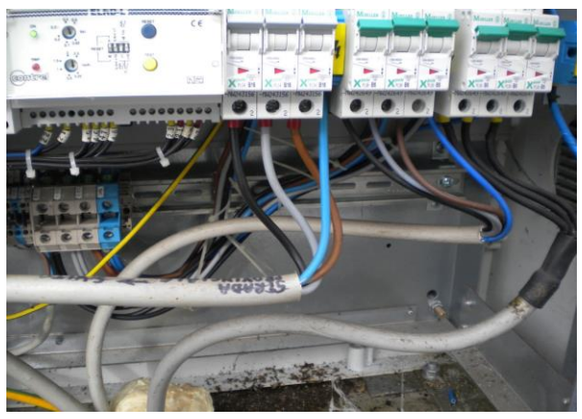

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	613961		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA		GE POLYSAFE				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		REVERBERI				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE		NON PRESENTI				SUFFICIENTE INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD. SEC STP 36			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	ABB			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI									
CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C50	4	300mA	REG. AC				250	84
L 01	B16	3			4x10	FG7OR	>100		
L 02	B6	3			4x4	FG7OR	>100		
L 03	B6	3			4x6	FG7OR	>100		
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									


PARALLELI	46,07561	MERIDIANI	11,14112	
TRENTO - COGNOLA via S.Vito				
QC154		MANUTENERE	RIFARE	BUONO


		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		12,45	8,12	12,94	SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	VIA SAN VITO BASSA	9,60	5,55	10,58	SI	NO
L 02	VIA SAN VITO ALTA	2,18	1,36	1,38	SI	NO
L 03	VIA SAN VITO LATERALE	0,67	1,21	0,98	SI	NO
L 04					SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione Morsettiere non presenti. Schemi elettrici non presenti. Interruttori di marche diverse.					

PARALLELI	46,12427	MERIDIANI	11,13285	
TRENTO – CORTESANO paese				
QC155		MANUTENERE	RIFARE	BUONO





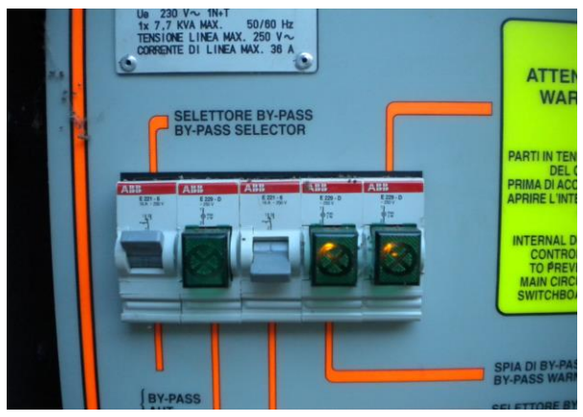

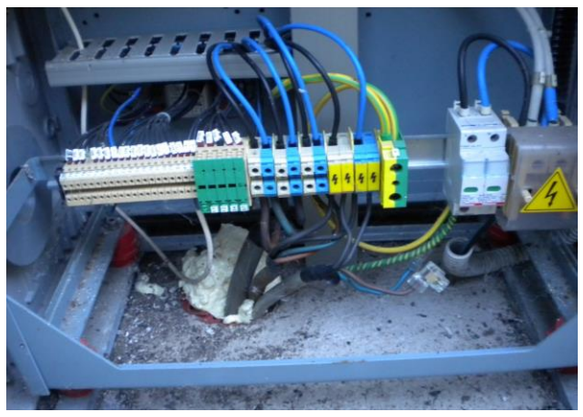



TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	611650		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA	CONCHIGLIA					SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA	CONCHIGLIA					SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO DEI CABLAGGI Q.E.						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
STATO MORSETTIERE						SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE	
REG. DI FLUSSO	SI	NO	MOD.				
TELECONTROLLO	SI	NO	MOD.				
CREPUSCOLARE	SI	NO	THEBEN				
OROLOGIO	SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO		
SCARICATORI	SI	NO	MOD.	BTICINO F10A/S			
CONTINUITA' PE Q.E.	SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO		
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI	SI	NO	PE SU PALI	SI	NO		

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C63	2	300mA	REG. AC				295	25
L 01	C10	2							
L 02	C20	2			4X16	NEOPRENE	>100		
L 03	C10	2							
L 04	C10	2			2X4X4	NEOPRENE	>100		
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									

PARALLELI	46,12427	MERIDIANI	11,13285	
TRENTO – CORTESANO paese				
QC155		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		27,98			SI	NO
CIRCUITO	DESCRIZIONE CIRCUITO					
L 01	LINEA 1	6,58			SI	NO
L 02	LINEA 2	8,70			SI	NO
L 03	LINEA 3	5,50			SI	NO
L 04	LINEA 4	7,20			SI	NO
L 05					SI	NO
L 06					SI	NO
L 07					SI	NO
L 08					SI	NO
L 09					SI	NO
L 10					SI	NO
CE 01					SI	NO
CE 02					SI	NO
CE 03					SI	NO
NOTE :	Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione Schemi elettrici non presenti. Cavi nastrati in uscita dal quadro. Interruttori di marche diverse.					

PARALLELI	46,05579	MERIDIANI		11,15298


TRENTO - GABBIOLO


QC156		MANUTENERE	RIFARE	BUONO







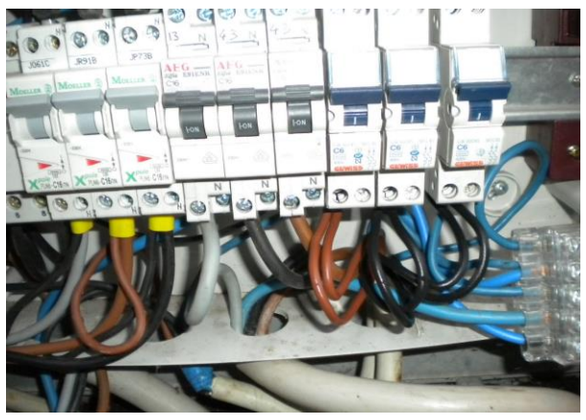

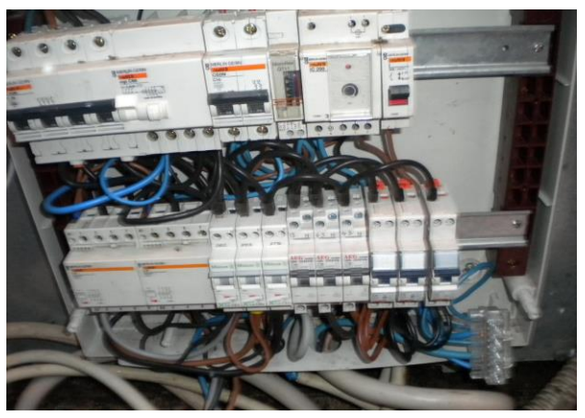

TENSIONE	230V MF	230V 3F	400V 3F	POD	614688		NOTE
MARCA MODELLO CARPENTERIA ESTERNA					SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE		
MARCA MODELLO CARPENTERIA INTERNA		CONCHIGLIA			SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE		
STATO DEI CABLAGGI Q.E.		GEWISS			SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE		
STATO MORSETTIERE Q.E.		GEWISS			SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE		
		NON SONO PRESENTI					
REG. DI FLUSSO		SI	NO	MOD.			
TELECONTROLLO		SI	NO	MOD.			
CREPUSCOLARE		SI	NO	MERLIN GERIN			
OROLOGIO		SI	NO	ASTRONOMICO	SI	NO	LEGRAND
SCARICATORI		SI	NO	MOD.			
CONTINUITA' PE Q.E.		SI	NO	DISEGNI Q.E.	SI	NO	
POZZETTI DI ISPEZIONE PALI		SI	NO	PE SU PALI	SI	NO	

TIPOLOGIA INTERRUTTORI

CIRCUITO	PROT. MT	POLI	PROT. DIFF.	TIPO DIFF.	SEZIONE CAVO	TIPO CAVO	RES. ISOL. CAVO	DIFF. mA	DIFF. mS
GENERALE	C25	4P	300mA	AC				250	60
L 01	C16	3P			4x6+4x4	FG7OR	>100		
L 02	C16	3P			4x16	FG7OR	>100		
L 03	C6	3P			4x4+4x4	FG7OR	>100		
L 04									
L 05									
L 06									
L 07									
L 08									
L 09									
L 10									
AUX									
CE 01									
CE 02									
CE 03									

PARALLELI	46,05579	MERIDIANI		11,15298
TRENTO - GABBIOLO				

QC156		MANUTENERE	RIFARE	BUONO

		R (A)	S (A)	T (A)	CARICHI EQUILIBRATI	
POTENZA GENERALE		**11,61**	**10,66**	**8,66**	**SI**	**NO**
CIRCUITO	**DESCRIZIONE CIRCUITO**					
L 01	VIA GABBIOLO NORD	3,24	3,62	4,75	**SI**	**NO**
L 02	CASOTTI+PIAZZA+TESATA	2,68	4,41	4,19	**SI**	**NO**
L 03	ALLA CROS+GABBIOLO SUD	2,62	2,66	2,52	**SI**	**NO**
L 04					**SI**	**NO**
L 05					**SI**	**NO**
L 06					**SI**	**NO**
L 07					**SI**	**NO**
L 08					**SI**	**NO**
L 09					**SI**	**NO**
L 10					**SI**	**NO**
CE 01					**SI**	**NO**
CE 02					**SI**	**NO**
CE 03					**SI**	**NO**
NOTE :	Mancanza della targa del quadro Mancanza di identificazione dei singoli circuiti e/o dei loro dispositivi di protezione Morsettiere non presenti Grado di protezione dell'involucro compromesso Schemi elettrici non presenti. Mancanza di falsi poli su finestre DIN 35.					
